

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

**Общеобразовательные организации
(незавершенные объекты)**

на 1 июля 2021 года

Объекты социальной инфраструктуры в высокой степени готовности

(готовность более 70%)




Школы **1**



№ ГК-005 от 28.10.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»



79,71%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 6,89% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



48

Люди



3

Техника



Объекты социальной инфраструктуры в средней степени готовности

(готовность от 30% до 70%)



Школы **6**



№ ГК-80 от 10.11.2020

Подрядчик: ООО «Капитал»



58,74%

Строительная готовность



01.11.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 21,64% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 г.



93

Люди



8

Техника





№ ГК-76 от 24.08.2020	
<i>Подрядчик: АО "Дагестанстрой"</i>	
 57,92% Строительная готовность	 01.11.2021 Планируемая дата ввода
▲ 10,63 % – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года	
 47 Люди	 2 Техника





№ ГК- 71 от 24.08.2020

Подрядчик: АО "Дагестанстрой"
(Исполнитель работ: "Фирма Дагстрой")



57,29%

Строительная готовность



01.11.2021

Планируемая дата
ввода

▲8,58% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 г.



107

Люди



5

Техника





№ ГК-001 от 28.10.2019

Подрядчик: ЗАО «СУОР-3»



56,07%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая
дата ввода

▲ 6,23% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



19

Люди



4

Техника



с. Авадан, Докузпаринский район, Республика Дагестан
Общеобразовательная организация на 400 учебных мест (шифр шк-6)



№ ГК-002 от 28.10.2019

Подрядчик: ООО СК «АРМАДА»
(Исполнитель работ: "ЗАО «Амирус»)



48,41%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая дата
ввода

▲4,71% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



14

Люди



0

Техника





№ ГК-003 от 28.10.2019

Подрядчик: ООО "Ботлихагропром-дорстрой"



43,62%

Строительная готовность



01.12.2021

Планируемая дата
ввода

▲5,13% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



11

Люди



1

Техника



Объекты социальной инфраструктуры в низкой степени готовности

(готовность менее 30%)



Школы 8



№ ГК-78 от 15.09.2020

Подрядчик: СД «Атриум»



28,05%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая дата ввода

▲ 13,19% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



130

Люди



8

Техника





№ ГК-32 от 23.12.2019

Подрядчик: ООО «Аргвиль»



25,75%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая дата
ввода

2,35 % - динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



1

Люди



0

Техника





№ ГК- 75 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО "Биз-СЕРВИС"



25,38%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая дата
ввода

▲ 10,12% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



146

Люди



13

Техника





№ ГК-69 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Маг Строй»



24,32%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая дата
ввода

▲7,91% – динамика выполнения работ за неделю



43

Люди



4

Техника





№ ГК-77 от 15.09.2020

Подрядчик: ООО "Инжстрой-2А"



23,05%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая дата
ввода

▲8,77%– динамика выполнения работ за II кварта 2021 года



37

Люди



4

Техника





№ ГК-79 от 31.10.2020

Подрядчик: ООО «ГЛАВМОНТАЖСТРОЙ»



20,35%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая дата
ввода

▲ 10,13% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



98

Люди



6


Техника





№ ГК-82 от 26.12.2020

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»



9,08%

Строительная готовность



30.03.2022

Планируемая дата
ввода

▲ 4,42% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 г.



20

Люди



2

Техника





№ ГК-83 от 26.12.2020

Подрядчик: ООО "Рост-Юг-Строй"



0,30%

Строительная готовность



26.11.2021

Планируемая дата
ввода

0,30 % - динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



2

Люди



0

Техника



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ»**

**Объекты дошкольного образования
(незавершенные объекты)**

на 1 июля 2021 года

Объекты социальной инфраструктуры в высокой степени готовности

(готовность более 75%)



Детские сады

4



Ясли

17




№ ГК-009 от 05.11.2019	
<i>Подрядчик: ООО «Строй-Инвест» (исполнитель работ ООО «Кавказстрой-С»)</i>	
 99,05% Строительная готовность	 15.06.2021 Планируемая дата ввода
▲ 2,05% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года	
 12 Люди	 0 Техника





№ ГК-31 от 23.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»



98,76%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 9,64% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 год



3

Люди



0

Техника





№ ГК-33 от 23.12.2019	
Подрядчик: ООО «СК «А-СТРОЙ»	
 98,42% Строительная готовность	 01.07.2021 Планируемая дата ввода
▲ 4,86% - динамика выполнения работ за II квартал 2021 года	
 1 Люди	 0 Техника



г. Каспийск (мкр. № 11), Республика Дагестан
Дошкольная образовательная организация (ясли) на 250 мест (шифр яс-29)



№ ГК-27 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»



98,40%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая
дата ввода

▲ 3,12% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



23

Люди



0


Техника





№ ГК-56 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»



97,46%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲2,12% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



10

Люди



0

Техника



Наименование объекта:
Дошкольная образовательная организация
на 250 мест в г. Каспийск Республики
Дагестан, мкр. «Кемпинг»

Адрес объекта:
г. Каспийск, Республика Дагестан,
мкр. «Кемпинг»

Заказчик:
ООО «Рост-Юг-Строй» (ИНН 05-01-0000000, ОГРН 5050500000000)
г. Магас

Ген. подрядчик:
ООО «Рост-Юг-Строй» (ИНН 05-01-0000000, ОГРН 5050500000000)
г. Магас

Сроки строительства:
сентябрь 2019 г.



№ ГК-021 от 14.12.2019

Подрядчик: ООО «Строитель-3»



97,23%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 0,89% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



1

Люди



0

Техника





№ ГК-38 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(исполнитель работ ООО «Компоно»)



96,48%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 0,92% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



16
Люди



0
Техника





№ ГК-27 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»



95,21%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата ввода

▲5,98% –динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



23

Люди



0

Техника





№ ГК-48 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(исполнитель работ ООО «СпецПромСтрой»)



95,16%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая
дата ввода

▲3,68% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 год



10

Люди



0

Техника





№ ГК-49 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО СФ «Прогресс»)



93,22%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 11,49% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 г.



19

Люди



2

Техника





№ ГК-53 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Мах Строй»



90,36%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲5,18% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 г.



13

Люди



1

Техника





№ ГК-30 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»



88,94%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая
дата ввода

▲ 16,93% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



9

Люди



1

Техника





№ ГК-42 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО «Мах Строй»



87,07%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲5,33% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



11

Люди



0

Техника





№ ГК-59 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Ф-Групп»



85,43%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 5,93% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



16

Люди



0

Техника





№ ГК-45 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО «Интер-Каспий»)



82,46%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая
дата ввода

9,81% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



28

Люди



5


Техника





№ ГК-013 от 05.11.2019

Подрядчик: ООО "Интеко"



78,15%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая
дата ввода

▲5,81% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



8

Люди



1


Техника





№ ГК-73 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Строй-Холдинг»

 **75,63%**  **01.08.2021**

Строительная готовность Планируемая дата ввода

▲9,07% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года

 **15**  **2**

Люди Техника





№ ГК-019 от 13.11.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Инвест»
(Исполнитель работ: ООО "Магнит-1")



75,0%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 4,77% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



24

Люди



2


Техника





№ ГК-018 от 14.12.2019

Подрядчик: ООО «Магнит 1»



74,62%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲8,83%– динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



12

Люди



1

Техника



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА: Дошкольная образовательная организация на 200 мест
г. Хасавюрт, мкр. «Мичурино», Республика Дагестан

АДРЕС ОБЪЕКТА: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, мкр. «Мичурино», ул. Дарья, 25

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Б» Управление государственного заказчика
государственных закупок

Адрес: 367000 Республика Дагестан, г. Хасавюрт, мкр. «Мичурино», ул. Дарья, 25
контактный телефон: +7(873) 22 4 34 41

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК: ООО «Магнит 1»

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, мкр. «Мичурино», ул. Дарья, 25
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, мкр. «Мичурино», ул. Дарья, 25

СУБПОДРЯДЧИК: ООО «Магнит 1»

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, мкр. «Мичурино», ул. Дарья, 25

ОТВЕТСТВЕННЫЕ:
Исполнитель: 367000
Специальный представитель: 367000

ИНИЦИАЛЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:



№ ГК-28 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»



74,35%

Строительная готовность



01.07.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 12,08 % – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



15

Люди



0

Техника





№ ГК-55 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО «ЦемСтройИнжиниринг»)



74,01%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 4,86 % – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



22

Люди



3

Техника



Объекты социальной инфраструктуры в средней степени готовности

(готовность от 40 % до 74 %)



Детские сады

2



Ясли

8

с. Хамаматюрт, Бабаюртовский район, Республика Дагестан
Дошкольная образовательная организация (ясли) на 100 мест (шифр дс-10)



№ ГК-010 от 05.11.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО «Берегстрой»)



71,74%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲5,19% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



1

Люди



0

Техника





№ ГК-26 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»



67,57%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲7,6%– динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



30

Люди



2

Техника





№ ГК-51 от 28.12.2019	
<i>Подрядчик: "ООО СК "АРМАДА" (Исполнитель работ: ООО "СтройТрейд")</i>	
 66,95% Строительная готовность	 01.08.2021 Планируемая дата ввода
▲8,21% динамика выполнения работ за II квартал 2021 года	
 27 Люди	 0 Техника





№ ГК-024 от 14.12.2019

Подрядчик: ООО "СК "А-СТРОЙ"



65,55%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата ввода

▲3,64% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



7

Люди



0

Техника





№ ГК-47 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Эксперт»



63,60%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲13,31% динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



12

Люди



0

Техника





№ ГК-41 от 27.12.2019

Подрядчик: *ООО СМК «ЖИЛЬЕ»*

 **58,59%**
Строительная готовность

 **01.08.2021**
Планируемая дата ввода

▲9,82% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года

 **32**
Люди

 **1**
Техника





№ ГК-46 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(исполнитель работ ООО «Транс-сервис»)



56,76%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 5,93% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



22

Люди



2

Техника





№ ГК-40 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(исполнитель работ ООО «Спецстрой»)



57,33%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲2,5% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года




9

Люди



1

Техника

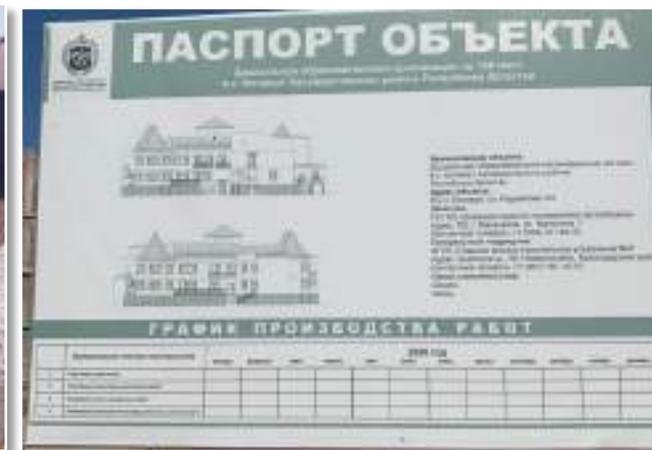



№ ГК-34 от 23.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО "ИСК")



53,87%

Строительная готовность



01.08.2021

Планируемая дата
ввода

▲5,75% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года




40

Люди



1

Техника

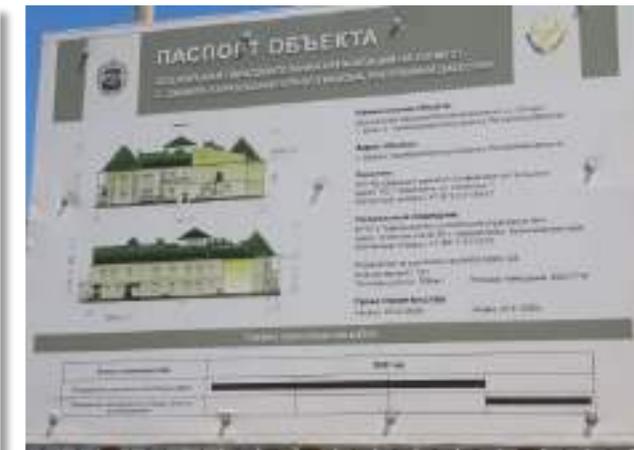



№ ГК-37 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО «СК А-СТРОЙ»



49,46%

Строительная готовность



01.10.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 3,53 % – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



1

Люди



0

Техника



Объекты социальной инфраструктуры в низкой степени готовности

(готовность менее 0 % - 39%)



Ясли

7



№ ГК-52 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Холдинг»



38,74%

Строительная готовность



01.11.2021

Планируемая дата
ввода

▲9,72% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



13

Люди



3

Техника





№ ГК-72 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Родник»



32,24%

Строительная готовность



01.11.2021

Планируемая дата
ввода

▲ 4,29%

– динамика выполнения работ за II квартал 2021
года



13

Люди



2

Техника





№ ГК-81 от 14.12.2020

Подрядчик: ООО «Инжстрой-2А»



25,82%

Строительная готовность



01.11.2021

Планируемая дата
ввода

▲5,59% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года




24

Люди



3

Техника

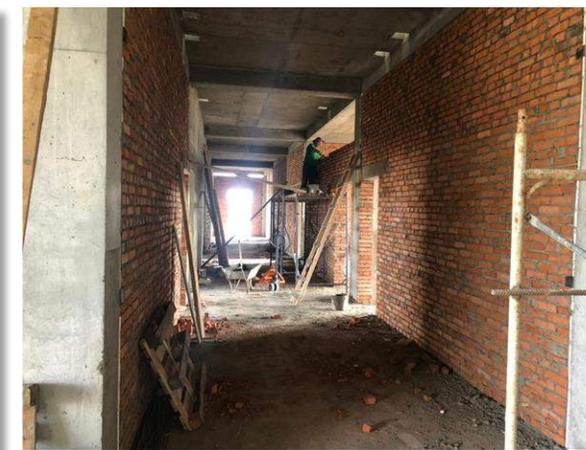



№ ГК-54 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Луч-2»



18,86%

Строительная готовность



01.12.2021

Планируемая дата
ввода

▲2,28% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



35

Люди



3

Техника





№ ГК-74 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Спецстрой»



10,07%



01.11.2021

Строительная готовность

Планируемая дата
ввода

▲ 2,36 % - динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



10

Люди



3

Техника





№ ГК не заключен (на подписи)

Подрядчик:



0%

Строительная готовность



01.11.2021

Планируемая дата
ввода

▲0% – динамика выполнения работ за II квартал 2021 года



25

Люди



4

Техника



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

(объекты культуры)

на 1 июля 2021 года

Капитальный ремонт «Межпоселенческого центра культуры» с. Советское Магарамкентского района



№ ГК от 16.04.2021

Подрядчик: ООО «ФАВОРИТ»



Капитальный ремонт ДШИ №3 Махачкала им А. Цурмилова



№ ГК от 19.04.2021

Подрядчик: ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ»



Капитальный ремонт Дома культуры с. Н.Инхо, Гумбетовского района



№ ГК от 12.04.2021

Подрядчик: ООО «БАННА»



Капитальный ремонт ДШИ № 1 Дагестанские огни



№ ГК от 07.06.2021

Подрядчик: ООО «ГАМЗА»



Капитальный ремонт Дома культуры с. Юхари-Ярак, Хивского района




№ ГК от 27.04.2021

Подрядчик: ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»




Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка»



№ ГК-1 от 14.05.2020	
ООО «Строительно-монтажное управление – 55»	
 18,5% Строительная готовность	 2020 – 2022 гг. Сроки строительства по ГК




Капитальный ремонт ДШИ Хивский район

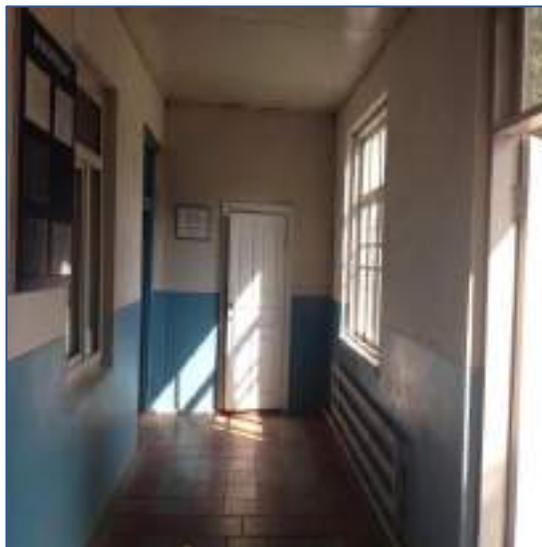

№ ГК от 29.04.2021

Подрядчик: ООО «ДАГСВЯЗЬИНВЕСТ-1»

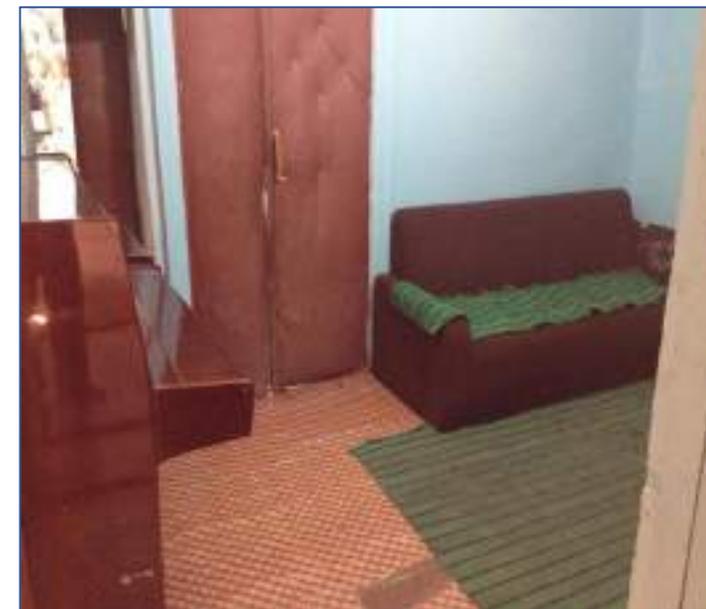

Капитальный ремонт Дома культуры с. Меgeb, Гунибского района



№ ГК от 10.06.2021

Подрядчик: ООО «РОС-ТЕК»



Строительство Дома культуры с. Сагаси-Дейбук, Каякентского района



№ ГК от 25.05.2021
<i>Подрядчик: ОАО «ЖИЛЬЕ»</i>



Строительство Дома культуры с. Кунбатар, Ногайского района



№ ГК от 21.06.2021

Подрядчик: ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»

Капитальный ремонт Дома культуры с. Салта, Гунибского района



№ ГК от 21.06.2021

Подрядчик: ООО «СМК»



Капитальный ремонт Дома культуры с. Тпиг, Агульский район



№ ГК от 09.06.2021

Подрядчик: ООО «КОНСОЛИДЕЙТЕДСТРОЙ»



Строительство Центра культурного развития г. Кизляр

№ ГК 07.05.2021

Подрядчик: ООО «ФАВОРИТ»



Строительство Дома культуры с. Губден, Карабудахкентского района



№ ГК 28.06.2021

Подрядчик: ООО «ДАГЕСТАНСТРОЙ»



Строительство Дома культуры с. Зидьян-Казмаляр, Дербетского района



№ ГК от 23.06.2021

Подрядчик: ООО «ПОН»



Капитальный ремонт Дома культуры с. Урари Дахадаевского района



№ ГК **Работа комиссии**

Подрядчик ООО «АСК-КРЕПОСТЬ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

**«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**

(Махачкалинская городская агломерация (до ремонта))

Ленинский район


321



ул. 10-я Акгельная



ул. 1-й Скульптурный пр.

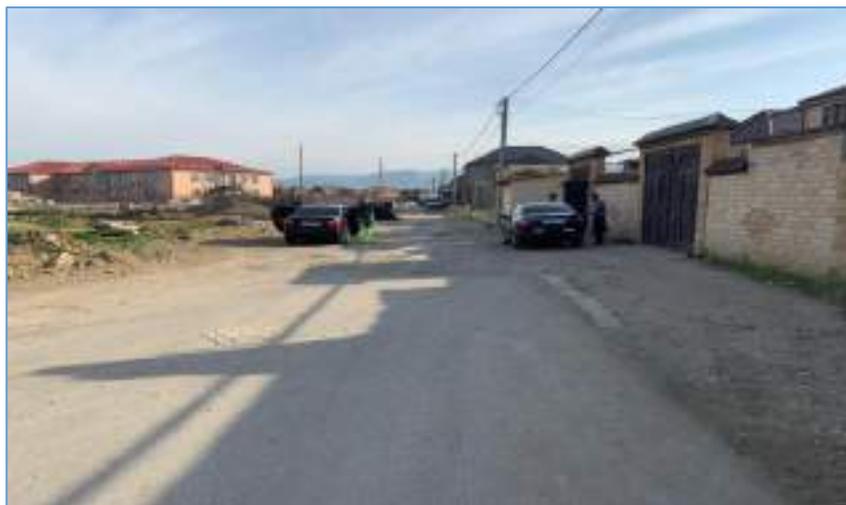

ул. 2-я Малиновая



ул. 2-я Офицерская



ул. Бабаюртовская



ул. Батырая (н. Хушет)



ул. Венгерских бойцов



ул. Гайдара (тротуар)



ул. Градостроительная



ул. Джигитская



ул. Добролюбова II



ул. З. Космодемьянской



ул. И. Казака (дома 26-28)



ул. Ибакова



ул. Кадарская



ул. Каримова



ул. Мурадова (тротуар)



ул. Самурского



ул. Славы



ул. Таркинского



ул. Узорная



ул. Устарбекова



ул. Финская



ул. Хурукринская



ул. Энергетиков



ул. Абдуллаева (п. Н. Кяхулай)



ул. Колхозная



ул. М. Азизова



проезд между Реабилитационный центр
и дет. садом № 50



ул. 5-я Ветеранская



ул. Аграрная



ул. Губденская



ул. Декоративная



ул. Декоративный 3-й тупик



проезд от ул. И. Казака до ул. Юсупова

Советский район

330



проезд от ул. Ташкентская до ул. Ш. Алиева



ул. 1-й Заречный тупик



ул. 2-й проезд Бабаева



ул. 5-я Таркинская



ул. Айвазовского



ул. Г. Омарова



ул. Перова



ул. Свободы (п. Тарки)



ул. А. Сулейманова



ул. Алиярова



ул. Асиятилова от ул. Гоголя до
ул. Ляхова



ул. Ахундова от д. № 22 до д. № 82



ул. Исмаилова



ул. Ляхова



ул. Коркмасова – ул. Умаханова до ул.
Абубакарова



ул. Радищева



ул. Абубакарова – ул. Коркмасова до ул. А. Кадырова



ул. А. Кадырова – ул. Абубакарова до ул. Дахадаева

Кировский район

335




ул. Б. Хмельницкого



дорога от ул. Героев Дагестана до
ул. Абу-Муслима Атаева



Проезд от ул. Пушкина до молочного
комбината (п. Шамхал)

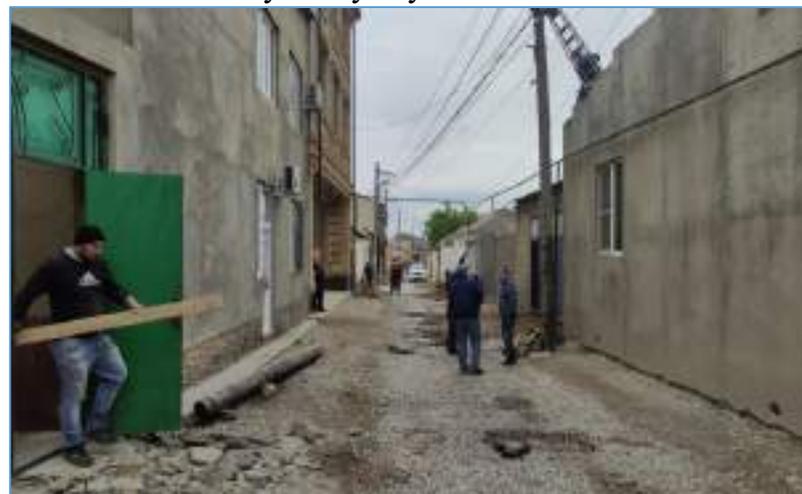

ул. 1-я Дачная



ул. 2-я Юбилейная



ул. 7-я Вагонная



ул. Артиллерийская



ул. Атлы-Баюнская



ул. Братьев Мугуевых



ул. Виноградная



ул. Влажная (ул.Эрпилинская)



ул. Гази Умарова



ул. Гергемильская МКР Наука



ул. Даганова включительно проезд до ул. 6-я
Учхозная



ул. Каратинская



ул. Комсомольская (п. Красноармейск)



ул. Крымская Весна



ул. Кутузова



ул. Лиственная



ул. Маджалиская



ул. Маркова (п. Семендер)



ул. Махачкалинская (п. Семендер)



ул. Межевая



ул. Минеральная с переходом на ул. Эльтавная 2(в районе школы №61)



ул. Нефтяная



ул. Образовательная



ул. Победы (п. Шамхал)



ул. Подвального



ул. Рахматуллаева



ул. Свердлова



ул. Седова (п. Семендер)



ул. Чернышевского (п. Шамхал)



ул. Шамхальская (п. Семендер)



ул. Эрпелинская - Влажная



ул. Таркинская (п. Семендер)



ул. Ялакская



ул. 1-я Кооперативная МКР Наука



ул. 2-я Больничная квартал ДРКБ



2-я Эльтавная улица



ул. Научная МКР Наука



ул. Мугудова пос. Ленинкент



1-й Гранитный проезд МКР"Эльтав"



ул. Камалова
