



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(на 1 ноября 2022 года)**

**МАХАЧКАЛА
2022**

Содержание

1.	Общие положения.....	3
2.	Национальный проект «Демография»	7
3.	Национальный проект «Здравоохранение».....	22
4.	Национальный проект «Образование».....	32
5.	Национальный проект «Жилье и городская среда».....	50
6.	Национальный проект «Экология».....	56
7.	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».....	61
8.	Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	68
9.	Национальный проект «Культура»	72
10.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».....	77
11.	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»..	82
12.	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»	84
13.	Национальный проект «Наука и университеты»	86
14.	Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	89
15.	Выводы.....	94
16.	Предложения	106
17.	Приложение	107

1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан, в соответствии с Планом работы на 2022 год проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 ноября 2022 года, по результатам которого установлено следующее.

1. В 2022 году Республика Дагестан участвует в реализации 13 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт».

В рамках указанных национальных проектов реализуется 48 региональных проектов в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

2. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 31 422,0 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 25 279,3 млн рублей, или 80,5 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 804,0 млн рублей или 12,1 %;
- внебюджетных источников – 2 338,7 млн рублей, или 7,4 % (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 611,8 млн рублей, Федерального фонда социального страхования – 84,0 млн рублей, муниципальных образований – 221,0 млн рублей, медицинских организаций – 233,8 млн рублей, средства «Даглес» – 5,6 млн рублей, средства юридических лиц – 190,6 млн рублей).

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и национального проекта «Наука и университеты» в 2022 году не предусмотрено.


В общем объеме бюджетных ассигнований (31 422,0 млн рублей) наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных проектов: «Образование» – 12 588,6 млн рублей, или 40,1 %, «Демография» – 7 180,2 млн рублей, или 23,0 %, «Здравоохранение» – 4 887,1 млн рублей, или 15,6 %, «Жилье и городская среда» – 2 737,8 млн рублей, или 8,7 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 355,2 млн рублей, или 7,5 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

3. По состоянию на 1 ноября 2022 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 20 673,1 млн рублей, или 65,8 % от объема годовых назначений (31 422,0 млн рублей), (приложение № 1).

Данные средства направлены на финансирование 34 региональных проектов, по которым предусмотрено финансирование в 2022 году.

**Финансирование
национальных проектов в 2022 году**

млн рублей

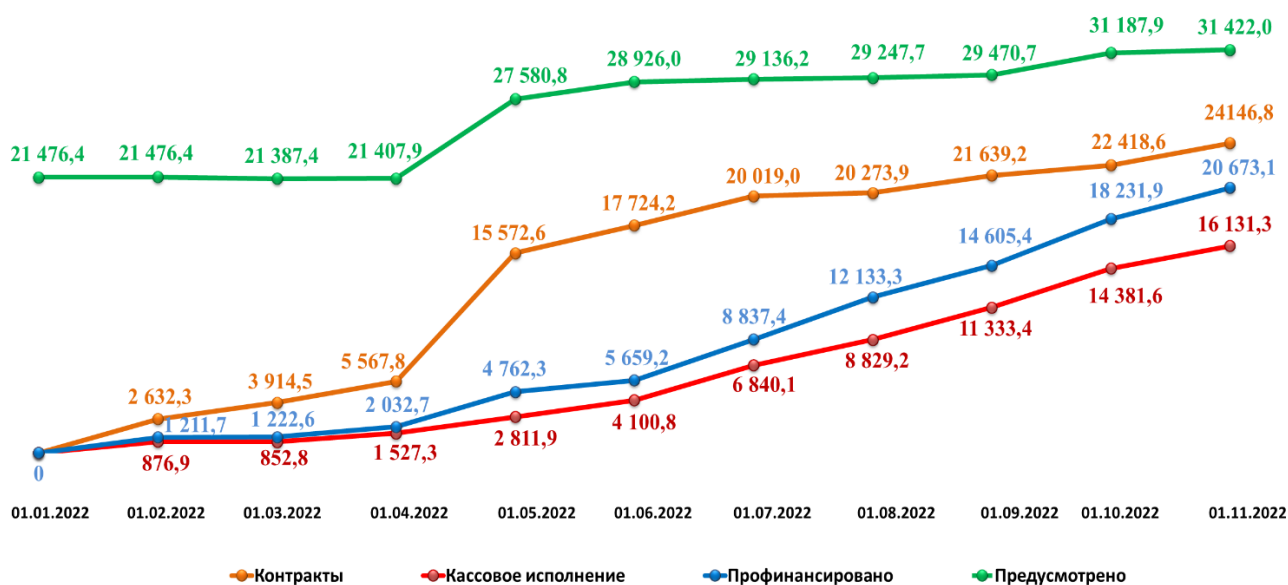

Из общей суммы бюджетных ассигнований, профинансированных на реализацию национальных проектов (20 673,3 млн рублей), освоено 16 158,4 млн рублей, или 78,2 % от объема финансирования, и 51,4 % от объема годовых назначений на 2022 год (31 422,0 млн рублей). Причем из общей суммы кассовых расходов (16 158,4 млн рублей) 27,5 % (4 442,7 млн рублей) не связаны с контрактными обязательствами и приходятся на выплаты на поддержку семей при рождении детей по национальному проекту «Демография».

Из 11 финансируемых национальных проектов:

- по 2 национальным проектам освоено 100 % (нацпроект «Производительность труда» – 6 млн 500 тыс. рублей, и нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» – 334 млн рублей). Средства перечислены на счета контрагентов;

- по 4 национальным проектам освоение составляет от 73 % до 98 % («Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (98 %), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (83 %), «Жилье и городская среда» (83 %), «Демография» (72 %));


- по 2 национальным проектам освоение – от 65 % до 68 % («Цифровая экономика» (68 %), «Культура» (65 %));

- по 3 национальным проектам освоение – менее 50 % («Экология» (22 %), «Образование» (25 %), «Здравоохранение» (47 %)).

Из 34 финансируемых региональных проектов, по 9 региональным проектам средства освоены в полном объеме.

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов на 1 ноября 2022 года


млн рублей

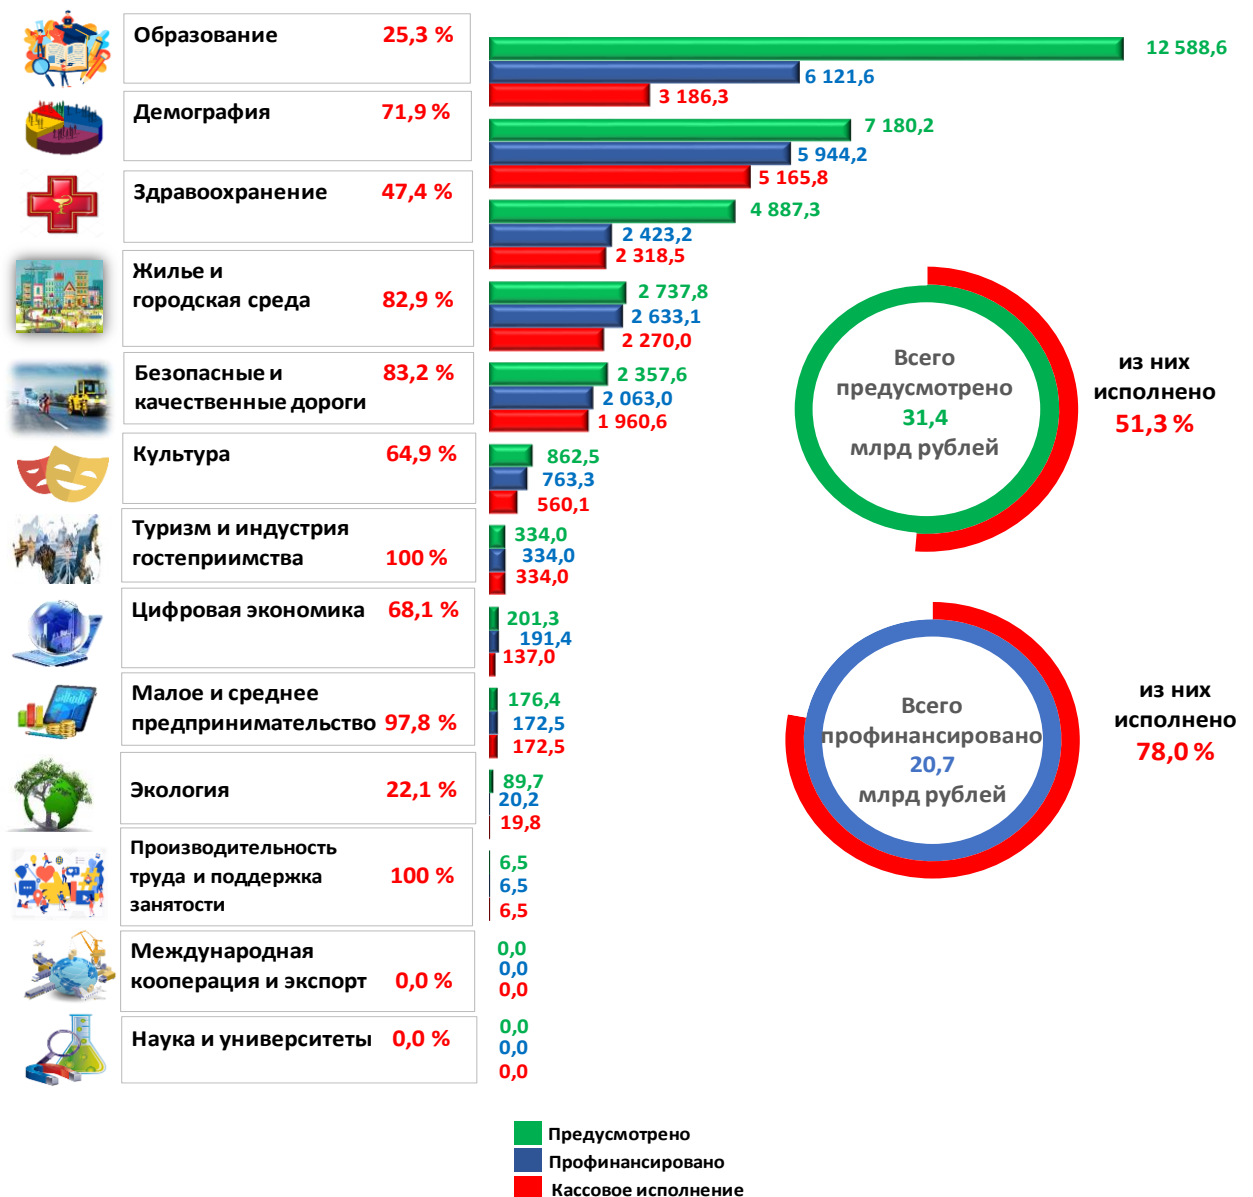

4. В целях реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году запланировано заключить 1 191 контракт (договор). Заключены 1 103 контракта (договора) на общую сумму 24 147,0 млн рублей, или 92,6 % от планового объема (1 191 контракт).

Не заключены 88 контрактов (договоров), из которых заключение 8 контрактов (договоров) запланировано на ноябрь 2022 года, 80 контрактов на декабрь 2022 года (договоры по программе «Земский доктор»).

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году

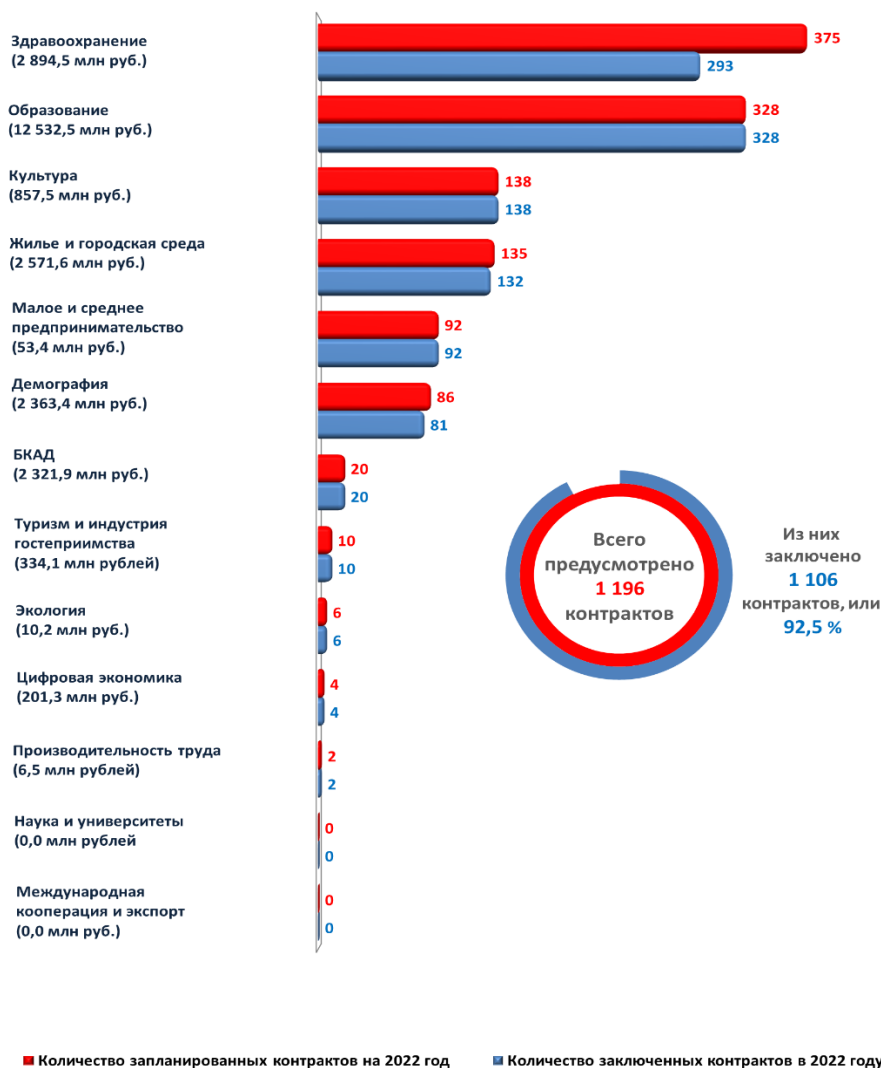

Из 11 национальных проектов, в рамках которых предусмотрено заключение государственных контрактов:

– по 8 национальным проектам контракты заключены в полном объеме («Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Производительность труда и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»);

– по 2 национальным проектам уровень заключения контрактов составляет от 80 % до 100 % («Демография» – 82 %, «Жилье и городская среда» – 99 %);

– по 1 нацпроекту («Здравоохранение») уровень заключения контрактов составил 80 %.

С учетом поздних сроков заключения контрактов, основной объем кассовых расходов по национальным проектам будет осуществлен не ранее IV квартала текущего года, что существенно увеличивает риски своевременного освоения предусмотренных бюджетных назначений.



2. Национальный проект «Демография»

Кураторы национального проекта:



Казиев М.Н.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики
Дагестан



Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Махмудов А. М.
Министр труда и
социального развития
Республики Дагестан



Беляева Т. В.
Министр
здравоохранения
Республики Дагестан



Сажидов С. Х.
Министр по физической
культуре и спорту
Республики Дагестан



Сулейманов А.А.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики Дагестан



Бучаев Я. Г.
Министр образования и
науки Республики
Дагестан

2.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) *«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;*
- 2) *«Содействие занятости»;*
- 3) *«Старшее поколение»;*
- 4) *«Укрепление общественного здоровья»;*
- 5) *«Спорт – норма жизни».*

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2022 году задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (4 651,4 млн рублей), Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан (153,0 млн рублей), Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (402,1 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (1 973,7 млн рублей).

В 2022 году на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 180,2 млн рублей, (средства федерального бюджета – 6 512,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 514,6 млн рублей, внебюджетные средства (ТФОМС) – 153,0 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы расходы в сумме 5 944,2 млн рублей, или 82,8 % от годовых назначений (7 180,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 5 165,8 млн рублей, или 87,0 % от объема финансирования и 72,0 % от годовых назначений.

В рамках национального проекта «Демография» заключен 81 контракт, на сумму 2 363,4 млн рублей, или 94,2 % от годового плана (86 контрактов).

2.2. В 2022 году по национальному проекту «Демография» из 5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных проектов, в том числе:

1) Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году предусмотрено:

- предоставление ежемесячных выплат 44,3 тыс. семей в связи с рождением первого ребенка – 4 626,2 млн рублей (средства федерального бюджета);

- проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (1,3 тыс. циклов) семьям, страдающим бесплодием – 153,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (4 626,2 млн рублей) совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан (153,0 млн рублей).

Предусмотрено финансирование в сумме 4 779,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 4 626,2 млн рублей, средства Территориального фонда ОМС (на проведение процедур ЭКО) – 153,0 млн рублей).

Профинансировано 4 527,4 млн рублей, или 94,7 % от годовых назначений (4 779,2 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 4 525,0 млн рублей, или 99,9 % от объема финансирования, или 94,7 % от годовых назначений (по ежемесячным выплатам – 4 442,7 млн рублей, по процедурам ЭКО – 94,4 млн рублей).

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 44 479 семей или 100,4 % от планового объема (44 300 семей).

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования обеспечено выполнение 1 108 процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, или 85,2 % от плана (1 300 процедур).

В 2022 году для выполнения процедур ЭКО был осуществлен переход к использованию метода «криоперенос». Указанный метод в сравнении с полным циклом ЭКО является менее затратным и более эффективным. Однако, в данном случае, в связи с удешевлением процедуры ЭКО, возможно неполное освоение предусмотренного объема финансирования данного результата (около 35 млн рублей) по итогам 2022 года.

2) Региональный проект «Содействие занятости».

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» в 2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

– создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (20 садов на 1 950 мест) предусмотрено 230,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 123,76 млн рублей);

– создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет (38 садов на 7 210 мест) – 1 743,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 361,9 млн рублей);

– создание центра занятости населения в Республике Дагестан – 25,0 млн рублей;

– создание не менее 15 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования;

– повышение квалификации 1,5 тыс. специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми в частном секторе.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (25 млн рублей) и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (1 973,8 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 998,8 млн рублей¹ (средства федерального бюджета – 1 510,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 488,4 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 1 094,0 млн рублей, или 54,8 % от годовых назначений (1 998,8 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 371,3 млн рублей, или 34,0 % от объема финансирования, или 18,6 % от годовых назначений (1 998,8 млн рублей).

Финансирование и кассовое освоение осуществлены в части мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных организациях.

В ходе реализации регионального проекта заключено 2 контракта из 7 запланированных на строительство детсада (ясли) в селе В. Дженгутай Буйнакского района на сумму 99,8 млн рублей (бюджет 2022 года – 47,5 млн рублей), и ремонт помещения ГКУ РД Центра занятости населения в МО «город Махачкала» на сумму 7,35 млн рублей.

Из 5 незаключенных контрактов:

– по 1 контракту определен победитель аукциона на закупку мебели, планируется заключение контракта на сумму 1,584 млн рублей;

– по 4 контрактам по закупке оргтехники проводится работа по подготовке документации для объявления аукционов (торгов).

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 года № 206-р, строительство детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест, будет осуществлять ООО СМК «Жилье».

Следует отметить, что в общий объем контрактов по региональному проекту в рамках строительства объектов дошкольного образования дополнительно включены 60 контрактов, заключенных в 2019 - 2021 годах в целях освоения остатков бюджетных средств, неиспользованных в 2021 году.

Всего в ходе реализации регионального проекта по 2 мероприятиям предусмотрено строительство 59 объектов дошкольного образования на 9 360 мест.

¹ с учетом неиспользованных в рамках строительства 57 объектов дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет остатков бюджетных средств 2021 года и дополнительно предусмотренных средств республиканского бюджета Республики Дагестан согласно Закону РД от 29.12.2021 г. № 91 (в редакции от 30.04.2022 г. № 32)

1) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (20 детских садов на 1 950 мест).

На завершение строительства объектов дошкольного образования в рамках данного мероприятия между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключено дополнительное Соглашение от 27 апреля 2022 года № 073-17-2019-015/9 с объемом финансирования в сумме 207,13 млн рублей (федеральный бюджет – 123,67 млн рублей и республиканский бюджет – 83,46 млн рублей).

В соответствии с Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год запланировано финансирование в сумме 230,76 млн рублей (федеральный бюджет – 123,67 млн рублей (в том числе из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 52,64 млн рублей) и республиканский бюджет – 107,09 млн рублей), в том числе в рамках Соглашения – 207,13 млн рублей.

На выполнение строительных работ с ФГУП «ГУСС» (генеральный подрядчик) заключены 20 контрактов на сумму 1 911,4 млн рублей, в том числе по завершенным объектам – 1 328,81 млн рублей и по незавершенным объектам – 582,6 млн рублей.

На 1 ноября 2022 года произведено финансирование в сумме 163,8 млн рублей (в том числе в рамках Соглашения – 135,8 млн рублей) при кассовом исполнении в сумме 29,73 млн рублей, или 18,1 % от финансирования.

Оперативное выполнение с начала строительства на 1 ноября 2022 года составило 1 708,53 млн рублей, из них: по завершенным объектам – 1 277,3 млн рублей и по незавершенным объектам – 431,2 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составил 1 609,4 млн рублей, или 84,2 % от общей стоимости заключенных контрактов, в том числе по завершенным объектам – 1 269,8 млн рублей и по незавершенным объектам – 339,5 млн рублей.

За 10 месяцев 2022 года выполнение по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составило в сумме 61,7 млн рублей, в том числе за октябрь 2022 года в сумме 24,1 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 года из 20 детских садов на 1 950 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию в 2019 – 2022 годах **завершено строительство 16 детсадов на 1 570 мест**, в том числе:

- по 14 детсадам на 1 410 мест получена лицензия на осуществление образовательной деятельности;
- по 2 детсадам (на 60 мест в г. Махачкале (ул. Фонвизина, 6), на 10 мест в г. Избербаше (ул. Кураева, 30) строительные работы завершены.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень детских садов по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	% готовности
1	Детсад г. Каспийск МКР № 10	100	73,26	64,22	64,22	Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад в Буйнакск (ул. Али-Клыча, 86)	60	62,93	61,40	61,40	Получена лицензия
3	Детсад в г. Хасавюрт, ул. 40 лет Октября	120	101,08	96,25	96,25	Получена лицензия
4	Детсад в с. Кульзёб Кизилюртовского района	60	75,08	74,16	74,16	Получена лицензия
5	Детсад в с. Араблинское Дербентский район	100	94,86	94,86	94,86	Получена лицензия
6	Детсад в п.Ленинаул Казбековский район	100	94,12	86,39	86,39	Получена лицензия
7	Детсад в с. Магарамкент Магарамкентский район	60	66,05	62,54	62,54	Получена лицензия
8	Детсад в г. Махачкала МКР "Ак-Гель"	250	195,33	192,72	192,72	Получена лицензия
9	Детсад в г. Дербент	60	63,07	53,41	53,41	Получена лицензия
10	Детсад в г. Кизляр, ул. Кочубея, 28	100	98,83	98,83	98,83	Получена лицензия
11	Детсад в с. Учкент Кумторкалинский район	100	95,70	87,45	87,45	Получена лицензия
12	Детсад в с. Новые Викри Каякентский р-н	120	125,04	124,92	124,92	Получена лицензия
13	Детсад в с. Эндирей Хасавюртовский район	120	107,95	107,45	107,95	Получена лицензия
14	Детсад в г. Махачкала ул. Азиза Алиева,32	60	75,50	65,24	72,23	Получена лицензия
	Итого по завершённым	1410	1 328,8	1 269,8	1 277,33	
15	Детсад в г. Махачкала, ул. Фонвизина,6	60	75,37	66,81	70,65	100
16	Детсад в г. Избербаш	100	116,33	76,18	101,75	100
17	Детсад в с. Хамагатюрт Бабаюртовский района	100	103,89	84,64	84,64	99,99
18	Детсад в с. Тинди Цумадинский район	60	75,56	57,79	57,79	96,40
19	Детсад в с. Миарсо Ботлихского района	100	103,79	41,42	65,82	91,6
20	Детсад в п. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	107,66	12,69	50,55	65,37
	Итого по незавершённым	540	582,6	339,5	431,2	
	Итого	1 950	1 911,4	1 609,4	1 708,5	

Не завершено строительство 4 детсадов на 380 мест с уровнем готовности от 65,4 % до 99,9 % (на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы – 65,4 %, на 100 мест в с. Миарсо Ботлихского района – 91,6 %, на 60 мест в с. Тинди Цумадинского района – 96,4 %, на 100 мест в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района – 99,9 %).

По незавершенным объектам сроки завершения строительных работ перенесены с октября 2022 года на конец года. Передача имущественного комплекса в муниципальную собственность запланирована на I квартал 2023 года.

С учетом низкой строительной готовности (65,4 %), существует высокий риск завершения строительства в установленные сроки детсада на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы.

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (38 детских садов (яслей) на 7 210 мест).

В 2022 году в соответствии с дополнительным Соглашением от 17 сентября 2022 года № 073-09-2022-905/4, количество строящихся объектов увеличено до **39 объектов на 7 460 мест**, с предусмотренным объемом финансирования до 1 813,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 664,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 148,9 млн рублей), в том числе:

– в 2022 году на строительство 38 объектов на 3 400 мест (начало строительства детсада (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района) – 1 497,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 361,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 135,1 млн рублей);

– в 2023 году на начало строительства 1 объекта (детсад (ясли) на 250 мест в МКР ДОСААФ г. Махачкалы) и завершение 2 объектов – 316,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 302,88 млн рублей, средства республиканского бюджета – 13,87 млн рублей);

– в 2023 году – 316,75 млн рублей (федеральный бюджет – 302,88 млн рублей и республиканский бюджет – 13,87 млн рублей) на начало строительства 1 объекта на 250 мест в МКР «Тарки-Тау» г. Махачкалы – 284,5 млн рублей и завершение 2 объектов – 32,25 млн рублей.

В соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2022 год, а также сводной бюджетной росписью запланировано финансирование в сумме 1 743,0 млн рублей (федеральный бюджет – 1 361,93 млн и республиканский

бюджет – 381,1 млн рублей), в том числе в рамках Соглашения – 1 497,02 млн рублей.

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГУСС» были заключены 37 контрактов на сумму 6 023,3 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам – 3 960,9 млн рублей и по не завершенным объектам – 2 062,4 млн рублей.

На 1 ноября 2022 года произведено финансирование в сумме 960,7 млн рублей, из них кассовое исполнение осуществлено в сумме 371,2 млн рублей, или 38,6 % от финансирования.

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) на 1 ноября 2022 года составило 5 273,8 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам – 3 172,6 млн рублей и по незавершенным объектам – 2 101,2 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составил 5 042,4 млн рублей (83,7 % от стоимости заключенных контрактов), в том числе по завершенным объектам – 3 818,7 млн рублей (96,4 % от стоимости заключенных контрактов) и по не завершенным объектам – 1 224,2 млн рублей (59,4 % от стоимости заключенных контрактов).

За 10 месяцев 2022 года ФГУП «ГУСС», согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, выполнены строительные работы на сумму 569,5 млн рублей, в том числе за октябрь 2022 года на сумму 86,9 млн рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства РД от 31 мая 2022 года № 206-р подрядчиком на строительство детского сада (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района определена подрядная организация ООО СМК «Жилье» (заказчик – ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»). Контракт с ООО СМК «Жилье» заключен 20 июля 2022 года на сумму 99,82 млн рублей. Начало строительства предусмотрено в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году. Строительные работы не начаты.

По состоянию на 1 ноября 2022 года из 38 детских садов (яслей) на 7 210 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию и началу строительства в 2020-2022 годах, **завершено строительство 24 объектов на 4 700 мест**, из них по:

– 18 объектам на 3 560 мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию (по 17 объектам на 3 310 мест получена лицензия на образовательную деятельность);

- 6 объектам на 1 140 мест завершены строительные работы.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

**Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

млн рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	План ввода в эксплуатацию	% стронт. готовности
1	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»)	200	167,33	167,17	167,17	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Сулак)	200	164,75	162,13	162,13	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
3	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 11)	250	205,0	204,9	204,9	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
4	Детсад (ясли) в г. Кизляре	250	211,75	211,55	211,55	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
5	Детсад (ясли) в с. Буртунай (Казбековский район)	60	69,74	70,28	70,28	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
6	Детсад (ясли) в с. Сиртыч (Табасаранский район)	60	66,90	66,90	66,90	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
7	Детсад (ясли) в с. Доргели (Карабудахкентский район)	200	173,22	172,56	172,56	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
8	Детсад (ясли) в г. Кизилюрте (МКР №3)	250	191,99	191,96	191,99	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
9	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Богатыревка)	200	166,59	157,82	166,59	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
10	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР «Кемпинг»)	250	202,97	202,97	202,75	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
11	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 10)	250	211,67	210,61	210,61	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
12	Детсад (ясли) в с. Карабудахкент (Карабудахкентский район)	250	190,64	190,62	190,62	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
13	Детсад (ясли) в с. Баршамай (Кайтагский район)	120	112,36	112,36	112,36	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
14	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук (Каякентский район)	120	112,17	112,17	112,17	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
15	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	178,25	176,47	177,61	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
16	Детсад (ясли) в с. Нечаевка (Кизилюртовский район)	200	171,85	163,82	163,82	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
17	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Н.Хушет, МКР № 3)	250	205,26	200,4	200,4	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (ул. Шихова, 1206)	250	197,1	194,1	194,1	-	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
19	Детсад (ясли) в г. Кизилюрте (МКР «Новый»)	250	212,26	190,5	194,19	-	Направлено извещение об окончании работ

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	План ввода в эксплуатацию	% стрит. готовности
20	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «Ипподром»)	200	174,71	162,96	162,96		100
21	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Мичурино»)	200	173,98	161,19	161,19	15.10.2022	100
22	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (МКР «Молодежный»)	250	195,14	182,02	182,02	01.08.2022	100
23	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух (Буйнакский район)	120	102,61	51,50	86,54	15.07.2022	100
24	Детсад (ясли) в с. Ботаюрт (Хасавюртовский район)	120	102,63	101,69	114,49	01.08.2022	100
	Итого по завершённым объектам	4 700	3960,87	3818,65	3879,9		
25	Детсад (ясли) в с. Джанга (Карабудахкентский район)	120	117,3	83,62	82,62	25.10.2022	99,9
26	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Морская)	250	216,16	157,6	157,6	25.10.2022	99,6
27	Детсад (ясли) в с. Мюрего (Сергокалинский район)	120	113,25	94,69	100,39	25.10.2022	98,7
28	Детсад (ясли) в с. Эрпели (Буйнакский район)	120	112,18	91,52	96,96	25.10.2022	98,0
29	Детсад (ясли) в с. Каякент (Каякентский район)	250	193,82	173,25	173,25	25.10.2022	97,9
30	Детсад (ясли) в г. Дербенте	200	165,49	95,81	127,78	25.10.2022	91,0
31	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Российская)	250	212,98	170,97	170,97	01.08.2022	83,4
32	Детсад (ясли) в с. Тарумовка (Тарумовский район)	200	173,42	117,35	113,89	28.11.2022	89,7
33	Детсад (ясли) в с. Тагиркент (Левашинский район)	250	206,71	109,67	86,6	28.11.2022	60,5
34	Детсад (ясли) в с. Унцукуль (Унцукульский район)	120	101,87	42,07	68,51	28.11.2022	57,1
35	Детсад (ясли) в г. Дербенте	250	188,44	46,81	106,13	28.11.2022	45,4
36	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»)	120	97,63	18,23	48,82	28.11.2022	40,0
37	Детсад (ясли) в с. Куруш (Хасавюртовский район)	200	163,18	22,58	59,46	28.11.2022	37,0
	Итого по строящимся объектам	2450	2 062,43	1 224,17	1 392,98		
	Итого по ФГУП «ГУСС»	7 150	6 023,3	5 042,82	5 272,88		
38	Детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай (Буйнакский район)	60	99,82	0	0		0
39	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»), начало строительства – 2023 год	250	0	0	0		0
	Всего	7 460	6 123,12	5 042,82	5 272,88		

Продолжается строительство 13 объектов на 2 450 мест, в том числе:

– по 6 детсадам (яслям) на 1 060 мест уровень строительной готовности высокий – от 91 % до 99,9 %;

– по 2 детсадам (яслям) на 450 мест уровень строительной готовности высокий – от 83,0 % до 89,7 %;

– по 5 детсадам (яслям) на 940 мест, уровень строительной готовности оценивается как низкий – от 40 % до 65,5 %, (детсад (ясли) на 250 мест в с. Тагиркент, Левашинского района (60,5 %); на 120 мест в с. Унцукуль Унцукульского района (57,1 %); на 250 мест в г. Дербент (45,4 %); на 120 мест в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») (40 %), на 200 мест в с. Куруш, Хасавюртовского района (37 %), существует риск не завершения строительства.

Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по состоянию на 1 ноября 2022 года **из 58 объектов на 9 160 мест:**

– **завершено строительство 40 объектов** на 6 110 мест (16 детсадов на 1 410 мест и 24 детсадов-яслей на 4 700 мест);

– **продолжается строительство 17 объектов на 2 830 мест**, в том числе 4 детсада на 380 мест и 13 детсадов (ясли) на 2 450 мест

– **планируется начало строительства 1 объекта** на 60 мест в 2022 году (детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района).

По состоянию на 1 ноября 2022 года объем выполненных работ по строящимся 24 объектам дошкольного образования составляет 1 824,1 млн рублей (оперативное выполнение), или 69 % от объема заключенных контрактов на сумму 2 642 млн рублей², в том числе согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 – 1 563,7 млн рублей, или 59,2 % от объема заключенных контрактов.

Основными причинами низких темпов строительства и принятия выполненных работ являются:

– отсутствие соответствующей материально-технической базы у субподрядчиков;

– недостаточное количество рабочего и инженерно-технического персонала для выполнения строительных работ у субподрядных организаций;

– систематические срывы рабочего графика и низкая организация выполнения строительных работ;

– отсутствие качественного технологического контроля на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

– низкой исполнительской дисциплиной ФГУП «ГУСС» по

² Сумма контрактов по незавершенным объектам

представлению заказчику актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и отсутствием исполнительно-технической документации.

Из 58 объектов дошкольного образования по 32 объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в том числе по 31 объекту на 4 970 мест получена лицензия на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования.

В целом, в виду низкой строительной готовности (менее 70 %) наблюдаются риски не завершения до конца 2022 года строительно-монтажных работ по 6 дошкольным образовательным учреждениям на 1 060 мест (1 детсад на 120 мест и 5 детских-ясли на 940 мест) со средним и ниже среднего уровнем строительной готовности от 37,0 % до 65,5 %.

Кроме этого, имеются риски начала строительства детского сада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест.

В связи с этим, в адрес Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова (от 22 октября 2022 года № 25-25/70-22), направлен запрос с просьбой оказать содействие в решении вопроса о переносе на 2023 год сроков ввода в эксплуатацию по 6 объектам дошкольного образования и части бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

Кроме того, в связи длительными процедурами получения документов на ввод в эксплуатацию завершенных объектов, а также лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования также имеется риск недостижения планового значения по показателям «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» (план – 9,1 тыс. мест) и «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (план – 99,7 %). Так, по оценке выполнение указанных показателей составит по итогам 2022 года 4,6 тыс. мест и 92,2 % соответственно.

3) В 2022 году запланировано осуществить модернизацию ГКУ РД Центра занятости населения в МО «город Махачкала».

Определено помещение в административном здании Министерства труда и социального развития Республики Дагестан (г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117, 1 этаж, левое крыло) для размещения ГКУ РД ЦЗН в муниципальном образовании «г. Махачкала», который планируется модернизировать.

Заключен 1 контракт на ремонт помещения на сумму 7,3 млн рублей из 6 запланированных контрактов (договоров). Также определен победитель аукциона на закупку мебели, планируется заключение контракта на сумму 1,58 млн рублей. Проводится работа по запросу котировок и подготовке необходимой документации для последующего объявления остальных

аукционов по закупке оргтехники, формы, системы видеонаблюдения, а также на подключение к сети Internet.

4) В ходе реализации регионального проекта создано 30 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, что в 2 раза превышает плановое значение (15 групп).

5) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования, прошли курсы повышения квалификации 130 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций, или 8,7 % от плана (1 500 специалистов).

С учетом практики предыдущих лет, уровень рисков реализации национального проекта «Демография», будет определяться исходя из своевременности реализации мероприятий данного регионального проекта.

3) Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.

Ответственным исполнителем за реализацию регионального проекта является Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Заключен договор от 17 февраля 2022 года на закупку вакцины «Превенар 13» на сумму 28,9 тыс. рублей. Поставка вакцины обеспечена.

Иммунизацию против пневмококковой инфекции, прошли лица, старше трудоспособного возраста из групп риска проживающих в организациях социального обслуживания 94 человек, или 100 % от плана (приказ Минздрава РД от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»).

По состоянию на 1 ноября 2022 года помощь лицам старше трудоспособного возраста оказывают в 16 гериатрических кабинетах (2 кабинета открыты и лицензированы в 2022 году ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» и ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ»).

За январь-октябрь 2022 года на 100 гериатрических койках пролечено 1 639 человек, или 182,1 % от плана (900 человек). Уровень госпитализации составил 39,6 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

4) Региональный проект «Спорт – норма жизни».

В ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями до 57,8 %, а также доли населения, занимающегося

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 56 %, за счет проведения следующих мероприятий:

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Эндирей Хасавюртовского района и в городе Дербент – 367,5 млн рублей;
- закупка спортивной экипировки для 10 спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 14,5 млн рублей;
- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (7 малых спортивных площадок (ГТО) в муниципальных районах: Бабаюртовский район, Казбековский район, Карабудахкентский район, Левашинский район, Магарамкентский район, Тарумовский район, Цумадинский район, Чародинский район) – 20,2 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 402,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 376,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 26,2 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 322,3 млн рублей, или 80,2 % от годовых назначений (402,2 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 269,5 млн рублей, или 83,6 % от объема финансирования, или 67,0 % от годовых назначений.

Заключены 18 контрактов, или 100 % от плана на сумму 400,8 млн рублей.

– 1 контракт от 5 мая 2022 года № 103200008422000000 на сумму 15,4 млн рублей (экономия на сумму 77,5 тыс. рублей) на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Монтаж оборудования на 7 площадках завершен, контракт исполнен;

– 1 договор [№ 2056204588122000032](#) от 26.09.2022 года на сумму 4,7 млн рублей по закупке спортивно-технологического оборудования, договор исполнен;

– 1 контракт от 27 июня 2022 года [№ 0103200008422001689](#) на поставку спортивной экипировки на сумму 14,5 млн рублей. Контракт исполнен;

– 1 контракт от 22 апреля 2022 года № [2057103586522000002](#) на сумму 194,0 млн рублей на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Дербенте Республика Дагестан» (экономия составила 2,02 млн рублей). Срок исполнения контракта – 15 декабря 2022 года. Уровень готовности объекта – 65,3 %. Освоено 126,3 млн рублей, или 65,1 % от суммы контракта;

– 13 договоров в целях оборудования в ФОК в г. Дербенте на сумму 7,9 млн рублей, по которым освоено 3 371,2 млн рублей, или 64,4 %;

– 1 контракт от 18 апреля 2022 г. № 544-ОК/2022 на сумму 304,0 млн рублей (бюджет 2022 года – 164,3 млн рублей) на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с универсальным игровым залом в с. Эндирей Хасавюртовского района. Объект переходящий, срок исполнения контракта – 15 октября 2023 года. В 2022 году предусмотрено освоение 164,3 млн рублей (54 % от стоимости контракта). Авансирование составляет 105,3 млн рублей, или 34,7 % от цены контракта. Освоено 105,3 млн рублей, или 64,1 % от годовых назначений. Уровень готовности объекта – 31,1 %.

Следует отметить, что до настоящего времени (срок ввода – октябрь 2021 года) не введен в эксплуатацию строительный объект 2020 года – футбольное поле с беговыми дорожками в с. Ансалта Ботлихского района. В связи с низким качеством проектно-сметной документации и строительных работ на объекте, а также из-за природно-климатических условий, футбольное поле получило частичную просадку. В настоящее время проводятся работы по устранению недостатков.

2.3. По региональному проекту «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни за счет внедрения муниципальными образованиями программ общественного здоровья.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

В 2020-2021 гг. разработана и внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья. В 2022 году разработаны и внедрены 11 программ в 11 муниципальных образованиях (Акушинский район, Ахтынский район, Ботлихский район, Буйнакский район, Докузпаринский район, Казбековский район, Кизлярский район, Хасавюртовский район, город Махачкала, город Дербент, город Хасавюрт).

Кроме того, в 2022 году продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 118 медицинских организациях Республики Дагестан. Также модельные корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте внедряются в Минобрнауки РД, Дагестанстате и ООО «Газпром трансгаз Махачкала».



3. Национальный проект «Здравоохранение»



Куратор национального проекта:

Казиев М.Н.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Беляева Т. В.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан

3.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 8 региональных проектов, в том числе:

- 1) *«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;*
- 2) *«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;*
- 3) *«Борьба с онкологическими заболеваниями»;*
- 4) *«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;*
- 5) *«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;*
- 6) *«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационно-системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;*
- 7) *«Развитие экспорта медицинских услуг»;*
- 8) *«Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».*

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено финансирование в размере 4 877,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 762,2 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 348,5 млн рублей, внебюджетные источники – 1 776,6 млн рублей).

Профинансировано 2 423,2 млн рублей, или 49,6 % от годовых назначений (4 887,3 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 2 318,5 млн рублей, или 95,7 % от объема финансирования и 47,4 % от годовых назначений (4 877,3 млн рублей).

В рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано заключить 375 контрактов (договоров) по 6 региональным проектам.

По состоянию на 1 ноября 2022 года заключено 293 контракта (9 контрактов 2021 года – 386,6 млн рублей; 1 контракт 2020 года – 3,0 млн рублей), или 78 % планового объема на общую сумму 2 894,5 млн рублей.

Не заключены 82 контракта (договора), из которых 3 контракта предусмотрено заключить в ноябре 2022 года, 79 договоров в декабре по «Земскому доктору».

3.2. В рамках национального проекта бюджетные средства предусмотрены на реализацию следующих 7 региональных проектов:

1) Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году запланированы мероприятия по развитию санитарной авиации за счет обеспечения 187 вылетов в целях оказания экстренной медицинской помощи, а также оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (71,4 % от общего количества медицинских организаций).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 115,0 млн рублей, (средства федерального бюджета – 59,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 55,7 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы и освоены расходы в сумме 115,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (по данным ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» фактически освоены средства в размере 108,7 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта с ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» заключен контракт от 21 октября 2021 года на сумму 115,0 млн рублей на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

По состоянию на 1 ноября 2022 года выполнено 147 вылетов вертолетом санавиации, или 78,6 % от планового количества (187 вылетов). Эвакуировано в медицинские организации 175 человек, из них детей – 32.

2) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», а также уменьшить смертность от болезней системы кровообращения, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

– оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница», ГБУ РД «Городская клиническая больница» – 344,3 млн рублей;

– профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 59,7 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 404,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 403,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы и освоены расходы в размере 164,7 млн рублей, или 40,8 % от годовых назначений (404,0 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключено 38 контрактов, или 100 % от плана на сумму 404,0 млн рублей (25 контрактов по 54 единицам оборудования на общую сумму 344,2 млн рублей и 13 контрактов по кардиопрепаратам на общую сумму 59,7 млн рублей).

Введено в эксплуатацию 11 единиц медицинского оборудования в следующие медицинские организации: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» – 4 единицы, ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» – 2 единицы, ГБУ РД «Городская клиническая больница» – 1 единица, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» – 4 единицы.

3) Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2022 году предусмотрено обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 67,7 случаев на 100 тыс. населения, за счет проведения следующих мероприятий:

– открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» – 52,9 млн рублей (средства республиканского бюджета);

– строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя – 157,6 млн рублей (средства республиканского бюджета);

– переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала – 292,2 млн рублей (средства федерального бюджета);

– оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения – 1 458,8 млн рублей (средства ТФОМС).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 964,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 292,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 213,7 млн рублей, средства ТФОМС – 1 458,8 млн рублей).

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета, законтрактованы), образованные вследствие

несвоевременного выполнения обязательств по контрактам.

По состоянию на 1 ноября 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 874,1 млн рублей, или 44,5 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 873,2 млн рублей, или 99,9 % от объема финансирования и 44,5 % от годовых назначений (1 964,8 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключен 31 контракт, или 91,2 % от плана (34 контрактов) на сумму 416,1 млн рублей, в том числе:

- 1 контракт 2020 года на сумму – 3,0 млн рублей;
- 2 контракта по строительству помещений для размещения линейных ускорителей – 142,2 млн рублей;
- 13 контрактов на развитие ЦАОП на сумму – 52,9 млн рублей;
- 15 контрактов по 23 единицам оборудования – 217,9 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 года в ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию 12 единиц медицинского оборудования.

Не заключены 3 контракта по закупке следующего оборудования:

- автоматизированный иммуноферментный анализатор с дополнительным оборудованием и компьютером обеспечения учета результатов анализов – 3 млн рублей (передан в Комитет по закупкам Республики Дагестан);
- гематологический анализатор (на стадии заключения контракта);
- сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений – 5,9 млн рублей (на стадии заключения контракта).

4) Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

В ходе реализации регионального проекта запланированы мероприятия по улучшению материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям и женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, снижение смертности детей, увеличение охвата детей профилактическими осмотрами.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 84,0 млн рублей за счет средств Федерального фонда социального страхования (родовые сертификаты).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы и освоены расходы в сумме 62,6 млн рублей, или 74,5 % от годовых назначений (84,0 млн рублей).

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

По состоянию на 1 ноября 2022 года оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов – 155,0 тыс. человек, или 83,0 % от плана (план – 166,3 тыс. человек).

5) Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем укомплектования врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, а также увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования за счет проведения следующих мероприятий:

– единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам по программе «Земский доктор (фельдшер)» – 187,5 млн рублей;

– повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников (обучение среднего медицинского персонала) – 30,8 млн рублей.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 218,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 178,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 40,2 млн рублей).

Финансирование регионального проекта предусмотрено в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» (вне регионального проекта).

Утверждено постановление Правительства Республики Дагестан от 6 апреля 2022 года № 72 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, прибывшим (переехавшим) в 2022 году на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек».

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы и освоены расходы в сумме 113,5 млн рублей, или 52,0 % от годовых назначений (218,3 млн рублей).

В 2022 году предусмотрено заключить 185 договоров, в том числе: по программе «Земский доктор» – 171 договор, по программе «Земский фельдшер» – 13 договоров.

Заключено 106 договоров на общую сумму 134,8 млн рублей, в том числе:

– по «Земскому доктору» – 105 договоров на 104,0 млн рублей;

– по «Развитию кадрового обеспечения» – 1 соглашение на сумму 30,8 млн рублей.

За 10 месяцев 2022 года повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников (обучение среднего медицинского персонала) прошли 3 050 средних медицинских работников.

б) Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году продолжается реализация мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности, а также оказанию электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан.

На реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 535,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 298,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,0 млн рублей, средства медицинских организаций – 233,8 млн рублей).

Средства медицинских организаций в сумме 233,8 млн рублей предусмотрены на финансирование услуг по комплексному техническому сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД».

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы расходы в сумме 104,2 млн рублей, или 19,5 % от годовых назначений (535,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 99,3 млн рублей, или 95,3 % от объема финансирования, и 18,6 % от годовых назначений.

Заключены 6 контрактов, или 100 % от плана на сумму 301,0 млн рублей (из них 1 контракт в 2021 году на сумму 124,6 млн рублей и 5 контрактов в 2022 году на сумму 176,4 млн рублей).

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 124,6 млн рублей (за счет федерального бюджета, законтрактованы), образовавшиеся в связи с необеспечением своевременного выполнения по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» в рамках государственного контракта № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, заключенного между ООО «Национальный центр информатизации» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан. На 1 ноября 2022 года по данному контракту исполнены обязательства на сумму 97,0 млн рублей, или 77,8 % от суммы остатка за 2021 год.

В ЕИС «Закупки» от 17.10.2022 г. размещена информация об изменении условий контракта по согласованию сторон в части поставки товара, выполнения работ или оказания услуги при улучшении их по качеству, техническим и функциональным характеристикам по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7) Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- замена 91 автомобильного транспорта (Лада НИВА – 30 единиц, Лада Гранта – 51 единица, УАЗ – 10 единиц) – 94,5 млн рублей;
- оснащение и переоснащение медицинским оборудованием (379 единиц) – 203,6 млн рублей;
- капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) – 157,2 млн рублей;
- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (8 объектов) – 709,6 млн рублей;
- реконструкция 5 объектов здравоохранения – 50,5 млн рублей.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 565,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 530,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 35,3 млн рублей). В том числе возвращены неосвоенные средства 2021 года в сумме 358,0 млн рублей (2 контракта по строительству 41 ФАП – 355,6 млн рублей, 2 контракта на приобретение оборудования на сумму 2,35 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 1 101,7 млн рублей или 70,4 % от годовых назначений (1 656,9 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 884,6 млн рублей, или 80,3 % от объема финансирования и 56,5 % от годовых назначений (1 565,9 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта заключены 111 контрактов на общую сумму 1 523,5 млн рублей (из них 9 контрактов 2021 года на сумму 331,6 млн рублей, 102 контрактов 2022 года на сумму 1 191,9 млн рублей), в том числе:

1) По приобретению автотранспорта для медицинских организаций в количестве 91 единицы («Лада Нива», «Лада Гранта», «УАЗ-10») заключен 1 контракт на сумму 87,0 млн рублей. Поставлены и введены в эксплуатацию

84 единицы автотранспорта, 7 единицы планируется поставить до 27 ноября 2022 года.

2) По оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 30 контрактов на сумму 205,24 млн рублей (из них 2 контракта 2021 года на 2,35 млн рублей и 28 контрактов 2022 года на поставку 379 единиц оборудования на 202,9 млн рублей).

Поставлено и введено в эксплуатацию более 374 единиц медицинского оборудования.

3) По капитальному ремонту 60 зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на общую сумму 153,2 млн рублей. Экономия по результатам торгов составила 3,8 млн рублей.

Уровень готовности 60 объектов представлен следующим образом:

- по 30 объектам – работы завершены;
- по 22 объектам – от 50 до 99 %;
- по 8 объектам – от 5 до 45 %.

По 5 объектам капитального ремонта с уровнем готовности от 15 % до 30 %: здания ГБУ РД «Поликлиника № 9» г. Махачкала (30 %), ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» (20 %), и фельдшерско-акушерский пункт ГБУ РД «Рутульская ЦРБ» с. Куфа (25 %), ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ» с. Эндирей (5 %), ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», Цумадинский район, с. Нижние Хваршини (10 %) имеются риски своевременного завершения работ.

Из 19 контрактов 2022 года со сроком исполнения на 30 августа 2022 года, завершены работы только по 3 по контрактам: ФАП в ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ», ФАП в ГБУ РД «Курахская ЦРБ» в с. Укуз, ФАП в ГБУ РД «Курахская ЦРБ» в с. Квардал.

Также не завершены работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов по контрактам 2021 года, перенесенным на 2022 год. Контракты на строительство 18 ФАП заключены в сентябре – ноябре 2022 года со сроком исполнения 31 декабря 2022 года.

4) По реконструкции (ее завершению) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 5 контрактов на общую сумму 50,2 млн рублей.

По 4 объектам быстровозводимых модульных конструкций работы завершены, уровень готовности составляет 100 % (врачебная амбулатория ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с. Верхний Дженгутай; врачебная амбулатория ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», с. Калининаул; врачебная амбулатория ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», с. Харбук; ГБУ РД «Поликлиника №7» г. Махачкала).

По строительству (реконструкции) здания участковой больницы ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ» в с. Чиркей, готовность составляет 28 % (проводятся кровельные работы), что свидетельствует о возможных рисках своевременного завершения.

5) По строительству и монтажу быстровозводимых модульных конструкций заключено 15 контрактов на общую сумму 1 021,1 млн рублей (из них 6 контрактов 2021 года на сумму 259,6 млн рублей и 8 контрактов 2022 года на общую сумму 691,9 млн рублей).

Выполнение работ по монтажу быстровозводимых модульных конструкций по 1 врачебной амбулатории и 27 фельдшерско-акушерских пунктам (ФАП) составило 100 %. Из оставшихся 24 (ФАП) уровень готовности составляет на:

- 6 объектах от 50 % до 95 %;
- 18 объектах от 5 % до 49 %.

По 2 поликлиникам в г. Махачкале (ГБУ РД «Детская поликлиника № 3» и «Поликлиника № 8»), которые являются переходящими с 2021 года, уровень готовности составляет 35 % (лимит 2022 года 632,6 млн рублей, срок завершения – декабрь 2022 года).

С учетом объемов финансирования, количества контрактов, а также специфики проводимых мероприятий, риски реализации национального проекта «Здравоохранения» будут определяться исходя из результатов реализации данного регионального проекта. В виду низких темпов строительных работ, по отдельным объектам, существуют значительные риски завершения мероприятий регионального проекта в плановые сроки и освоения бюджетных ассигнований.

3.4. В ходе реализации *регионального проекта «Экспорт медицинских услуг»* предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (в 2022 году – до 630 тыс. долларов США).

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги. Заключение контрактов не предусмотрено.

Поступление финансовых средств за 9 месяцев 2022 года за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 49,4 млн рублей.



4. Национальный проект «Образование»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.

Министр образования
и науки Республики
Дагестан



Сулейманов А.А.

Министр строительства,
архитектуры и ЖКХ
Республики Дагестан



Саидов К. Р.

Министр по делам
молодежи Республики
Дагестан



Ахмедов А.Ж.

Врио министра
экономики и
территориального
развития Республики
Дагестан

4.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» реализуются 7 региональных проектов.

- 1) «Современная школа»;
- 2) «Успех каждого ребенка»;
- 3) «Цифровая образовательная среда»;
- 4) «Молодые профессионалы»;
- 5) «Социальная активность»;
- 6) «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;
- 7) «Молодежь России».

В 2022 году на реализацию национального проекта «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 588,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 11 336,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 252,3 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года на реализацию национального проекта профинансировано 6 121,6 млн рублей, или 48,6 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 3 213,4 млн рублей, или 52,5 % от объема финансирования и 25,5 % от годовых назначений (12 588,6 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта заключены 328 контрактов на общую сумму 12 532,5 млн рублей, или 100 % от планового объема.

По мероприятиям, реализуемым Министерством образования и науки Республики Дагестан, объем предусмотренных средств составляет 1 060,6 млн рублей. Освоено 1 044,8 млн рублей, или 98,5 % от годовых назначений. Заключено 256 контрактов, или 100 % от планового количества.

По мероприятиям, реализуемым Министерством строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан объем предусмотренных средств составляет 10 347,0 млн рублей, освоено 2 034,0 млн рублей, или 19,7 % от годовых назначений. Заключено 48 контрактов на сумму 9 626,0 млн рублей.

По мероприятиям Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан объем предусмотренных средств на 2022 год составляет в сумме 1 171,6 млн рублей, освоено 592,3 млн рублей, или 50,6 % от объема годовых назначений. Заключено 2 контракта на сумму 1 848,18 млн рублей на строительство двух школ в г. Дербент (школа на 804 места – 772,68 млн рублей (лимит 2022 года – 613,1 млн рублей), школа на 1224 мест – 1 075,5 млн рублей (лимит 2022 года – 290,4 млн рублей)).

По мероприятиям, реализуемым Министерством молодежи Республики Дагестан, объем предусмотренных средств составляет 8,98 млн рублей. Освоено 7,8 млн рублей или 87,4 % от объема годовых. Заключены 22 контракта, или 100 % от планового количества.

4.2. В 2022 году из 7 региональных проектов национального проекта «Образование» финансирование предусмотрено по 6 региональным проектам:

1) Региональный проект «Современная школа».

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году запланировано проведение мероприятий в целях обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство образования Республики Дагестан – 348,8 млн рублей, Министерством строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (10 347,4 млн рублей), а также МО Администрация Городской округ «город Дербент» (1 171,6 млн рублей, ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 11 867,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 10 622,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 245,1 млн рублей).

На 1 ноября 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 5 400,8 млн рублей, или 45,5 % годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 2 507,3 млн рублей, или 46,4 % от объема финансирования и 21,1 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключены 169 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 11 811,7 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 года в ходе реализации мероприятий регионального проекта проведена следующая работа.

1. Строительство общеобразовательных организаций.

В Республике Дагестан общее количество общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» по строительству объектов общего образования составляет **56 школ на 25 582 ученических мест³**.

В 2022 году запланировано строительство (начало строительства) **45 школ на 21 612 ученических мест, в том числе:**

– с вводом в эксплуатацию в 2022 году 25 школ на 13 728 ученических мест (в том числе: ФГУП «ГУСС» – 12 школ на 7 104 уч. мест, местные подрядчики – 13 школ на 6 624 уч. мест);

– началом строительства 20 объектов на 7 884 ученических места в 2023 году.

На реализацию мероприятий по строительству объектов общего образования в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2022 год запланировано финансирование 50 школ на 23 534 ученических места на сумму 11 519,0 млн рублей.

³ информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

На 1 ноября 2022 года на строительство объектов образования в рамках регионального проекта «Современная школа» профинансировано 5 052,0 млн рублей, или 44,0 % от годовых назначений (11 519,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 2 160,3 млн рублей, или 18,8 % от годовых назначений (11 519,0 млн рублей).

В рамках реализации мероприятия создание ученических мест в общеобразовательных организациях заключено 50 контрактов на сумму 11 463,33 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 года из запланированного строительства 56 объектов общего образования на 25 582 ученических мест в рамках реализации регионального проекта (нарастающим итогом с 2019 года):

1) Завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест (функционируют 7 школ на 2 064 ученических мест, по 3 школам на 1 302 ученических места получено разрешение на ввод в эксплуатацию, по 1 школе на 502 ученических места получено заключение о соответствии объекта, в том числе:

– **6 школ на 1 744 уч. места введены в 2020 году** (получена лицензия на образовательную деятельность в школах в с. Акбулатюрт на 120 уч.мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч. мест, в с. Кандаураул на 300 уч. мест, в с. Эндирей, блок-пристройка к МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» на 300 уч. мест, МКОУ «Теречная СОШ» на 300 уч. мест в с. Теречное Хасавюртовского района, блок – пристройка к МБОУ «СОШ № 26» на 604 уч. места в г. Махачкала);

– **4 школы на 1 606 уч. места введены в 2021 году** (получена лицензия на образовательную деятельность в школах в с. Луткун Ахтынского района на 400 уч. мест, в с. Новокостек на 400 уч. мест, в с. Эндирей Хасавюртовского района на 502 уч. места, в школе в с. Оружба Магарамкентского района на 304 уч. мест).

– **1 школа на 502 уч. места построена в 2022 году** («СОШ № 41» в пос. Загородный, г. Махачкалы) (ФГУП «ГУСС»), получено заключение о соответствии объекта (срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2022 года);

2) Продолжается строительство 12 школ на 7 406 ученических мест с завершением в 2022 году (подрядчик ФГУП «ГУСС» – 11 школ на 6 602 уч. места, городской округ «город Дербент» – 1 школа на 804 уч. места).

2.1. ФГУП «Главное управление специального строительства»

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГУСС» в 2020 – 2021 гг. были заключены 16 контрактов на сумму 7 884,9 млн рублей (в том числе: по завершенным объектам – 1 936,4 млн рублей и по незавершенным объектам – 5 948,5 млн рублей).

На 1 ноября 2022 года оперативный объем выполненных работ по строительству 16 объектов общего образования, генподрядчиком по которым является ФГУП «ГУСС» составил 5 701,1 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ по 16 объектам, согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составил 4 800,3 млн рублей.

За 10 месяцев 2022 года объем выполненных работ согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 произведен в сумме 1 449,87 млн рублей, в том числе за октябрь 2022 года в сумме 262,06 млн рублей.

Из 5 завершенных объектов ФГУП «ГУСС» 4 школы начали функционировать (получена лицензия на осуществление образовательной деятельности). По 1 школе в 2022 году получено заключение о соответствии строительного объекта (школа на 502 уч. места в МКР «Загородный» г. Махачкалы), плановая дата получения разрешения на ввод перенесена на 28 декабря 2022 года

По 11 незавершенным школам (срок ввода в эксплуатацию – 14.12.2022 г), уровень строительной готовности составил от 26,6 % до 99,4 %, в том числе:

- по 2 школам на 1 344 ученических мест – от 92,6 % до 99,4 %;
- по 8 школам на 5 178 ученических мест – от 45,7 % до 84,0 %;
- по 1 школе на 80 ученических мест – 26,6 %.

По 3 объектам на 1 846 уч. мест плановая дата получения разрешения на ввод перенесена на 28 декабря 2022 года (школа на 502 уч. места в МКР «Загородный» г. Махачкалы, школа на 120 уч. мест в с. Квананда, Цумадинского района, школа на 1224 уч. места в п. Семендер г. Махачкалы).

По 8 объектам образования на 5 178 уч. мест в связи с низкой строительной готовностью (от 45,7 % до 84,0 %) наблюдаются риски завершения строительных работ до конца 2022 года. В этой связи в адрес Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова, Правительством Республики Дагестан было направлено письмо от 2 ноября 2022 года № 01-25-25/86-1192/22 с предложением по внесению изменений в Соглашение от 24 декабря 2021 года № 073-09-2022-870 в части перераспределения бюджетных средств по 8 школам, генеральным подрядчиком, которых определено ФГУП «ГУСС» *(выделены курсивом в таблице)*.

По 1 объекту на 80 ученических мест (школа в с. Хебатли, Цунтинский район) уровень строительной готовности составляет 26,6 % по причине труднодоступности объекта, а также в виду необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию. Корректировка проектно-сметной документации завершена. Планируется повторная подача документов на экспертизу.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов образования, запланированных построить в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (генподрядчик - ФГУП «ГУСС»)

млн рублей

	Объекты образования	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение млн рублей	% строит. готовности
1	МКОУ «Эндирейская СОШ №2» (блок-пристройка), в с.Эндирей Хасавюртовского района	300	281,45	281,44	281,45	Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности
2	Школа в с.Новокостек, Хасавюртовского района	400	441,72	441,72	441,72	Получена лицензия
3	Школа в с. Эндирей №1 Хасавюртовского района	502	430,34	430,34	430,34	Получена лицензия
4	Школа с. Луткун Ахтынского района	400	396,89	396,86	396,86	Получена лицензия
5	СОШ № 41 в п. Загородный, г.Махачкала	502	385,99	376,6	376,6	Получено заключение о соответствии
	Итого по завершенным объектам	2 104	1 936,39	1 926,93	1 926,93	
6	Школа в с.Кванада Цумадинского района	120	169,24	105,09	110,4	99,4
7	СОШ №58 в пос. Семендер г. Махачкалы	1224	1 068,16	533,13	656,64	92,6
8	<i>Школа в с.Хамавюрт Хасавюртовского района</i>	502	346,63	251,47	247,22	84,0
9	<i>МБОУ "СОШ №27" (блок-пристройка) в г. Махачкала</i>	604	529,5	359,11	416,53	81,7
10	<i>Школа в с. Гигатли Цумадинского района</i>	120	203,37	105,72	121,04	80,9
11	<i>Школа в с.Авадан Докузпаринского района</i>	400	419,24	212,02	230,72	73,1
12	<i>Школа г. Каспийск</i>	1224	984,75	441,18	664,27	67,0
13	<i>Школа в с. Солнечное Хасавюртовского района</i>	804	758,92	422,57	539,48	56,6
14	<i>СОШ №2 г. Каспийск</i>	300	262,72	76,43	131,36	55,4
15	<i>Школа в МКР «Ипподром» г. Махачкала</i>	1224	1 080,67	340,23	595,05	45,7
16	Школа в с. Хебатли Цунтинского района	80	125,56	26,43	61,46	26,6
	Итого по незавершенным объектам	6 602	5 948,53	2 873,38	3 774,17	
	Итого	8 706	7884,92	4 800,31	5 701,1	

В целях предотвращения рисков завершения строительства в 2022 году, Правительством Республики Дагестан направлено обращение от 25.10.2022 № 25-25/1-77-22 в адрес Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова по вопросу замены объекта «МКОУ «Хебатлинская СОШ», Цунтинский район, с. Хебатли на 80 мест».

2.2. По школе на 804 места в городе Дербент (переходящий объект 2021 года), в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, строительство которой осуществляет МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) срок ввода запланирован в 2022 году. Стоимость контракта 772,68 млн рублей. На 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 613,1 млн рублей. Профинансировано с начала строительства 668,6 млн рублей, в том числе в 2022 году – 592,4 млн рублей.

Объем выполненных строительных работ составил 141,25 млн рублей, в том числе в 2022 году – 65,0 млн рублей. Кассовое исполнение 668,5 млн рублей, в том числе в 2022 году – 592,4 млн рублей. Уровень строительной готовности составляет 51,0 %. Несмотря на хорошие темпы строительства также прорабатывается вопрос переноса срока ввода в эксплуатацию на 2023 год.

3) Предусмотрено начало строительства 32 школ на 13 704 ученических места с завершением в 2022 году 13 школ на 6 624 ученических мест и началом строительства 19 школ на 7 080 ученических мест (с завершением в 2023 году).

Всего из 32 новых объектов, предусмотренных к началу строительства в 2022 году по состоянию на 1 ноября 2022 года заключены 32 контракта на общую сумму 12 121,53 млн рублей.

На начало строительства 32 школ на 13 704 ученических места бюджетные назначения в сумме 6 674,9 млн рублей распределены следующим образом:

Строительство 32 школ на 13 704 ученических места, из которых 19 школ на 7 280 ученических мест строятся в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 года № 206-р (3 государственных заказчика и 10 подрядчиков⁴).

⁴ Перечень организаций, определенных единственными подрядчиками по проектированию и строительству объектов капитального строительства, предусмотренных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан».

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов образования, запланированных к постройке в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2022 года (местные подрядные организации)

млн рублей

№	Общеобразовательные учреждения (школы)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Предусмотрено 2022 год	Год завершения	Дата получения госэкспертизы	Примечание (готовность)
1	Школа в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района	392	461,27	487,27	2022		Переносится на 2023 год, ПСД. (10 %)
2	Школа в с. Параул Карабудахкентского района (строительство)	400	366,36	366,55	2022		Переносится на 2023 год (8 %)
3	Школа № 7 в г. Кизилюрт, реконструкция	250	246,79	253,26	2022		Переносится на 2023 год, ПСД (7 %)
4	Школа № 1 в г. Кизилюрт (реконструкция)	150	147,11	155,09	2022		Переносится на 2023 год, ПСД (2 %)
5	Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского района (строительство)	700	543,91	544,51	2022		Переносится на 2023 год (1 %)
6	Школа № 39 в г. Махачкале (реконструкция)	500	417,0	434,45	2022		Переносится на 2023 год, ПСД
7	Школа № 14 в г. Хасавюрт (реконструкция)	1150	817,5	826,62	2022		Переносится на 2023 год
8	Школа в с. Новосаситли Хасавюртовского района (взамен школы № 11 в г. Избербаш (строительство)	420	477,95	268,46	2022		Переносится на 2023 год
9	Школа № 22 в г. Махачкале (реконструкция)	250	241,9	465,05	2022	10.11.2022	Переносится на 2023 год
	Итого по мероприятию ликвидация 3 смены обучения, 9 объектов	4 212	3 719,79	3 801,26			
10	Школа в п. Шамхал г. Махачкалы (созданию новых мест, 1 объект)	604	425,5	439,06	2022	01.12.2022	Переносится на 2023 год
11	Школа в с. Красный восход Кизлярского района	400	328,0	354,16	2022		Переносится на 2023 год
12	Школа в с. Старый Сивух Хасавюртовского района	604	514,28	533,62	2022	10.11.2022	Переносится на 2023 год
13	Школа в с. Кироваул Кизилюртовского района (завершение в 2023 году)	604	525,91	146,78	2023		
14	Школа в г. Кизляр	800	696,65	196,25	2023	10.11.2022	
	Итого по мероприятию «Создание дополнительных мест в связи с демографическим фактором» 4 объекта	3	2 064,84	1 230,81			
	Итого ГКУ РД «ДЕГЗЗ», 14 объектов	7 224	6 210,13	5 471,13			
15	Школа в с. Ашали Ботлихского района	50	50,93	12,24	2023	10.12.2022	

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Общеобразовательные учреждения (школы)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Предусмотрено 2022 год	Год завершения	Дата получения госэкспертизы	Примечание (готовность)
16	Школа в пос. Ленинкент г. Махачкалы	604	548,64	146,11	2023	10.12.2022	
17	Школа в пос. Новый Хушет г. Махачкалы	604	548,36	146,11	2023	10.12.2022	
18	Школа в МКР «Ветеран» г. Махачкалы	604	548,21	146,11	2023	10.12.2022	
19	Школа в с. Аданак Карабудахкентского района	220	206,06	53,62	2023	10.12.2022	
20	Школа в с. Параул Карабудахкентского района	200	186,11	48,78	2023	20.11.2022	
21	Школа в с. Какамахи Карабудахкентского района	220	205,94	53,62	2023	10.12.2022	
22	Школа в с. Зеленоморск Карабудахкентского района	120	115,3	29,36	2023	20.11.2022	
23	Школа в с. Пятилетка Хасавюртовского района	300	277,06	72,91	2023	20.11.2022	
24	Школа в с. Шагада Хасавюртовского района	200	186,22	48,78	2023	20.11.2022	
25	Школа в с. Советское Хасавюртовского района	200	186,25	48,78	2023	20.11.2022	
26	Школа в с. Байрамаул Хасавюртовского района	604	548,51	146,11	2023	10.12.2022	
27	Школа в с. Борагангечув Хасавюртовского района	300	277,16	72,91	2023	20.11.2022	
28	Школа в с. Сулейбакент Левашинского района	300	277,05	72,91	2023	31.10.2022	
29	Школа в с. Хахита Левашинского района	200	186,26	48,78	2023	20.11.2022	
30	Школа в с. Глох Ботлихского района	450	409,44	108,94	2023	10.12.2022	
31	Школа в с. Зило Ботлихского района	80	78,4	19,58	2023	10.12.2022	
	Итого по ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» - 17 объектов	5 256	4 835,91	1 275,65			
32	Школа в г. Дербенте (администрация)	1224	1 075,49	290,44	2023		
	Итого по мероприятию «Создание новых мест в связи с демографическим фактором», 18 объектов	6 480	7 976,24	2 796,9			
	Всего	13 704	12 121,53	7 037,22			

3.1. По 14 школам на 7 224 ученических места (лимиты на 2022 год – 4 918,85 млн рублей), начало строительства которых запланировано в 2022 году, заказчиком выступает ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», подрядчики – местные организации.

В целях осуществления строительства 14 школ в октябре-декабре 2021 года заключены 14 контрактов 6 210,13 млн рублей. Контракт по каждой школе предусматривает выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, а также выполнение работ по строительству объекта и поставке оборудования. Разработан график разработки проектно-сметной документации.

По 6 объектам получено положительное заключение госэкспертизы, на которых начаты строительно-монтажные работы, установлено онлайн видеонаблюдение по 5 объектам.

На 1 ноября 2022 года произведено финансирование на сумму 2 139,0 млн рублей при кассовом исполнении на сумму 502,8 млн рублей с объемом выполненных работ на сумму 53,9 млн рублей.

По отдельным общеобразовательным организациям существуют риски неисполнения бюджетных обязательств по вводу в эксплуатацию в текущем году в связи с затянувшимися сроками разработки и утверждения проектно-сметной документации и инженерных изысканий, а также получения положительного заключения государственной экспертизы. Так, проектная документация находится на рассмотрении госэкспертизы по следующим объектам:

- школа на 250 уч. мест к зданию СОШ № 22 г. Махачкалы (10.11.2022 г.);
- школа на 604 уч. мест в с. Сивух Хасавюртовского района (10.11.2022 г.);
- школа на 604 уч. места в п. Шамхал г. Махачкалы (до 01.12.2022 г).

По объекту «Школа на 1150 уч. мест в г. Хасавюрте» договор на прохождение госэкспертизы заключен 26 октября 2022 года, проектная документация по находится на стадии прохождения госэкспертизы.

Необходимо отметить, что существует риск необеспечения ввода в эксплуатацию до конца 2023 года школы мощностью на 1150 уч. мест в г.Хасавюрте, проектная документация по которой находится на стадии прохождения госэкспертизы.

В целях недопущения неполного освоения средств федерального бюджета и недостижения показателей (индикаторов), установленных Соглашением, предлагается замена двух объектов общей мощностью 1300 уч. мест («Строительство школы № 14 в г. Хасавюрт на 1 150 уч. мест» и «Строительство пристройки на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт») на 3 объекта общей мощностью 1 424 уч. мест, строительство которых ведется в рамках Республиканской инвестиционной программы:

1. Школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского район. Объем средств на 2022 год – 131,6 млн рублей, освоено – 37,8 млн рублей, строительная готовность – 15%;

2. Школа на 320 уч. мест в с. Охли Левашинского района, объем средств, предусмотренный на 2022 г. – 49,2 млн рублей, освоено – 34,6 млн рублей, строительная готовность – 45%;

3. Школа на 604 уч. мест в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1. Объем предусмотренных средств – 272,1 млн рублей, освоено – 134,8 млн рублей. Строительная готовность – 90 %, ввод запланирован в текущем году. В настоящее время ожидается поставка оборудования и подключение к сетям водоснабжения и электроснабжения.

Строительство школы № 14 в г. Хасавюрт на 1 150 уч. мест и Строительство пристройки на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт предлагается продолжить в рамках республиканской инвестиционной программы в последующие годы.

Указанные предложения Правительством Республики Дагестан письмом от 27.09.2022 г. №01-25-25/41-922/22 направлены в Министерство просвещения Российской Федерации.

По школе на 604 ученических места в с. Сивух Хасавюртовского района, следует отметить, что в непосредственной близости с границами выделенного земельного участка под строительство располагается высоковольтная линия электропередачи, тем самым возникает вероятность нарушений санитарных норм.

Объект «Школа на 400 уч. мест к зданию школы в с. Красный Восход Кизлярского района» проходит проверку на предмет укомплектованности.

На стадии инженерных изысканий проектной организацией было выявлено, что на земельном участке, выделенном под строительство школы на 420 ученических мест в г. Избербаше находится законсервированная нефтяная скважина. В результате, по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации строительство объекта общего образования на 420 ученических мест было перенесено в другой муниципалитет (с. Новосаситли Хасавюртовского района). По объекту «Школа на 420 уч. мест с. Новосаситли Хасавюртовского района» имеется утвержденное задание на проектирование, а также определен земельный участок под строительство школы.

По указанным общеобразовательным организациям существуют риски неисполнения бюджетных обязательств по вводу в эксплуатацию в текущем году в связи с затянувшимися сроками разработки и утверждения проектно-сметной документации и инженерных изысканий, а также получения положительного заключения государственной экспертизы. В данном случае, планируется рассмотреть вопрос заключения контракта «под ключ» с единственным поставщиком.

По факту получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по 12 объектам образования планируется увеличение размера авансовых платежей с применением казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, что позволит довести до подрядных организаций лимиты бюджетных обязательств 2022 года в полном объеме с соответствующим кассовым исполнением. Однако фактически объем работ останется невыполненным.

По объекту «Школа на 604 уч. места в с. Кироваул Кизилюртовского района» работы по разработке котлована и устройству фундамента завершены. Начаты работы по устройству монолитных железобетонных стен цокольного этажа.

По объекту «Школа на 804 ученических места в г. Кизляре». Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 г. № 206-р определен единственный исполнитель работ по строительству объекта – ООО «СК «Моно-строй». ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» заключен контракт с ООО СК «Моно-строй» от 8 июля 2022 года на сумму 696,6 млн рублей, в том числе с предусмотренным освоением средств в 2022 году на сумму 190,1 млн рублей и в 2023 году на сумму 506,5 млн рублей (срок исполнения контракта – 20 августа 2023 г).

3.2. ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» – 17 объектов на 5 256 ученических мест.

В соответствии с Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год на начало строительства 17 школ на 5 256 ученических мест предусмотрены средства в сумме 1 275,65 млн рублей.

На 1 ноября 2022 года ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» заключено 17 контрактов на сумму 4 836,04 млн рублей (в том числе на 2022 год – 1 275,65 млн рублей, на 2023 год – 3 560,4 млн рублей);

Согласно заключенным контрактам, начало строительства было предусмотрено на июнь 2022 года. Однако, по данным объектам проектно-сметная документация находится еще на стадии разработки.

Исходные данные для разработки проектной документации муниципальными образованиями до настоящего времени не представлены в полном объеме. Направление проектно-сметной документации на экспертизу планируется в ноябре – декабре 2022 года, в том числе:

- по 1 объекту (школа на 300 ученических мест в Левашинском районе, с. Сулейбакент) планируемая дата входа в государственную экспертизу – 31.10.2022 г.;

- по 7 объектам – до 20.11.2022 г.;

- по 9 объектам предполагаемая дата входа в государственную экспертизу – с 05.12.2022 г. по 10.12.2022 г.

По состоянию на 1 ноября 2022 года финансирование на данные объекты произведено в сумме 89,25 млн рублей без кассового исполнения.

Следует отметить, что под строительство школы на 450 ученических мест в с. Тлох Ботлихского района выделен земельный участок, через который проложена высоковольтная линия электропередачи. По предварительным подсчетам специалистов, затраты на перенос линии ориентировочно составят 35,0 млн рублей. Данные затраты не предусмотрены государственным контрактом. Перенос указанной линии влияет на сроки начала и завершения строительства объекта.

Также, для строительства школы на 80 ученических мест в с. Зило Ботлихского района администрацией района выделен земельный участок, границы которого не соответствуют установленным нормативам. В настоящее время проводятся работы по формированию нового земельного участка под строительство общеобразовательной организации.

По 17 объектам, начало строительства которых предусмотрено местными подрядными организациями (заказчик ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности») с объемом запланированных средств в сумме 1 275,65 млн рублей, объем неосвоенных средств (не выполненных работ) может составить порядка 1 250,0 млн рублей.

При этом, в случае завершения разработки проектно-сметной документации, согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года № 137, возможно авансирование строительства в пределах 50 % от объема заключенных контрактов с соответствующим кассовым исполнением в сумме 650,0 млн рублей без выполненных работ.

3.3. Администрация МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) – 1 школа на 1 224 места в г. Дербент.

Администрацией МО ГО «город Дербент» заключен контракт от 1 июня 2022 года на сумму 1 075,5 млн рублей (в том числе на 2022 год – 290,4 млн рублей, на 2023 год – 774,1 млн рублей (срок получения положительного заключения государственной экспертизы – 30 ноября 2022 года, срок ввода в эксплуатацию – 30 ноября 2023 г). Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 290,44 млн рублей.

На 1 октября 2022 года в адрес Администрации МО «Дербентский район» произведено финансирование в сумме 10,8 млн рублей. Кассовое исполнение составило 5,4 млн рублей. Средства перечислены на 50 % авансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации.

3) Согласно дополнению к Соглашению от 18 апреля 2022 года № 073-09-2022-524/1 в 2023 году запланировано начало строительства 1 школы в г. Махачкале (ул. Л. Чайкиной) на 604 ученических места с завершением в 2024 году.

По результатам проведенного мониторинга, Счетная палата Республики Дагестан отмечает, что из запланированных к вводу в 2022 году 25 школ на 13 728 ученических мест, риски завершения строительства имеют 22 объекта образования на 11 882 ученических мест, в том числе:

– **ФГУП «ГУСС».** По 9 объектам образования на 5 258 уч. мест, в том числе 8 школ на 5 178 уч. мест в связи с низкой строительной готовностью (от 45,7 % до 84,0 %), а также школа на 80 уч. мест в с. Хебатли, Цунтинский район (26,6 %) в связи с затянувшимся строительством из-за труднодоступности объекта и корректировки проектно-сметной документации (планируется замена объекта строительства).

– **ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика»** – **12 объектам на 5 820 ученических мест** с объемом предусмотренных расходов в сумме 5 128,1 млн рублей, в связи с затянувшимися сроками разработки и утверждения проектной документации, а также получения положительного заключения государственной экспертизы;

– **МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан)** – **1 школа на 804 места** с предусмотренным объемом финансирования в сумме 613,09 млн рублей.

Таким образом, из запланированных к вводу в 2022 году 25 школ на 13 728 ученических мест обязательства по завершению строительства могут быть выполнены только по 3 школам, строительство которых осуществляет ФГУП «ГУСС» (на 502 уч. мест в п. Загородный, г.Махачкала; на 120 мест в с. Кваната Цумадинского района; на 1 224 мест в пос. Семендер г. Махачкалы).

Обязательства местных подрядчиков по завершению строительства 13 объектов на 6 624 ученических мест, не будут исполнены в установленные сроки.

Также же имеется риск освоения бюджетных средств в полном объеме (1 275,65 млн рублей) по 17 объектам образования на 5 256 мест, начало строительства которых предусмотрено местными подрядными организациями (заказчик ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности») в связи с отсутствием подготовленной проектно-сметной документацией, и поздними сроками начала ведения работ.

При этом, в случае завершения разработки проектно-сметной документации, возможно авансирование строительства в пределах 50 % от объема заключенных контрактов с соответствующим кассовым исполнением в сумме 650,0 млн рублей без выполненных работ.

Проведенный анализ показал, что основными причинами затягивания мероприятий по разработке ПСД объектов, являются: задержка в своевременном предоставлении земельных участков муниципальными образованиями под строительство объектов с соответствующей разрешительной документацией; значительные упущения специалистов муниципальных образований при территориальном планировании; отсутствие тщательных исследований пригодности выделенного земельного участка под строительство объектов; отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры в непосредственной близости от выделенного участка под строительство.

2. Создание 171 Центра образования «Точка роста» в сельских школах 39 муниципалитетов и 2 малых городах (268,3 млн рублей), в которых будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования.

Заключено 3 контракта на сумму 268,1 млн рублей (закупка МФУ, ноутбуки и робототехника). Экономия средств субсидии по итогам проведенных торгов составляет 0,017 млн рублей (будет возвращена в резервный фонд).

На 1 ноября 2022 года профинансировано 268,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 268,1 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений.

Лицензии на право ведения дополнительной образовательной деятельности получили 169 школ, или 99 % от плана (171 школа).

3. Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 13» г. Каспийска (27,9 млн рублей).

Заключены 9 контрактов по закупке оборудования на общую сумму 21,4 млн рублей.

На 1 ноября 2022 года профинансировано 28,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 21,4 млн рублей, или 76,4 % от годовых назначений.

На базе МБОУ «СОШ №13» г. Каспийска 13 сентября 2022 года состоялось торжественное открытие технопарка «Кванториум».

4. Обновление материально-технической базы и содержания предмета «Технология» в двух коррекционных интернатных учреждениях (16,1 млн рублей).

Заключены 64 контракта на сумму 15,9 млн рублей, в том числе:

– по МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида (с. Аксай, Хасавюртовский район) заключено 45 контрактов на сумму 7,9 млн рублей. Не законтрактована сумма в размере 0,19 млн рублей;

– по МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат №7 (г. Дербент) заключено 19 контрактов (договоров) на сумму 7,9 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы расходы в сумме 16,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 14,5 млн рублей, или 90,0 % от годовых назначений. Экономия средств субсидии составила 0,059 млн рублей, образовавшаяся по итогам торгов, будет возвращена в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

Ремонтные работы помещений, в которых запланировано создание специализированных кабинетов завершены. Учебное оборудование и средства воспитания поставлены частично.

5. Создание и функционирование ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов». Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ составила 17 750 человек (план 6 000 человек).

6. Предоставление единовременных компенсационных выплат по программе «Земский учитель» 43 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек).

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 14.12.2021г. № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, при замещении которых предоставляются компенсационные выплаты.

По состоянию на 1 ноября 2022 года трудовые договора заключены с 43 педагогическими работниками. Кассовое освоение составило 43,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

2) Региональный проект «Успех каждого ребенка».

В ходе реализации регионально проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 59 %, за счет проведения мероприятий:

– создание в 52 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (41 открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) и 11 футбольных мини-полей) – 48,3 млн рублей;

– создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 228,1 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы расходы в сумме 276,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 273,6 млн рублей, республиканского бюджета – 2,8 млн рублей), или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 263,9 млн рублей, или 95,5 % от годовых назначений.

Заключены 26 контрактов, или 100 % на общую сумму 276,4 млн рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

- приобретение открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) для 41 школы и установка 11 футбольных мини-полей – 3 контракта на сумму 48,3 млн рублей. Кассовое исполнение составило 41,7 млн рублей (экономия – 0,11 млн. рублей будет направлена в резервный фонд Правительства Российской Федерации). Завершена установка 41 открытого плоскостного спортивного сооружения (воркауты) и 8 футбольных мини-полей;

- создание ГАОУ ДО РД «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» (закупка оборудования) – 23 контракта на сумму 228,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 222,2 млн рублей. 30 августа 2022 года в Махачкале прошло официальное открытие ГАУ ДО РД «Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир».

3) Региональный проект «Цифровая образовательная среда».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды до 16,25 %, за счет проведения следующих мероприятий:

- создание центров цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе Центра цифрового образования «ИТ-куб» в ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и в ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» – 34,9 млн рублей;

- обновление материально - технической базы 145 образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды – 229,8 млн рублей.

На реализацию регионально проекта профинансировано 264,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 262,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млн рублей), или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 263,7 млн рублей, или 99,6 % от объема годовых назначений (264,7 млн рублей).

Заключены 40 контрактов по закупке оборудования, или 100 % от плана на общую сумму 264,6 млн рублей, в том числе:

– обновление материально - технической базы 145 образовательных организаций – 23 контракта на сумму 229,8 млн рублей по закупке оборудования. Кассовое исполнение составило 228,8 млн рублей.

– создание Центров цифрового образования детей «ИТ-куб» – 17 контрактов по закупке оборудования на сумму 34,9 млн рублей (экономия по итогам торгов – 0,02 млн рублей будет возвращена в резервный фонд Правительства Российской Федерации). Кассовое исполнение – 34,8 млн рублей.

4) Региональный проект «Молодые профессионалы».

В рамках реализации регионально проекта запланировано оснащение 12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций.

На 1 ноября 2022 года профинансировано и освоено 62,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета – 61,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

В рамках регионального проекта заключено 67 контрактов, или 100 % от плана по закупке оборудования на общую сумму 62,2 млн рублей, из них по:

– ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» – 13 контрактов на сумму 3,98 млн рублей;

– ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» – 42 договора на сумму 28,8 млн рублей;

– ГАОУ ВО «Дагестанский Государственный университет народного хозяйства» – 4 контракта на сумму 14,3 млн рублей;

– ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» – 8 контрактов на сумму 15,1 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 г. поставка учебного оборудования и средств воспитания осуществлена в полном объеме.

3 сентября 2022 года состоялось открытие мастерских по направлению «Социальная сфера» компетенциям: «Медицинский и социальных уход»,

«Лабораторный медицинский анализ», «Стоматология ортопедическая» в ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова».

В 2022 году запланирована сдача демонстрационного экзамена 4 000 студентами и выпускниками. Сдали демонстрационный экзамен 2 960 студентов, из них 612 человек подтвердили уровень, соответствующий национальным/международным стандартам.

В Центре опережающей профессиональной подготовки» Республики Дагестан прошли обучение – 362 человека.

5) Региональный проект «Социальная активность».

В рамках регионального проекта запланировано увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества до 99,6 тыс. человек за счет создания 7 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик молодежных добровольческих организаций.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта профинансировано 8,98 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 8,89 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 7,8 млн рублей, или 87,4 % от объема финансирования и 87,4 % от годовых назначений.

Заключено 22 контрактов, или 100 % от плана по закупке оборудования на общую сумму 8,98 млн рублей.

В Единой информационной системе «Добро.ру» зарегистрировано 60 003 добровольцев, 740 организатора мероприятий, 14 583 волонтеров прошли обучение. Волонтерами республики проведено более 977 мероприятий.

6) Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В рамках регионального проекта запланировано увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность путем охвата патриотическими проектами до 196 тыс. человек.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство образования и науки Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта профинансировано 108,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 107,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 81,5 млн рублей, или 75 % от объема финансирования.

В целях оснащения 1 202 общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации заключено 4 контракта или 100 % от плана на сумму 108,54 млн рублей. Контракты исполнены.

В ходе реализации мероприятий **регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»** запланировано участие молодежи республики на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (30 человек) с июля по октябрь 2022 года. Финансирование регионального проекта не предусмотрено.



5. Национальный проект «Жилье и городская среда»



Куратор национального проекта:

Мажонц М. Л.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

*Руководитель региональных
проектов:*



Сулейманов А.А.

Министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан

5.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 4 региональных проекта:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Формирование комфортной городской среды»;
- 3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- 4) «Чистая вода».

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены средства в сумме 2 736,9 млн рублей (федерального бюджета – 2 507,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 24,2 млн рублей, средств муниципальных образований – 205,5 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года на реализацию национального проекта профинансированы средства в сумме 2 516,7 млн рублей, или 92 % от годовых назначений (2 736,9 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 2015,8 млн рублей, или 80,1 % от объема финансирования (2 516,7 млн рублей) и 73,7 % от годовых назначений (2 736,9 млн рублей).

Заключены 132 контракта на сумму 2 571,6 млн рублей, или 97,8 % от планового объема (135 контрактов).

5.2. В 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» запланировано финансирование 2 региональных проектов.

1) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, за счет проведения следующих мероприятий:

- благоустройство 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий – 1 098,6 млн рублей;

- благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина. города Буйнакска Республики Дагестан (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 93,5 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 222,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 008,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,1 млн рублей, средства муниципальных образований – 205,5 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы расходы в сумме 1 135,5 млн рублей, или 92,9 % от годовых назначений (1 222,7 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 962,2 млн рублей, или 84,7 % от объема финансирования (1 135,5 млн рублей) и 78,7 % от годовых назначений.

Заключены 122 контракта на сумму 1 182,0 млн рублей.

В Соглашениях, заключенных с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, муниципальными образованиями Республики Дагестан, необходимо обеспечить выполнение обязательств по ежемесячному кассовому исполнению в размере 100% от объемов финансирования.

По состоянию на 1 ноября 2022 года из 47 муниципальных образований средства на реализацию мероприятий регионального проекта не профинансированы МО «Хивский район».

По 46 муниципальным образованиям кассовое исполнение составляет 833,7 млн рублей, или 92,0 % от объема финансирования (906,6 млн рублей).

По 28 муниципальным образованиям обеспечено полное освоение годовых назначений, по 17 муниципальным образованиям уровень кассового освоения профинансированных средств составляет от 62 % до 99,96 %.

Низкие темпы освоения профинансированных объемов (менее 50 %) наблюдаются в МО «Дахадаевский район», МО «Казбековский район», МО «Чародинский район».

Завершены работы на 164 территориях (из них: 113 общественных и 51 дворовых) или 92% от общего числа территорий. Не завершены работы в городе Махачкала (3 общественные и 11 дворовых территорий с технической готовностью от 60% до 85%) и городе Хасавюрт (1 общественная территория с технической готовностью 90%).

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект: «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) г. Буйнакск».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено 124,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 110,6 млн рублей, средства местного бюджета – 13,5 млн рублей).

Профинансировано 115,6 млн рублей. Кассовое исполнение составило 56,9 млн рублей, или 45,8 % от годовых назначений.

Муниципальным контрактом от 24 декабря 2021 года разработана проектно-сметная документация (4,94 млн рублей). Получено положительное заключение государственной экспертизы по достоверности сметной стоимости.

Администрацией городского округа «город Буйнакск» 04.05.2022 заключен контракт на 87 млн рублей с исполнителем ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 57» на выполнение работ по реализации проекта. Готовность объекта составляет около 75%.

2) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках досрочного завершения адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах»

планировалось расселение 72 семей (227 человек) из аварийного жилищного фонда, общей площадью 2,75 тыс. кв. метров.

По состоянию на 1 ноября 2022 года в рамках досрочного завершения программы переселения обеспечено расселение 67 семей (210 чел.). Не расселенными остаются 5 семьи (17 чел.) в городе Махачкала, в том числе:

- осталось заключить соглашения с 2 семьями на выкуп жилых помещений, по которым администрацией г. Махачкалы поданы иски в суд в связи с отказом от расселения собственников аварийных помещений;

- по 2 соглашениям заключены контракты на основании решения суда об изъятии объекта недвижимости путем выкупа;

- по 1 соглашению администрацией г. Махачкалы подано исковое заявление в суд в связи с отказом от предоставления банковских реквизитов.

По 2 заключенным контрактам средства федерального бюджета перечислены в адрес Администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

3) Региональный проект «Чистая вода».

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике Дагестан в 2022 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 72,2 % и доли городского населения до 91,2 % за счет строительства и реконструкции 8 объектов водоснабжения (5 объектов 2021 года).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства Республики Дагестан и муниципальные образования.

Заказчиком работ по строительству водовода «Чиркей-Буйнакск», обеспечения водоснабжения г. Южно-Сухокумск и с. Карата, Ахвахского района является ГАУ РД «Сейсмобезопасность». По остальным объектам заказчиками работ являются муниципальные образования.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 514,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 499,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 15,1 млн рублей).

Профинансировано 1 496,8 млн рублей, или 98,9 % от годовых назначений (1 514,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 307,0 млн рублей, или 87,3 % от объема финансирования и 86,3 % от годовых назначений (1 514,2 млн рублей).

На 1 ноября 2022 года были заключены 7 контрактов по 7 объектам, в том числе, по объектам 2022 года – 3 контракта на сумму 1 382,2 млн рублей.

- контракт на проведение работ по обеспечению водоснабжения в г. Южно-Сухокумск заключен 14 сентября 2021 года на сумму 130,4 млн рублей.

- контракт по объекту «Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск», с объемом финансирования 854,7 млн рублей в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2022 года №46-ФЗ, ст. 15, заключен по процедуре осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика). По итогам конкурса подрядчиком определено АО «Мостоотряд-99» (Республика Дагестан);

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- контракт по объекту «Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района» – 204,23 млн рублей.

млн рублей

№	Стройки и объекты	Мощность (кВт.)	Предусмотрено, с учетом 2021 г.	Стоимость по контракту	Профинансировано	Кассовое исполнение	готовность объекта, %
	Итого		1514,18	848	1357,53	1031,82	
1	Реконструкция систем водоснабжения города Кизляр (переходящий объект с 2021 года)	30,64	46,66	46,66	46,66	40,2	100,0
2	Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского района (переходящий объект с 2021 года)	1200 куб. м/сут	3,49	3,49	3,36	0,12	100,0
3	Реконструкция межпоселкового водовода «В. Казанище – Бетаул-Кырлар», Буйнакский район (переходящий объект с 2021 года)	10,26	48,84	48,84	48,84	33,4	98,0
4	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт (переходящий объект с 2021 года)	23,07	189,87	397,93	73,44	73,44	95,0
5	Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского р-на (объект 2021 г.)	18,04	36,0	36,0	36,0	10,52	75,0
6	Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района	24,73	204,23	194,44	204,23	19,44	20,0
7	Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» (переходящий на 2023 год)	31,65	854,7	1 997,94	854,7	854,7	19,0
8	Водоснабжение городского округа «город «Южно-Сухокумск»	11,01	130,39	120,64	90,30	0	0

По состоянию на 1 ноября 2022 года завершены работы на 2 объектах: «Реконструкция систем водоснабжения города Кизляр» и «Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского района».

По 3 объектам водоснабжения уровень строительной готовности составляет от 75,0 % до 98,0%.

По объекту «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» в связи недобросовестным исполнением контрактных обязательств, заказчиком объекта принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. (соответствующая информация не опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок – <https://zakupki.gov.ru>).

По 2 объектам 2022 года: «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» (уровень готовности 20 %, подрядчик ООО «Арт-строй»), «Водоснабжение городского округа город Южно-Сухокумск, Республика Дагестан» (отсутствие заключенного контракта) имеются риски завершения строительных работ в 2022 году.

Следует отметить, что по данным объектам выявлена необходимость корректировки проектной документации в связи с обнаружением недостатков

проектов, влияющих на эксплуатационные характеристики, работоспособность и долговечность отдельных элементов (конструкций) объектов.

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан проводится согласование вопроса о перераспределении средств в сумме 302,3 млн рублей на строительство объекта «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск Республики Дагестан. Строительство водовода Чиркей-Буйнакск».

В данном случае предлагается увеличить размер субсидии, предусмотренной на финансирование объекта «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск Республики Дагестан» в 2022 году (срок строительства 2022 г – 2023 г), а в 2023 году осуществить строительство объектов «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» и «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан за счет уменьшения предусмотренного лимита по объекту «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск на 2023 год.

5.3. По *региональному проекту «Жилье»* в 2022 году согласно дополнительному соглашению от 14.12.2020 г. № 069-2019-F10081-1/2 к Соглашению, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан запланировано увеличение объемов жилищного строительства до 1 004 тыс. кв. м.

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан за январь-сентябрь 2022 года введено 605,4 тыс. кв.м. жилья (87,2 % к январю-сентябрю 2021 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 347,4 тыс.кв.м. (100,2 % к январю-сентябрю 2021 года);

- строительство многоквартирных домов – 258,0 тыс.кв.м. (74,2 % к январю-сентябрю 2021 года).

Уровень достижения показателя по Соглашению составил 60,3 %.

По прогнозу ввода жилья на январь-октябрь 2022 года ожидается ввод 779,2 тыс. кв.м. (100,2 % к январю-октябрю 2021 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство 433,7 тыс.кв.м. (114,2 % к январю-октябрю 2021 года);

- строительство многоквартирных МКД – 345,6 тыс.кв.м. (70,9 % к январю – октябрю 2021 года).

Уровень достижения показателя по Соглашению составит на 77,6 %.



6. Национальный проект «Экология»



**Куратор национального проекта
Абдумуталибов Н.М**
Заместитель Председателя Правительства

Руководители региональных проектов:



Ибрагимов И.М.
Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

6.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» в 2022 году реализуются 4 региональных проектов.

- 1) «Чистая страна» (начало реализации – 2023 год);
- 2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- 3) «Сохранение уникальных водных объектов»;
- 4) «Сохранение лесов».

Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан, регионального проекта «Сохранение лесов» – Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Экология» предусмотрены средства в сумме 89,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 83,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей, средства «Даглес» – 5,6 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 20,2 млн рублей, или 22,5 % от годовых назначений (89,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 20,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, и 22,5 % от годовых назначений.

Заключено 6 контрактов, или 100 % от планового объема, на сумму 10,2 млн рублей.

6.2. В 2022 году по нацпроекту «Экология» из 4 региональных проектов запланировано финансирование 3 региональных проектов, в том числе:

1) Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий:

- увеличение площади лесовосстановления – 17,1 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 1,05 млн рублей;
- оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной техникой и оборудованием – 7,2 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 25,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 19,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей, средства «Даглес» – 5,6 мл н рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года Комитету по лесному хозяйству Республики Дагестан профинансировано 17,2 млн рублей, или 66,4 % от годовых назначений (25,8 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 17,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 66,4 % от годовых назначений, в том числе по следующим мероприятиям:

- увеличение площади лесовосстановления – 10,0 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 0,05 млн рублей;
- оснащение лесопожарной техникой и оборудованием – 7,2 млн рублей.

В целях оснащения лесопожарной техникой и оборудованием ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» заключены 5 контрактов (договоров) по которым поставлена следующая техника: автомобиль ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной установкой (1 ед.) на сумму 5,9 млн рублей; квадрацикл-вездеход на сумму 0,9 млн рублей; оргтехника (2 договора) на сумму 0,26 млн рублей; ранцевые огнетушители (1 договор) на сумму 0,23 млн рублей. Оплата произведена.

Проведено лесовосстановление на площади 0,225 га (план – 514 га) на сумму 6,5 млн рублей, в том числе лесоразведение на площади 50 га на сумму 0,4 млн рублей.

Заготовлено семян в объеме 170 кг. за счет средств ООО «Даглес», или 3,1 % от плана (5 515 кг).

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 65 % (план – 100 %).

2) Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличить протяженность расчищенных участков русел рек до 13,28 км.

На 2022 год запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета).

Профинансированы и освоены расходы в сумме 3,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» заключен 1 контракт с ООО «Земля» на подготовку проектно-сметной документации по проекту «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 3,4 млн рублей (бюджет 2022 года – 3,0 млн рублей, бюджет 2023 года – 0,4 млн рублей).

В соответствии с заключенным государственным контрактом проектная документация разработана. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации.

6.3. Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан. Финансирование регионального проекта «Чистая страна» в 2022 году не предусмотрено.

3) По региональному проекту «Чистая страна» запланирована ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены в границах городских округов, в том числе в городах: Буйнакске (4 га), Каспийске (9 га), Южно-Сухокумске (6 га), Хасавюрте (14 га).

В целях подготовки проектно-сметной документации ГКУ РД «Дагводсервис» (Заказчик)⁵ с ООО «Гидропроект» (Порядчик) от 28 декабря 2021 года заключены 4 контракта на общую сумму 33,8 млн рублей и перечислен аванс (30 %) в сумме 10,1 млн рублей, в том числе:

- свалка в г.Южно-Сухокумск – контракт № 19-2021 на сумму 9,1 млн рублей, аванс – 2,7 млн рублей;
- свалка в г. Каспийск – контракт № 21-2021 на сумму 10,3 млн рублей, аванс – 3,1 млн рублей;
- свалка в г. Буйнаксск – контракт № 18-2021 на сумму 6,8 млн рублей, аванс – 2,0 млн рублей;
- свалка в г. Хасавюрт – контракт № 20-2021 на сумму 7,6 млн рублей, аванс – 2,3 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 г. проектная документация по всем 4 объектам подготовлена и прошла государственную экспертизу. Наличие утвержденной проектной документации являлось необходимым условием финансирования регионального проекта в 2023 – 2024 годах (586,0 млн рублей).

На заседании Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 года принято решение о выделении более 9,3 миллиардов рублей на ликвидацию стихийных свалок в 24 регионах страны (в том числе в 2023 году – 7 регионов). При этом, Республика Дагестан не вошла в состав регионов, финансирование мероприятий которых в рамках регионального проекта, предусмотрено в 2023 году.

Министерством природы и экологии Республики Дагестан не обеспечен должный уровень контроля и не приняты действенные меры по своевременному и качественному исполнению обязательств по указанным контрактам. Таким образом, риски реализации регионального проекта созданы еще на стадии планирования мероприятий национального проекта.

⁵ подведомственная организация Министерства природы и экологии Республики Дагестан

4) По региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» запланированы мероприятия по подготовке к строительству 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- территориальный узел Махачкала с мусоросортировочным комплексом мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 300 тыс. тонн/год;

- территориальный узел Хасавюрт с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год;

- территориальный узел Дербент с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;

Во всех территориальных зонах будут созданы перегрузочные станции (36 станций) на территории труднодоступных районов.

Указанные объекты будут реализованы при финансовом участии ППК «Российский экологический оператор».

В этой связи, 13 сентября 2022 г. на площадке IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в г. Москва состоялось подписание трёх концессионных Соглашений между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор». Объем инвестиций составит около 13 млрд. рублей. Комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 60,8 млн рублей (средства республиканского бюджета). По состоянию на 1 ноября 2022 года финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.

В ходе реализации регионального проекта имеются риски достижения целевых показателей к концу года из-за отсутствия мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан.

Министерством природы и экологии Республики Дагестан направлено письмо в адрес ППК «Российский экологический оператор» о корректировке значений целевых показателей в период с 2022 по 2030 годы с учетом сроков ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных в федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, путем заключения дополнительного соглашения.



7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р.К.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Салавов Д. Ш.
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан

7.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта.

- 1) «Дорожная сеть»,
- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- 3) «Безопасность дорожного движения».

Реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» осуществляет Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 2 357,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 830,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 527,5 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы средства в сумме 2 063,1 млн рублей, или 87,5 % от годовых назначений (2 357,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 960,6 млн рублей, или 95,0 % от объема финансирования и 83,2 % от годовых назначений (2 357,5 млн рублей).

Заключены 20 контрактов или 100 % от планового объема по 2 региональным проектам на общую сумму 2 322,0 млн рублей.

7.2. В 2022 году по национальному проекту из 3 региональных проектов предусмотрено финансирование 2 региональных проектов, в том числе:

1) Региональный проект «Дорожная сеть».

В рамках ходе реализации регионального проекта запланировано:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2 автомобильных дорогах регионального значения, входящих в состав Махачкалинской городской агломерации (114,9 пог. метров) – 355,8 млн рублей;

- ремонт и реконструкция 48,9 км автомобильных дорог регионального значения (7 объектов, вводимых в эксплуатацию, всего 8 с учетом объекта «Содержание автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке км 0 – км 4 (контракт жизненного цикла)») – 1 074,5 млн рублей;

- ремонт (капитальный ремонт) и организация дорожного движения на 20,9 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (38 объектов, из них 31 объект – ремонт, 6 объектов – капремонт, 1 объект – реконструкция) – 457,9 млн рублей.

- реконструкция улично-дорожной сети г. Дербент (улицы Кобякова, Нанейшвили, Фермерская общей протяженностью 6,07 км) – 205,2 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 2 102,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 687,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 415,0 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 1 843,7 млн рублей, или 87,7 % от объема годовых назначений (2 102,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 1 741,3 млн рублей, или 94,4 % от объема финансирования и 82,8 % от годовых назначений.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках регионального проекта заключены 16 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 2 102,6 млн рублей.

млн рублей

№	Объект исполнения	Предусмотрено по контракту на 2022 год	Кассовое исполнение ⁶		Исполнитель
			Сумма	%	
ГКУ «Дагестанавтодор»					
1	Ремонт А/Д «Бабаяорт-Гребенская» 0-8 км, контракт от 29.09.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	81,3	81,3	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
2	Ремонт А/Д «Буйнакск-Гимры-Чирката» 0-8 км, контракт от 25.10.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	140,8	140,8	100	АО «МОСТОТРИЯД-99»
3	Ремонт А/Д «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост 15 - 23 км, контракт от 29.09.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	88,8	88,8	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
4	Ремонт А/Д «Буйнакск-Гимры-Чирката» 8-21 км, контракт от 25.10.2021 г. (срок исполнения 30.10.22 г.)	285,3	285,3	100	АО «МОСТОТРИЯД-99»
5	Строительство а/д «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию Каспий», контракт от 05.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)	68,9	68,9	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
6	Строительный контроль а/д «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию Каспий» от 13.11.2021 г. (срок исполнения 30.11.22)	0,36	0,36	100	ООО «ТЕХНОКОНТРОЛЬ»
7	Капитальный ремонт а/д «Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб» 12-23 км контракт от 15.03.2022 г. (срок исполнения 30.12.23)	540,2	464,6	86,0	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
8	Содержание А/Д «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» 0-4 км, контракт от 16.12.2019 г. срок исполнения 31.12.2023 г.	0,71	0,54	76,0	ООО «Юагропромдорстрой»
9	Реконструкция А/Д «Гели-Талги», контракт от 13.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)	232,8	95,7	34,3	ООО «СЕВКАВДОРСТРОЙ»
МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Город «Дербент»					
10	Реконструкция ул. Фермерская в г. Дербент, контракт от 11.11.20 (срок исполнения 27.04.22)	84,3	84,3	100,0	ООО «Маяк»
11	Реконструкция ул. Кобякова-Нанейшвили в г. Дербент, контракт от 02.12.2020 г., (срок исполнения 02.06.22)	120,9	52,3	43,2	ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-55»

⁶ уточнено по состоянию на 3 ноября 2022 года

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объект исполнения	Предусмотрено по контракту на 2022 год	Кассовое исполнение ⁶		Исполнитель
			Сумма	%	
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»					
12	Капитальный ремонт по 11 объектам УДС Ленинского района, г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	68,9	68,9	100	ООО «МАХАЧКАЛИНСКАЯ ДПК»
13	Капитальный ремонт по 6 объектам УДС в г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 (срок исполнения 31.12.22)	148,6	136,9	92,1	ООО «ДОРСТРОЙТЕХ»
14	Капитальный ремонт УДС Кировского района, г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	31,0	23,1	74,5	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
15	Капитальный ремонт по объектам УДС в г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	57,0	41,7	73,1	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
16	Реконструкция ул. Докузпаринская в г. Махачкала, контракт от 26.04.2022 г. (срок исполнения 30.09.22)	152,3	107,5	70,6	ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ МОНТАЖ»
Итого		2 102,6	1 741,3	82,8	

По объектам улично-дорожного движения города Махачкалы завершены работы на 33 улицах из 38 предусмотренных.

По объектам регионального значения завершены работы на 6 объектах из 10 предусмотренных (1 объект - строительный контроль).

По 2 объектам УДС г. Дербента выполнены работы на 67%.

Итого по всем объектам выполнение работ по укладке асфальто-бетонного покрытия составляет 85 % (497 тыс. кв. м. из предусмотренных 585 тыс. кв. м.)

1. Государственным казенным учреждением Республики Дагестан «Управление автодорог Республики Дагестан» (ГКУ «Дагестанавтодор») по 9 объектам регионального и межмуниципального значения заключено 9 контрактов на сумму 1 840,3 млн рублей (объемы финансирования на 2022 год – 1 439,2 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 1 226,3 млн рублей, или 85,2 % от объема финансирования на 2022 год.

По объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Гели-Талги» (срок исполнения 31.12.23 г, лимит на 2022 год – 232,8 млн рублей), кассовое исполнение – 95,7 млн рублей, или 34,3 % от годовых назначений. По объекту имеются риски освоения предусмотренных годовых назначений.

Следует отметить, что в ЕИС «Закупки» стоимость контракта № 69/21-РЕК/Р (№ 2056201131421000159) от 21.10.2021 г. составляет 222,0 млн рублей (в том числе объем средств на 2022 год – 205,8 млн рублей);

2. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала» по объектам улично-дорожной сети города Махачкалы заключены 5 контрактов на сумму 457,9 млн рублей (объемы финансирования на 2022 год). Кассовое исполнение составляет 378,1 млн рублей, или 82,6 % от годовых назначений на 2022 год.

Контракт № 3054100850422000009 от 26 апреля 2022 года ремонт улицы Докузпаринская в г. Махачкала не исполнен в установленные сроки 30.09.2022 г. Кассовое исполнение по контракту составляет 107,5 млн рублей, или 70,6 % от его стоимости (152,3 млн рублей).

По 4 контрактам сроки исполнения установлены на 31 декабря 2022 года.

3. МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Город «ДЕРБЕНТ» по объектам улично-дорожной сети города Дербент заключены 2020 году заключены 2 контракта с бюджетом на 2022 год в сумме 205,2 млн рублей по ремонту 2 улиц (Кобякова - Нанейшвили, Фермерская общей протяженностью 6,07 км).

По состоянию на 1 ноября 2022 года по объектам улично-дорожной сети г. Дербент кассовое исполнение составило 136,6 млн рублей или 66,5 % от годовых назначений.

Работы по объекту «Реконструкция улицы Фермерская в г. Дербент» (контракт № ОК-20/030 от 11.11.2020 г. на сумму 174,7 млн рублей (бюджет 2022 года – 84,1 млн рублей), завершены. Средства освоены в полном объеме.

Однако, подрядчик ООО Фирма «Маяк» не обеспечил своевременное исполнение контракта (27 апреля 2022 года).

По контракту от 2 декабря 2020 года [№ 3054201850520000094](#) на выполнение работ по ремонту улицы Кобякова – Нанейшвили, срок исполнения работ был установлен на 2 июня 2022 года. Однако, стоимость исполненных подрядчиком по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 129,8 млн рублей (117,3 млн рублей с учетом НДС (20 %)). Кассовое исполнение составило 52,3 млн рублей, или 42,3 % от годовых назначений (120,9 млн рублей). Таким образом, ООО «СМУ-55» (подрядчик) не обеспечил своевременное исполнение контракта (02.06.2022 г). Соответствующие меры реагирования за нарушение условий контракта к подрядчику не применялись.

2) Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В ходе реализации регионального проекта запланировано:

– внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Махачкалинской агломерации – 142,3 млн рублей;

– строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на а/д Кизляр-Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края – 60,6 млн рублей;
– установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения) на автомобильных дорогах республиканского и межмуниципального значения Республики Дагестан (15 ед.) – 51,9 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 254,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 142,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 112,5 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы средства в размере 219,3 млн рублей, или 86,1 % от годовых назначений (254,8 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 219,3 млн рублей, или 86,1 % от годовых назначений.

Заключены 4 контракта (100 %) на сумму 219,3 млн рублей, в том числе:

- контракт по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации – 1 контракт от 23.11.2021г. на сумму 320,3 млн рублей (лимит 2022 года – 106,8 млн рублей), срок исполнения 31.12.2023 г. Кассовое исполнение – 106,8 млн рублей или 100 % от объема финансирования на 2022 год (142,3 млн рублей).

В связи с тем, что администрацией г. Махачкалы не заключено дополнительное соглашение в целях полного освоения лимита на 2022 год (142,3 млн рублей) Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан направлен запрос в Министерство транспорта Российской Федерации о перераспределении на 2023 год бюджету Республики Дагестан средств федерального бюджета в размере 35,5 млн рублей;

- контракт по строительству автоматизированного пункта весогабаритного контроля на а/д Кизляр-Терекли-Мектеб – граница Ставропольского края – контракт от 28.04.2022 г. № 2056103950022000003 на сумму 54,8 млн рублей, срок до 31.07.2022 г.

На сайте <https://zakupki.gov.ru> размещена информация об изменении срока исполнения с 31 июля 2022 года на 30 октября 2022 года. Одновременно, увеличена стоимость контракта до 60,6 млн рублей с внесением соответствующих изменений в Закон о республиканском бюджете.

Работы по строительству весогабаритного контроля на км 65+650 автомобильной дороги «Кизляр-Терекли-Мектеб-граница Ставропольского края» выполнены на 100 % с учетом запланированного повышения стоимости контракта до 60,6 млн рублей;

- контракт на установку 12 камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 41,4 млн рублей (экономия – 10,5 млн рублей). Исполнение контракта завершено;

- контракт на установку 3 камер фото-видеофиксации нарушений ПДД на сумму 10,5 млн рублей. Исполнение контракта завершено.

7.3. Реализация регионального проекта *«Безопасность дорожного движения»* направлена на повышение безопасности участников дорожного движения и снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (не более 10 человек на 100 тысяч населения и не более 4 человек на 10 тысяч транспортных средств), в том числе за счет приобретения:

- хроматографов для медицинских организаций в целях выявления состояния опьянения;

- автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для медицинских организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- технических средств обучения (наглядные учебные и методические).

Ответственными исполнителями регионального проекта являются Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659). Однако, в государственной программе средства на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» на 2022 год не предусмотрены.

Согласно данным размещенным на сайте (<http://stat.gibdd.ru>) с января-сентябрь 2022 года на территории Республики Дагестан произошло 1 047 ДТП, в которых погибли 217 человек и ранено 1 460 человек. Для сравнения за аналогичный период 2021 года произошло 1 038 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 224 человека и ранено 1 479 человек.



8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»



Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р. К.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



*Руководитель региональных
проектов:*
Гамзатов Ю.В.
Министр цифрового развития Республики
Дагестан

11.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) *«Кадры для цифровой экономики»*,
- 2) *«Информационная инфраструктура»*,
- 3) *«Информационная безопасность»*;
- 4) *«Цифровые технологии»*,
- 5) *«Цифровое государственное управление»*.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрено финансирование в сумме 201,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 199,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,0 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года на реализацию национального проекта профинансировано 191,4 млн рублей, или 95,1 % от годовых назначений (201,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 137,0 млн рублей, или 71,6 % от финансирования или 68,0 % от годовых назначений (201,3 млн рублей).

В рамках реализации национального проекта заключено 4 контракта, или 100 % от плана 2022 год на сумму 201,3 млн рублей.

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

11.2. В 2022 году из 5 региональных проектов по национальному проекту предусмотрено финансирование регионального проекта «Информационная инфраструктура».

1) Региональный проект «Информационная инфраструктура».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2022 году предусмотрено:

– формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организациях (81 школа) – 191,4 млн рублей;

– создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» – 9,9 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 201,3 млн рублей (средств федерального бюджета – 199,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,0 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 191,4 млн рублей, или 95,1 % от годового объема.

Кассовое исполнение составило 137,0 млн рублей, 68,0 % от годовых назначений (201,3 млн рублей), в том числе:

– формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организаций – 127,1 млн рублей, или 66,4 %;

– создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» – 9,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 4 контракта, или 100 % от планового объема на сумму 201,3 млн рублей, в том числе:

– контракт на проведение проектно-изыскательских работ с ПАО «Ростелеком» от 15 марта 2022 года № CERF-01 на сумму 70,41 млн рублей по 1 344 школам (1 994 помещений), срок исполнения – 30 октября 2022 г. Оплачено по контракту 67,84 млн рублей. По результату приемки работ по контракту № CERF-01 образовалась экономия в объеме 2,57 млн рублей (включена в сумму контракта № CERF-03). По состоянию на 1 ноября 2022 года подготовлены и приняты технические паспорта на 1 310 школ.

– контракт на проведение монтажных работ по установке структурированной кабельной системы от 12 июля 2022 года с ПАО «Ростелеком» № CERF-02/01 на сумму 118,5 рублей (79 школ). Срок исполнения контракта 31 декабря 2022 года. Остаток средств в объеме 2,47 рублей включен в сумму контракта № CERF-03. Проведена работа по установке структурированной кабельной системы в 58 зданиях школ;

– контракт с ПАО «Ростелеком» на проведение монтажных работ по установке структурированной кабельной системы от 07.10.2022 г. № CERF-03 на сумму 5,0 млн рублей (2 школы). Срок исполнения контракта 31 декабря 2022 года;

– контракт в целях создания и организации работы единой службы оперативной помощи по номеру «122» от 6 июня 2022 года № 0103200008422001380 на сумму 9,9 млн рублей. Контракт исполнен. Заключено дополнительное соглашение от 11.08.2022 № 071-17-2022-047/2 на возврат экономии в объеме 2,3 рублей. Средства отозваны.

По мероприятию «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов» проводится работа по заключению договоров на оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов (СЗО) непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты СЗО. При этом, в бюджете организаций средства на указанные цели отсутствуют. Договоры на оказание услуг заключены по 1 363 объектам СЗО, или 78,7 % от плана (1 732 объектов).

11.3. Финансирование региональных проектов «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» не предусмотрено. В то же время, в 2022 году запланировано проведение следующих мероприятий:

В ходе реализации регионального проекта **«Информационная безопасность»** формируются планы перехода на использование отечественного программного обеспечения.

Обеспечено получение образовательными организациями на безвозмездно лицензий на офисное и системное программное обеспечение.

Проведена работа по определению объектов критической информационной инфраструктуры, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

В ходе реализации регионального проекта *«Цифровые технологии»* с ИТ- сообществом проводится информационная работа о действующей системе мер поддержки сферы информационных технологий, в которую входит грантовое финансирование на реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний.

В ходе реализации регионального проекта *«Цифровое государственное управление»* запланированы мероприятия по обеспечению использования облачной цифровой платформы для оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов.

Приказом Министерства цифрового развития Республики Дагестан от 26 сентября 2022 года № 153-ОД утвержден Региональный перечень массовых социально-значимых услуг (МСЗУ), состоящий из 84 услуг. На 1 ноября 2022 года в соответствии с региональным перечнем в электронный формат переведены все 84 МСЗУ. Дополнительно проведена работа по переводу 5 востребованных услуг, не входящий в региональный перечень МСЗУ.

В целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи создано 4 249 учетных записей (на 1 января 2022 года – 2 715), в том числе: имеющие статус «подтвержден» – 3 763 (на 1 января 2022 года – 1 938), имеющие статус «не подтвержден» (сотрудники не осуществили вход и не начали работать) – 486 (на 1 января 2022 года – 777).

Несмотря на проводимую работу показатель «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных» составляет 14,6 процентов и является очень низким.

В ходе реализации регионального проекта *«Кадры для цифровой экономики»* запланировано обучение 151 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

На образовательные программы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», от Республики Дагестан зачислено 172 человека, что составляет 113,9% от плана (151 человек). Квота, установленная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для Республики Дагестан на 2022 год, выполнена, показатель достигнут.

Наблюдается рост обучающихся и педагогов образовательных организаций на платформе «Цифровой образовательный контент», предоставляющей онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам на базе АНО ВО «Университет Иннополис». Количество подключенных образовательных организаций (в том числе частных) достигло 1 531, количество зарегистрированных педагогов – 20 475 человек, учащихся – 144 661 человек.



9. Национальный проект «Культура»



Куратор национального проекта:
Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Бутаева З. А.

Министр культуры Республики Дагестан

8.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» реализуются три региональных проекта:

- 1) «Культурная среда»;
- 2) «Творческие люди»;
- 3) «Цифровая культура».

Реализацию региональных проектов осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

В 2022 на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено финансирование в общей сумме 862,5 млн рублей, (средства федерального бюджета – 716,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 131,0 млн рублей, иные средства – 15,5 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 763,3 млн рублей, или 88,5 % от годовых назначений (862,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 560,1 млн рублей, или 73,4 % от объема финансирования и 64,9 % от годовых назначений (862,5 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта заключено 138 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 862,5 млн рублей.

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию национального проекта 4,3 млн рублей не подлежат контрактации.

8.2. В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланировано финансирование 3 региональных проектов, в том числе:

1) Региональный проект «Культурная среда».

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году предусмотрено увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, а также количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных организаций культуры,

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 828,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 711,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 101,3 млн рублей, средства местных бюджетов – 15,5 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 729,5 млн рублей, или 88,0 % от годовых назначений (828,7 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 526,7 млн рублей, или 72,2 % от объема финансирования и 63,6 % от годовых назначений.

Заключено 107 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 828,4 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 года проведена следующая работа:

1) Переоснащены 5 образовательных учреждений в сфере культуры (с. Новый Кумух, Буйнакский район, город Махачкала, город Дагестанские Огни, с. Кумух, Лакский район, село Новый Хушет, город Махачкала) – 25,1 млн рублей;

2) Оснащены 3 муниципальных музея: «Каспийский городской краеведческий музей» (открыт 17.09.2022 г.), «Музей истории города Махачкалы»; «Историко-краеведческий музей» Табасаранского района (скрои открытия – ноябрь 2022 года) – 19,4 млн рублей;

3) Открыты 4 модельные библиотеки: Центральная городская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система г. Махачкала»; Филиал № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Каспийск» имени Ф. Алиевой; Центральная городская библиотека муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Кизилюрт»; Городская библиотека – филиал №1 муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Избербаш» – 30,0 млн рублей;

4) Проведен капитальный ремонт 2 детских школ искусств МКУ ДО «ДШИ в с. Маджалис», МКУ ДО «ДШИ в с. Уркарах» (техническая готовность по 2 объектам – 100 %) – 33,2 млн рублей;

5) В 2022 году, согласно ранее заключенным контрактам, запланировано завершение строительства следующих объектов:

– Дом танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект с 2020 года) – 444,8 млн рублей, техническая готовность которого на 1 ноября 2022 года составляет 70,0 %. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию: 30.12.2023 г. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 2324-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с ростом цен на строительные ресурсы выделены дополнительные средства в объеме 85,42 млн рублей. Общий объем средств по объекту на 2022 год составил 444,8 млн рублей (вместо ранее предусмотренных – 359,4 млн рублей).

– Центр культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан (переходящий объект с 2021 года) – 73,6 млн рублей, техническая готовность которого на 1 ноября 2022 года составляет 10 %. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 декабря 2023 года. В связи с низкими темпами проведения строительных работ частично перенесены на 2023 год ранее предусмотренные на 2022 год средства в сумме 60,6 млн рублей. Общий объем средств по объекту на 2022 год составил 73,6 млн рублей, вместо ранее предусмотренных – 134,2 млн рублей;

– благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляре Республики Дагестан – 40,4 млн рублей, техническая готовность – 0 %. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 декабря 2023 года. В целях снижения риска неосвоения частично перенесены на 2023 год предусмотренные на 2022 год средства в сумме 35,3 млн рублей. Общий объем средств по объекту на 2022 год составил 40,4 млн рублей, вместо ранее предусмотренных – 75,7 млн рублей.

Сроки ввода в эксплуатацию Дома танца ансамбля «Лезгинка» г. Махачкала и Центра культурного развития в городе Кизляр установлены на февраль 2023 года.

б) Капитальный ремонт 12 Домов культуры. По состоянию на 1 ноября 2022 года освоено 144,0 млн рублей, или 88,8 % от годовых назначений (162,1 млн рублей).

**Перечень
объектов, подлежащих строительству, капитальному ремонту,
в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году**

№	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства	Мощность		Законтрактовано в отчетном периоде (млн рублей)	Кассовое освоение (млн. руб.)	Технич. готовность объекта (%)
		колич. мест	ед. изм.			
1	Капремонт Дома культуры в с. Калининаул, Казбековский район	400	мест	3,76	3,76	100,0 %
2	Капремонт Дома культуры в с. Чагаротар, Хасавюртовский район	180	мест	19,46	19,46	100,0 %
3	Капремонт Дома культуры в с. Янгикент, Кайтагский район	260	мест	21,8	21,8	100,0 %
4	Капремонт Дома культуры в с. Цахур, Рутульский район	200	мест	4,64	4,64	100,0 %
5	Капремонт МКУ ДО «Детская школа искусств в с. Маджалис»	375	обуч.	13,69	13,69	100,0 %
6	Капремонт МКУ ДО «Дахадаевская районная школа искусств»	515	обуч.	19,53	19,53	100,0 %
7	Капремонт Дома культуры в с. Урахи, Сергокалинский район	600	мест	7,42	7,42	100,0 %
8	Капремонт Дома культуры в с. Хараг Табасаранский район	120	мест	11,7	10,18	95,0 %
9	Капремонт Дома культуры в с. Кули, Кулинский район	200	мест	19,65	18,67	95,0 %
10	Капремонт Дома культуры в с. Урада, Шамильский район	200	мест	13,50	12,8	95,0 %
11	Капремонт Дома культуры в с. Смугул, Ахтынский район	100	мест	6,59	5,99	90,9 %
12	Капремонт Дома культуры в с. Хучни, Табасаранский район	450	мест	22,93	17,09	86,0 %
13	Капремонт Дома культуры в с. Ахты, Ахтынский район	200	мест	22,86	17,5	75,0 %
14	Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка»	7 645,4	кв.м	444,8	192,5	70,0 %
15	Капремонт Дома культуры в с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район	130	мест	7,75	4,68	55,0 %
16	Строительство Центра культурного развития в г. Кизляр	1 517	кв.м	73,6	52,35	10,0 %
	Благоустройство территории ЦКР в г. Кизляр	-	-	40,0	30,0	0,0 %

По состоянию на 1 ноября 2022 года из 12 Домов культуры техническая готовность составляет: по 5 объектам – 100 %, по 3 объектам – от 95 % до 99%, по 3 объектам – от 56 % до 94,0 %, по 1 объекту – 55 %. Плановый срок завершения работ по всем объектам – 1 декабря 2022 г.

В виду низких темпов строительных работ имеются риски завершения работ по капитальному ремонту Дома культуры в с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район (55,0 %).

2) Региональный проект «Творческие люди».

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации, количества поддержанных творческих инициатив, выставочных проектов.

На реализацию регионального проекта профинансировано 31,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 4,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 27,4 млн рублей, местных бюджетов – 0,04 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Освоено 31,1 млн рублей, или 98,7 % от годовых назначений.

Заключено 30 контрактов, или 100 % от плана на сумму 26,7 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта проведены:

– повышение квалификации прошли 337 работников культуры, или 52,6 % от плана на 2022 год (629 работников) – 0,2 млн рублей;

– оказана поддержка учреждениям органов культуры сельских поселений (29 денежных поощрений по 100 тыс. рублей) – 2,9 млн рублей и лучшим работникам учреждений культуры сельских поселений (26 поощрений по 50 тыс. рублей) – 1,3 млн рублей;

– Фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России», г. Махачкала, 12 июня 2022 года – 0,55 млн рублей;

– Республиканский форум «Волонтеры культуры», г. Махачкала с 20 по 21 июня 2022 года – 0,25 млн рублей;

– 2 творческих проекта на укрепление гражданской идентичности (XX Международный фестиваль фольклора «Горцы», Фестиваль «Дербент перекресток цивилизаций», 1 июля 2022 года) – 7,55 млн рублей;

– 3 всероссийских и международных творческих проекта в области искусства (XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи», X Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары», Международный театральный фестиваль «Русская сцена», с 26 сентября по 4 октября 2022 года) – 13,0 млн рублей;

– 12 выставочных проектов музеев (план – 17 проектов) – 5,0 млн рублей;

– культурно-познавательные программы для школьников (ГБУ РД «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова») – 0,3 млн рублей.

Не проведен фестиваль для детей и молодежи «Наши надежды» (бюджет – 0,4 млн рублей). Срок проведения мероприятия с 27.11.2022 г. по 4.12.2022 г.

3) Региональный проект «Цифровая культура»

В ходе регионального проекта в 2022 году предусмотрено увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами (нарастающим итогом) до 4 единиц за счет создания мультимедийного гида по экспозициям на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи».

На реализацию регионального проекта профинансированы и освоены 2,3 млн рублей (средства республиканского бюджета), или 100 % от годовых назначений. Работы по установке мультимедийного гида по экспозициям на основе цифровой платформы «Артефакт» завершены.



10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов



Хрюкин А. Р.

Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

10.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

1) *«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»);*

2) *«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»);*

3) *«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;*

Реализацию национального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (81,7 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (94,7 млн рублей).

В 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 176,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,76 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано 172,5 млн рублей или 97,8 % от годовых назначений (176,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 172,5 млн рублей, или 97,8 % от годовых назначений (176,4 млн рублей).

В рамках национального проекта заключено 92 контракта по 3 региональным проектам на общую сумму 53,4 млн рублей или 100 % от плана.

10.2. В рамках национального проекта предусмотрено финансирование мероприятий 3 региональных проектов:

1) *Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».*

В ходе реализации регионального проекта планируется предоставление консультационных, информационных услуг самозанятым гражданам.

На реализацию регионального проекта профинансировано и освоено 13,3 млн рублей или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 13,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на оказание самозанятым гражданам комплекса услуг Центрами «Мой бизнес».

Заключено 18 контрактов, или 100 % от плана на сумму 12,5 млн рублей.

Контракты заключены на проведение мероприятий по популяризации продукции субъектов МСП, размещению ее на электронных площадках, проведение обучения, обеспечение участия в ярмарках и выставках.

Средства 0,8 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальный расходы, не контрактуются.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), составило 179,0 тыс. человек, или в 12 раз превышает плановое

количество на 2022 год (14,7 тыс. человек). При этом, количество самозанятых граждан в центрах «Мой бизнес», получивших услуги с начала реализации регионального проекта, составило 655 человека, или 100 % от плана.

В ходе реализации регионально проекта проведены следующие мероприятия: V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить» (4 самозанятых граждан), выставка-ярмарка «Благословенный Кавказ и ювелирные традиции 2022» (4 самозанятых граждан), мастер-класс по прическам «Свадебный шик. Тренды-2022» (101 самозанятый гражданин), оказаны консультации самозанятым гражданам (500 самозанятым гражданам), обучение основам интернет-маркетинга (12 человек), маркетинговые услуги (Логобуки) (30 самозанятых граждан), содействие в популяризации продукции (4 самозанятых граждан).

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам составил 4 млн рублей, или 129,0 % от планового объема (план – 3,1 млн рублей).

Планируется провести Международную выставку «Клинок-Традиции и современность»; Международную выставку-ярмарку народно-художественных промыслов России «Ладья Зимняя сказка – 2022».

2) Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Мероприятия регионального проекта направлены на оказание информационной, консультационной, финансовой поддержки начинающим деятельность субъектам МСП за счет проведения мероприятий по:

- развитию деятельности центров «Мой бизнес» – 23,6 млн рублей;
- предоставлению грантов социальным предприятиям – 3,9 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 27,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 27,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансировано и освоено 23,6 млн рублей или 85,8 % от годовых назначений.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства (23,6 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

Заключено 36 контрактов или 100 % от плана на общую сумму 22,3 млн рублей. Средства в размере 1,3 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальные услуги, командировки, не контрактуются.

Проведены следующие мероприятия:

- обучающие мастер-классы (440 физ. лиц);
- обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» - «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства» (201 физическое лицо и 25 субъектов МСП);
- обучающие однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП», в которых приняли участие 164 физических лица и 24 субъекта МСП;

– оказаны консультационные услуги по вопросам начала ведения бизнеса, ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам, и другим актуальным направлениям 1 117 физическим лицам и 428 субъектам МСП;

– образовательные программы для детей 14-17 лет в районах Дагестана и олимпиады по основам предпринимательской деятельности получили 159 физических лиц, в олимпиаде приняли участие 1 750 физических лиц;

– оказаны услуги по составлению бизнес-планов (ТЭО) – 30 субъектам МСП; сертификации продукции – 16 субъектам МСП; популяризации продукции – 1 субъект МСП; финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП – 12 субъектам МСП; НХП – 28 субъектам МСП; электронно-информационные услуги – 19 субъектов МСП;

– проведен конкурс «100 лучших товаров и услуг» – 31 субъект МСП.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 20 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую сумму – 50,7 млн рублей.

Гарантийным фондом в 2022 году выдано 15 поручительств начинающим предпринимателям на сумму 27,4 млн рублей.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан объявлен конкурс (с 31 октября по 29 ноября 2022 года) на предоставление финансовой поддержки в виде грантов уникальным социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет (план – 8 субъектов МСП).

3) Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание комплексной системы акселерации за счет развития деятельности центров «Мой бизнес», оказания экспортной поддержки субъектам МСП.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (40,9 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (94,75 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 135,64 млн рублей (средства федерального бюджета – 134,28 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,36 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы и освоены средства в сумме 135,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан профинансированные средства перечислены подведомственным организациям (40,9 млн рублей):

– ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» – 5,81 млн рублей;

- АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП» – 13,72 млн рублей;

– Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан в целях реализации мероприятия «Развитие региональных гарантийных организаций» – 21,35 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 106 микрозайм на общую сумму 331,5 млн рублей.

– Гарантийному фонду Республики Дагестан – 94,75 млн рублей. В 2022 году выдано 155 поручительств на общую сумму 610, млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выданы 106 микрозаймов на общую сумму 331,5 млн рублей.

Заключено 38 контрактов, или 100 % от планового объема, на сумму 18,6 млн рублей. Предназначенная на командировочные выплаты и зарплаты сумма в 1,0 млн рублей не подлежит контрактации.

Проведены следующие мероприятия при участии «Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан»:

– обучение по программе «Развитие женского предпринимательства» – 120 женщин-предпринимателей;

– обучающие мероприятия – 52 субъекта МСП;

– скоринг – 30 субъектов МСП;

– маркетинговые услуги (создание логобуков) – 31 субъект МСП;

– маркетинговые услуги (фирменный стиль) – 30 субъектов МСП;

– электронно-информационные услуги – 52 субъектов МСП;

– сертификация продукции – 17 субъектов МСП;

– проведение экспресс оценки – 2 субъекта МСП;

– анализ потенциала малых и средних предприятий – 2 СМСП.

Общий объем финансирования мероприятий, реализуемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (3 мероприятия) составляет 94,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,95 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы и освоены средства в сумме 94,75 млн рублей, или 100 % от годовых назначений, в том числе по мероприятиям:

– предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (5 СПоК) – 44,3 млн рублей;

– софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 2,4 млн рублей.

– оказание поддержки фермерам в виде предоставления грантов по программе «Агростартап» (25 КФХ) – 48,1 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта предоставлены субсидии 15 СПоК из 7 районов республики. Заключены соглашения с 16 победителями конкурса по предоставлению грантов «Агростартап». Средства перечислены в полном объеме.



11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

*Руководители региональных
проектов:*



Халилов Н. Р.

Министр промышленности и торговли
Республики Дагестан



Хрюкин А. Р.

Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

10.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан)

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан).

В 2022 году финансирование национального проекта не предусмотрено.

1) Региональный проект «Промышленный экспорт»

По региональному проекту в 2022 году запланировано увеличение объема экспорта продукции машиностроения до 5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 23,0 млн долларов США. Северо-Кавказским таможенным управлением ФТС России данные по внешнеторговому обороту не опубликованы.

2) Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

В 2022 году было запланировано увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции до 28,5 млн дол. США.

Согласно дополнительному соглашению от 29 декабря 2020 года № 082-08-2020-461/2, заключенному между Министерством сельского хозяйства и Правительством Республики Дагестан, по региональному проекту предусматривалось финансирование в сумме 20,84 млн рублей на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям.

В дальнейшем, дополнительным соглашением от 12 января 2022 года № 082-2019-Т20050-1/9 индикаторы 2022 – 2023 годов были обнулены, в связи с чем софинансирование на реализацию регионального проекта не предусмотрено.

Экспорт продукции АПК в сопоставимых ценах составил 57,4 млн дол. США (письмо Минсельхоза России от 28 октября 2022 года № 12/4393), или 201,4 % от плана на 2022 год (28,5 млн дол. США).

3) Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В 2022 г. предусмотрено внедрение в Республике Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0» (РЭС 2.0) в целях достижения целевого показателя регионального проекта «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0»

В стадии разработки Проект постановления Правительства Республики Дагестан об утверждении обновленной редакция подпрограммы «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» сформированной с учетом требований Регионального экспортного стандарта 2.0.

На 1 ноября 2022 года Республикой Дагестан внедрены 6 инструментов РЭС 2.0 из 15 необходимых. Уровень внедрения составил 45,6 %.



12. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»



Куратор национального проекта:
Алиев Р.А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов



Ахмедов А.Ж.

Врио министра экономики и
территориального развития Республики
Дагестан

12.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются 2 региональных проекта:

- 1) «Системные меры по повышению производительности труда»;
- 2) «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».

Ответственным исполнителем национального проекта является Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета).

12.2. В 2022 году из 2 региональных проектов национального проекта предусмотрено финансирование регионального проекта *«Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях»*.

По состоянию на 1 ноября 2022 года на реализацию регионального проекта профинансированы и освоены 6,5 млн рублей, или 100,0 % от годовых назначений. Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года № 138⁷ средства перечислены на счета АО «Корпорация развития Дагестана».

Заключены 2 прямых договора, или 100 % от плана на сумму 6,5 млн рублей, в том числе:

- договор от 30.08.2022 г. № 10/22 на сумму 4,5 млн рублей с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» на оказание услуг по организации учебной производственной площадки «Фабрика процессов». Срок исполнения 31.12.2022 г. Площадка для создания «Фабрика процессов» предоставлена ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»;


- договор от 1.08.2022 г. № 09/22 на сумму 2,0 млн рублей с НО «Фонд Содействия Инновационному Развитию Ставропольского края» по привлечению экспертов Регионального центра компетенций Ставропольского края на АО «Концерн КЭМЗ». Срок исполнения 31.12.2022 г.

Экспертами Федерального центра компетенций (ФКЦ) определены два предприятия (АО «Аэропорт Махачкала» и ООО «Дагестан Стекло Тара»), участвующих в региональном проекте. Реализация мероприятий совместно с экспертами ФКЦ на ООО «Дагестан Стекло Тара» завершена. Экспертами ФКЦ обучено 14 сотрудников предприятия.

АО «Аэропорт Махачкала» предлагается для перевода на расширенную поддержку ФКЦ, включающую в себя годовой проект, вместо полугодового.

12.3. По *региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда»* с 28 июня по 19 июля 2022 года проведен сбор заявок на участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан». Определен победитель конкурса (токарь 5 разряда ОАО «Концерн КЭМЗ» Скляр Валерий Константинович).

⁷ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда»,



13. Национальный проект «Наука и университеты»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Бучаев Яхья Гамидович

Министр образования и науки Республики
Дагестан

Национальный проект «Наука и университеты» включает в себя 4 региональных проекта:

1) *«Развитие масштабных научных и нанотехнологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям («Исследовательское лидерство»);*

2) *«Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» («Инфраструктура»);*

3) *«Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» («Кадры»);*

4) *«Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» («Интеграция»).*

Мероприятия национального проекта «Наука и университеты» реализуются в Республике Дагестан в рамках федеральных проектов посредством участия в них вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской Академии наук через конкурсы и гранты.

Финансирование национального проекта в 2022 году не предусмотрено.

1) В целях реализации мероприятий **федерального проекта «Исследовательское лидерство»** в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации определены следующие направления в области развития медицины:

– «Фармлаб» (учебно-производственная аптека) – создание новых лекарственных форм, БАДов, косметических средств;

– «Нанотехнологии в медицине» – усовершенствование технологии покрытия медицинских изделий и приборов, разработка наноконструкций и наноматериалов медицинского назначения с внедрением в практику;

– «Предуниверсарий» (проект «Школа-Вуз») – вовлечение в научно-исследовательскую и проектную деятельность талантливых детей школьного возраста, а также создание возможности построения карьеры в области науки;

– «Генетика и охрана материнства» – подготовка специалистов для развития науки в области персонализированной медицины, расширение генетических исследований;

2) В рамках реализации мероприятий **федерального проекта «Инфраструктура»:**

– Дагестанским государственным медицинским университетом разработана стратегия деятельности Центра перспективного развития медицины и технологических инициатив по системе «ШКОЛА – ВУЗ – ПРАКТИКА»;

- Дагестанским федеральным исследовательским центром РАН проводятся мероприятия по созданию двух молодёжных лабораторий за счёт средств федерального бюджета (общий объём 13,2 млн рублей).

3) В рамках **федерального проекта «Кадры»** Дагестанский государственный медицинский университет направил заявку на участие в субсидиальной программе Министерства образования и науки Российской Федерации по поддержке деятельности студенческого научного общества.

4) В рамках **федерального проекта «Интеграция»** проводятся мероприятия в рамках соглашения о консорциуме вузов Северо-Кавказского федерального округа.

В 2022 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» также реализуются два новых федеральных проекта по стратегическим инициативам Правительства России в сфере образования и науки:

- федеральный проект **«Платформа университетского технологического предпринимательства»**, по итогам реализации которого до 2024 года 4,5 тыс. студентов получают поддержку своих стартапов, более 180 тыс. молодых ребят приобретут новые компетенции в сфере предпринимательства.

Дагестанский государственный университет стал победителем двух конкурсов, в результате чего на базе университета будет реализована акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов по новым технологиям рынка НТИ Технет.

Проект ДГУ по реализации акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив предполагает обучение до конца 2022 года около 500 студентов навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства и реализации студенческих стартапов, а также формирование собственных стартап-проектов студентов.

Реализация обоих проектов осуществляется во взаимодействии с экспертами Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Инжинирингового Центра «Цифровые платформы». Партнёрами вуза стали: АО Завод «Дагдизель», АО «Концерн КЭМЗ», АО «Завод имени Гаджиева», АО ДНИИ «ВОЛНА».

- федеральный проект **«Передовые инженерные школы»** направлен на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Предусмотрено создание 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями в 15 субъектах, а также повышение квалификации 28 000 преподавателей в высокотехнологичных компаниях.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 608 Республика Дагестан не вошла в состав регионов, которым предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных школ и прохождения практик и стажировок.



14. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Куратор национального проекта:



Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Мерданов Э.М.
Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

14.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется региональный проект *«Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан) («Туристическая инфраструктура (Республика Дагестан)»)*.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

В 2022 на реализацию регионального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» профинансированы и освоены 334,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 150,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,5 млн рублей, средства юридических лиц – 182,5 млн рублей), или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта заключено 10 соглашений, или 100 % от плана на общую сумму 342,1 млн рублей.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».

В целях реализации регионального проекта подписаны:

- Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан от 18 мая 2022 г. № 069-2022-11009-8;

- Соглашение с Федеральным агентством по туризму о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 174-09-2022-051.

Согласно указанным соглашениям будут созданы 102 номера в модульных некапитальных средствах размещения, 10 модульных некапитальных средств размещения, 363 койко-места в модульных некапитальных средствах размещения, 60 рабочих мест.

В 2022 году запланирована поддержка предпринимательских инициатив в виде предоставления грантов юридическим лицам.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2022 г. № 225 утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов, автокемпингов) и развитие инфраструктуры туризма.

В целях реализации мероприятий регионального проекта проведен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения.

По итогам конкурса определено 10 победителей, с которыми заключены соглашения в целях создания модульных некапитальных средств размещения на общую сумму 342 млн рублей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн рублей

№ п/п	ФИО, наименование заявителя	Сумма гранта	Общая стоимость проекта (млн рублей)	Размер собственных средств получателей	% участия
1	ИП Ашуров А.И.	15,0	43,3	28,1	65,0
2	ООО «Крепость»	15,0	31,87	16,87	53,0
3	ООО «Даг-Тур»	15,0	32,48	17,48	54,8
4	СПК «Агрофирма Сивух»	15,6	33,62	17,99	53,5
5	ООО «Рубас-1»	15,0	30,91	15,9	51,4
6	КФХ Магомедов Магомед Исаевич	15,0	32,50	17,5	53,8
7	ООО «Анжелина»	15,8	34,0	18,28	3,0
8	ООО «Цестрис Тревэл»	15,0	30,24	15,24	50,4
9	КФХ «Отдых»	15,0	31,84	16,84	53,0
10	ИП Гасанова Надежда Абдуллаевна	15,0	33,3	18,3	55,0

Проведенный анализ деятельности 10 победителей - получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан по данным ЕИС «Закупки» показал следующее:

1) ООО «Цестрис-Трэвел» заключен только один контракт от 26 октября 2020 года с ГБУ РД «Туристический центр Республики Дагестан», по оказанию услуг по подготовке, организации и проведению культурно массового мероприятия «Чайхана-2020», сумма контракта 700 тыс. рублей. Основной деятельностью общества предусмотрена деятельность туристических агентств.

Объект строительства: загородный модульный отель «ТукиТа-2000».

Уровень строительной готовности: подведено электричество, подготовлена площадка. Идет возведение каркасов и прокладывается водопровод. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец декабря 2022 года;

2) ООО «Крепость» с 2017 заключено 18 контрактов на общую сумму 43,9 млн рублей. По имеющейся информации, ранее заключались контракты по строительству блока санитарно-бытового назначения, строительным работам по устройству любых видов кровельных покрытий и зданий и сооружений и капитальному ремонту здания.

Объект строительства: туристическая база отдыха «Санда» в с. Гуниб, Гунибский район.

Уровень строительной готовности: проводятся работы по подведению к земельному участку водопровода и электроснабжения, монтажу станции очистки стоков, трансформаторной подстанции, электрогенератора. Монтаж приобретенных каркасных конструкций, облицовка фасадов, установка окон и наружных дверей, проведение отделочных и инженерных работ, подключение коммуникаций, установка мебели в помещения, а также по благоустройству прилегающего земельного участка, будут завершены до конца года;

3) ООО «Даг-Тур» на протяжении периода деятельности не заключались государственные контракты. Основным видом деятельности является деятельность туристических агентств. Численность персонала по состоянию на 1 октября 2022 года составляла 5 человек. На 1 января 2022 года на балансе организации отсутствовали статьи «Основные средств и «запасы». Отсутствие необходимого оборудования и других материальных ресурсов, количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения условий соглашений может свидетельствовать о наличии рисков по осуществлению фактических работ по созданию модульных некапитальных средств размещения.

Объект строительства: туристическая база отдыха «Чалда-Сафари» в с. Чалда, Гергебильский район.

Уровень строительной готовности: подготовлена площадка для установки домов, забетонирован фундамент и подведены коммуникации (электричество, вода). Каркасы модулей изготовлены и направлены из Республики Карелия. Конечная сборка, монтажно-отделочные мероприятия и сдача в эксплуатацию предполагается до 15 декабря.

4) СПК «Агрофирма Сивух», основной вид деятельности - выращивание однолетних культур.

Объект строительства: туристическая база «Альпийская деревня» в с. Старый Сивух, Гумбетовский район.

Уровень строительной готовности: подведены коммуникации: электричество, водовод, накопитель воды на 18 тонн, интернет GPON, дорога подъездная. Мебель для помещения в производстве, фасад и окна оплачены, свайные поля завершены на все дома. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец декабря;

5) ООО «Рубас-1», основной вид деятельности - предоставление мест для краткосрочного проживания.

Объект строительства: туристическая база отдыха «Рубас» в Дербентском район, побережье Каспийского моря, рядом с парком «Патриот». Площадь участка 10 га, 1 линия, протяженность участка по берегу 228 м.

Уровень строительной готовности: построены каркасы и залиты первые этажи всех 10 модулей. Завезены строительные материалы, оборудование и мебель. Подведены коммуникации (свет, вода, газ, канализация). Планируемый ввод в эксплуатацию – 10 декабря 2022 года;

6) ООО «Анжелина», основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Объект строительства: гостиничный комплекс «Анжелина» в с. Берикей, Дербентский район.

Уровень строительной готовности: подготовлена площадка, подведены коммуникации (электричество, вода). Модульные конструкции и мебель заказаны. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец декабря 2022 года;

7) КФХ «Отдых», основной вид деятельности - добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.

Объект строительства: гостиничный комплекс «Пляжный дом» в с. Авадан, Докузпаринский район.

Уровень строительной готовности: проведены земельные работы (подсыпка территорий 0,5 га), приобретена очистная станция, строительный материал, установлены сваи. Ввод в эксплуатацию запланирован на 20 декабря 2022 года;

8) ИП Гасанова Надежда Абдуллаевна, основной вид деятельности – торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах.

Объект строительства: отель-Усадьба «Иски (Старый) Мамрач» в с. Советское, Магарамкентский район.

Уровень строительной готовности: подведены к строительной площадке электричество, водовод. Подготовлена подъездная дорога. Подведён Интернет, мебель заказана. Благоустройство территории и ввод в эксплуатацию запланированы на конец декабря 2022 года;

9) КФХ Магомедов Магомед Исаевич, основной вид деятельности – разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Объект строительства: гостиничный комплекс «Горный ветер».

Уровень строительной готовности: подготовлены свайные основания, поставлены 10 модульных домиков. Проводится сборка конструкций. дальнейшим этапом запланировано подведение коммуникаций. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец декабря 2022 года.

10) ИП Ашуров А.И. Объект строительства: отель «МОРЕ» в г. Махачкала, Кировский район, Сулакское участковое лесничество, квартал 26, выдел 5, 9, 10.

Уровень строительной готовности: подготовлены бетонные площадки под установку домов. Подведена дорога, выровнен рельеф. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец декабря 2022 года.

Все вышеперечисленные получатели субсидий (за исключением ООО «Крепость») ранее не заключали государственные контракты (договоры) на строительство модульных некапитальных средств размещения.

Осуществление указанными организациями основного вида деятельности не связано с предметом получения субсидий. Отсутствия необходимого количества специалистов и иных работников для исполнения условий соглашений, может свидетельствовать о наличии рисков своевременного завершения строительных работ по созданию модульных некапитальных средств размещения.

15. Выводы

Проведенный мониторинг реализации национальных проектов по состоянию на 1 ноября 2022 года показал следующее:

15.1. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 31 422,0 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 25 279,3 млн рублей, или 80,5 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 804,0 млн рублей или 12,1 %;
- внебюджетных источников – 2 338,7 млн рублей, или 7,4 %

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и национального проекта «Наука и университеты» в 2022 году не предусмотрено.

15.2. На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 20 673,1 млн рублей, или 65,8 % от объема годовых назначений (31 422,0 млн рублей).

Освоено 16 158,4 млн рублей, или 78,2 % от объема финансирования и 51,4 % от объема годовых назначений на 2022 год (31 422,0 млн рублей). Причем из общей суммы кассовых расходов 27,5 % (4 442,7 млн рублей) не связаны с контрактными обязательствами и приходятся на выплаты на поддержку семей при рождении детей по национальному проекту «Демография».

Учитывая, что до конца года остается менее двух месяцев, сложившийся уровень освоения предусмотренных годовых назначений является крайне недостаточным (51,4 % от годовых назначений).

15.3. Темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований на протяжении предыдущих трех лет реализации национальных проектов в Республике Дагестан, оставались недостаточными для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий и достижения целевых показателей. Для сравнения: на 1 ноября 2021 года кассовое исполнение составляло 48,4 % от годовых назначений, на 1 ноября 2020 года – 52,3 %, на 1 ноября 2019 года – 49,5 %.

По результатам проведенного анализа реализации национальных проектов, Счетная палата Республики Дагестан полагает, что данная тенденция в 2022 году останется неизменной. Риски повторения ситуации предыдущих лет, связанной с неосвоением бюджетных средств, оцениваются как высокие⁸.

15.4. Несмотря на накопленный опыт, сложившаяся в Республике Дагестан система реализации национальных проектов до настоящего времени

⁸ Справочно: в 2019 году освоено 49,4 % от годовых назначений, в 2020 году – 77,1 %, в 2021 году – 71,8 %),

не обеспечивает эффективных управленческих решений, оперативность действий, а также минимизацию рисков освоения бюджетных ассигнований и достижения целевых показателей.

Главными распорядителями бюджетных средств не обеспечиваются должные меры по своевременному финансированию и освоению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов.

15.5. Проводимый Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг, позволил выявить комплекс проблем, характерных для процесса реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, которые являются основными причинами ежегодного неосвоения предусмотренных бюджетных ассигнований в полном объеме.

15.6. Продолжают иметь место недостатки при планировании расходных обязательств на финансирование мероприятий региональных проектов. Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за реализацию региональных проектов, до настоящего времени не завершена синхронизация государственных программ Республики Дагестан и паспортов региональных проектов на 2022 год в части уточнения объемов финансирования, актуализации мероприятий, корректировке целевых показателей, в том числе в соответствии с Законом Республики Дагестан от 29.12.2021 № 91 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

15.7. Негативное влияние на финансирование и освоение бюджетных средств оказывают проблемы, связанные с заключением контрактов (договоров) в рамках реализации национальных (региональных) проектов. Из запланированного 1 191 контракта (договора), заключены 1 103 контракта (договора) на общую сумму 24 147,0 млн рублей, или 92,6 % от планового объема (1 191 контрактов).

По 8 национальным проектам контракты заключены в полном объеме («Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Производительность труда и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)

По 2 национальным проектам уровень заключения контрактов составляет от 80 % до 100 % («Демография» – 82 %, «Жилье и городская среда» – 99 %).

По 1 нацпроекту («Здравоохранение») уровень заключения контрактов составил 80 %.

Не заключены 88 контрактов (договоров), из которых заключение 8 контрактов (договоров) запланировано на ноябрь 2022 года, 80 контрактов на декабрь 2022 года (договоры по программе «Земский доктор/фельдшер»).

По состоянию на 1 ноября 2022 года несоблюдение плановых сроков заключения контрактов связано с увеличением планового количества контрактов в связи с образовавшейся экономией, а также из-за длительных процедур заключения договоров по программе «Земский доктор/фельдшер».

Несмотря на неоднократные предостережения о необходимости своевременного заключения контрактов и недопустимости планирования большей части расходов на конец года, основной объем кассовых расходов по национальным проектам приходится на ноябрь – декабрь текущего года. При отсутствии должного контроля со стороны заказчиков за выполнением обязательств по заключенным контрактам, указанное значительно увеличило риски своевременного завершения мероприятий и освоения бюджетных средств.

15.8. В 2022 году продолжают иметь место случаи расторжения контрактов в связи с неисполнением контрагентами условий контрактов, например, несоответствие поставленного товара условиям контракта (национальный проект «Образование»), отказ поставки товаров, отсутствие у подрядчиков возможности исполнения контрактов (национальный проект «Здравоохранение», «Жилье и городская среда»), низкие темпы проведения работ (национальный проект «Жилье и городская среда»).

По отдельным национальным проектам, до настоящего времени не завершены работы по контрактам 2021 года, сроки завершения которых были перенесены на 2022 год (нацпроект «Здравоохранение», капитальный ремонт фельдшерско – акушерских пунктов, модернизация «Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» нацпроект «Образование», нацпроект «Демография», строительство объектов образования).

15.9. Следует отметить, что не всеми заказчиками соблюдается требование статьи 103 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о своевременном размещении информации об исполнении обязательств по контрактам, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

15.10. Проведенный Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг реализации национальных проектов показывает, что наряду с положительными результатами, в реализации отдельных национальных проектов продолжают оставаться проблемы и недостатки, которые не позволяют своевременно и в полном объеме выполнить запланированные в 2022 году мероприятия, а также обеспечить эффективное освоение бюджетных средств.

Национальный проект «Демография».

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году, как и предыдущие годы, возможны риски невыполнения плановых значений по количеству проведенных процедур ЭКО (выполнено 1 108 процедур, или 85,2 % от плана (1 300 процедур). Кроме этого, в 2022 году для выполнения процедур ЭКО осуществлен переход к использованию метода «криоперенос», который является менее затратным и более эффективным. Однако, в связи с удешевлением процедуры ЭКО, возможно неполное освоение предусмотренного объема финансирования данного результата (около 35 млн рублей) по итогам 2022 года.

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» из 58 объектов на 9 160 мест завершено строительство 40 объектов на 6 110 мест (16 детсадов на 1 410 мест и 24 детсадов (яслей) на 4 700 мест).

Продолжается строительство 17 объектов на 2 830 мест, из которых риски завершения работ до конца года существуют по 6 объектам на 1 260 мест с уровнем готовности от 37 % до 65,5 %, в том числе по:

- 1 детсад на 120 мест (в поселке Шамхал – Термен г. Махачкала (65 %);
- 5 детсадам (яслям) на 940 мест с уровнем строительной готовности от 40 % до 60,5 %, в том числе: детсад (ясли) на 250 мест в с. Тагиркент, Левашинского района (65,5 %); на 120 мест в с. Унцукуль Унцукульского района (57,1 %); на 250 мест в г. Дербент (45,4 %); на 120 мест в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») (40 %), на 200 мест в с. Куруш, Хасавюртовского района (37 %).

Кроме этого, имеются риски несвоевременного начала строительства детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест (7,3 млн рублей).

В рамках мероприятий по повышению эффективности службы занятости, не заключены 5 договоров (закупка мебели, оргтехники, формы одежды, системы видеонаблюдения, подключение к сети Интернет) на общую сумму 17,7 млн рублей в целях модернизации Центра занятости населения. Заключен контракт на ремонт помещения на сумму 7,35 млн рублей, определен победитель аукциона на закупку мебели. По остальным договорам подготовка документации для проведения торгов не завершена.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» в связи с поздними сроками заключения контрактов имеются риски своевременного завершения до конца года строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дербенте» с уровнем готовности 65,3 %, а также освоения бюджетных средств (164 млн рублей), предусмотренных на строительство «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в с. Эндирей Хасавюртовского района» (переходящий объект).

Национальный проект «Образование».

По национальному проекту «Образование» общее количество общеобразовательных организаций, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Современная школа», составляет 56 школ на 25 582 уч. места⁹, из которых **завершено строительство 11 школ на 3 868 уч. мест,**

В 2022 году запланировано строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 уч. мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 уч. мест, в том числе: 12 школ на 7 104 уч. мест (ФГУП «ГУСС»), 13 школ на 6 624 уч. мест (местные подрядчики).

Проведенный анализ показал, что из запланированных к вводу в 2022 году 25 школ на 13 728 ученических мест, риски завершения строительства имеют 22 школы на 11 882 ученических мест, в том числе:

– **ФГУП «ГУСС»** – 9 объектов образования на 5 258 уч. мест, в том числе 8 школ на 5 178 уч. мест в связи с низкой строительной готовностью (от 45,7 % до 84,0 %), а также школа на 80 уч. мест в с. Хебатли, Цунтинский район (26,6 %) в связи с затянувшимся строительством из-за труднодоступности объекта и корректировки проектно-сметной документации (планируется замена объекта строительства).

– **ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика - застройщика»** - 12 объектов на 5 820 ученических мест с объемом предусмотренных расходов в сумме 5 128,1 млн рублей, в связи с затянувшимися сроками разработки и утверждения проектной документации, а также получения положительного заключения государственной экспертизы;

– **МО ГО «город Дербент»** (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) – 1 школа на 804 места с предусмотренным объемом финансирования в сумме 613,09 тыс. рублей.

Таким образом, из запланированных к вводу в 2022 году 25 школ на 13 728 ученических мест обязательства по завершению строительства могут быть выполнены только по 3 школам, строительство которых осуществляет ФГУП «ГУСС» (на 502 уч. мест в п. Загородный, г.Махачкала; на 120 мест в с. Кванада Цумадинского района; на 1 224 мест в пос. Семендер г. Махачкалы).

Обязательства местных подрядчиков по завершению строительства 13 объектов на 6 624 ученических мест останутся неисполненными.

Также же существует риск освоения бюджетных средств в полном объеме (1 275,65 млн рублей) по 17 объектам образования на 5 256 мест, начало

⁹ информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

строительства которых предусмотрено местными подрядными организациями (заказчик ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности») в связи с отсутствием подготовленной проектно-сметной документации, а также из-за поздних сроков начала ведения работ.

В случае завершения разработки проектно-сметной документации, возможно авансирование строительства в пределах 50 % от объема заключенных контрактов с соответствующим кассовым исполнением в сумме 650,0 млн рублей, без фактического выполнения работ.

Проведенный анализ показал, что основными причинами длительных сроков проведения мероприятий по разработке проектно-сметной документации являются: задержка в своевременном предоставлении земельных участков муниципальными образованиями под строительство объектов с соответствующей разрешительной документацией; значительные упущения специалистов муниципальных образований при территориальном планировании; не проведение исследований пригодности выделенного земельного участка под строительство объектов; отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры в непосредственной близости от выделенного участка под строительство.

Следует также отметить, о наличии проблем в сопровождении реализации мероприятий по строительству объектов образования из-за большого количества исполнителей и раздробленности предусмотренного финансирования. Так, в 2022 году в рамках национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по 4 разным субсидиям, предоставленным Республике Дагестан в целях содействия создания новых мест в общеобразовательных учреждениях. Указанное затрудняет осуществление контроля за расходованием средств и выполнением показателей.

Кроме этого, участие в реализации мероприятий по строительству общеобразовательных организаций одновременно трех министерств (исполнители), курируемых разными вице-премьерами Республики Дагестан создает сложную систему управления и не позволяет оперативно управлять рисками его реализации.

Национальный проект «Здравоохранение».

По национальному проекту «Здравоохранение» с учетом практики предыдущих лет реализации мероприятий по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, следует отметить о наличии возможных рисков по мероприятиям регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», в ходе которого предусмотрены:

1) Капитальный ремонт 60 зданий медицинских организаций (153,2 млн рублей). Уровень готовности 60 объектов представлен следующим образом: по 30 объектам работы завершены; по 22 объектам от 50 до 99 %; по 8 объектам – от 5 до 45 %.

По 5 объектам капитального ремонта с уровнем готовности от 15 % до 30 %: здания ГБУ РД «Поликлиника № 9» г. Махачкала (30 %), ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» (20 %), и фельдшерско-акушерский пункт ГБУ РД «Рутульская ЦРБ» с. Куфа (25 %), ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ» с. Эндирей (5 %), ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», Цумадинский район, с. Нижние Хваршины (10 %) имеются риски своевременного завершения работ.

Из 19 контрактов 2022 года со сроком исполнения на 30 августа 2022 года, завершены работы только по 3 по контрактам: ФАП в ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ», ФАП в ГБУ РД «Курахская ЦРБ» в с. Укуз, ФАП в ГБУ РД «Курахская ЦРБ» в с. Квардал.

Также не завершены работы по капитальному ремонту фельдшерско-акушерских пунктов по контрактам 2021 года, перенесенным на 2022 год. Контракты на строительство 18 ФАП заключены в сентябре – ноябре 2022 года со сроком исполнения 31 декабря 2022 года.

2) Реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных подразделений (5 объектов). По 4 объектам быстровозводимых модульных конструкций работы завершены, уровень готовности составляет 100 % (врачебная амбулатория ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с. Верхний Дженгутай, врачебная амбулатория ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», с. Калининаул; врачебная амбулатория ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», с. Харбук, ГБУ РД «Поликлиника №7» г. Махачкала).

По строительству (реконструкции) здания участковой больницы ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ» в с. Чиркей, готовность составляет 28 % (проводятся кровельные работы), что свидетельствует о возможных рисках своевременного завершения.

3) Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (6 объектов). Заключено 15 контрактов на общую сумму 1 021,1 млн рублей (из них 6 контрактов 2021 года на сумму 259,6 млн рублей и 8 контрактов 2022 года на общую сумму 691,9 млн рублей).

Завершены работы по 1 врачебной амбулатории и 27 фельдшерско-акушерских пунктам (ФАП). Из оставшихся 24 (ФАП) уровень готовности составляет на 6 объектах от 50 % до 95 % и на 18 объектах от 5 % до 49 %.

По 2 поликлиникам в г. Махачкале (ГБУ РД «Детская поликлиника № 3» и «Поликлиника № 8»), которые являются переходящими с 2021 года, уровень готовности составляет 35 % (лимит 2022 года 632,6 млн рублей, срок завершения – декабрь 2022 года).

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, сроки начала работ потребуют принятия дополнительных мер и усиления контроля в целях обеспечения своевременного исполнения обязательств по контрактам. В то же

время, по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», ежегодно не обеспечивается освоение бюджетных средств в полном объеме в виду нарушения исполнения обязательств по контрактам. Так, до настоящего времени не исполнены в полном объеме обязательства по государственному контракту № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, заключенному с ООО «Национальный центр информатизации» на выполнение мероприятий по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан». На 1 ноября 2022 года по данному контракту исполнены обязательства на сумму 97,0 млн рублей, или 77,8 % от суммы остатка за 2021 год (124,7 млн рублей).

Национальный проект «Культура».

По национальному проекту «Культура» запланировано проведение работ по капитальному ремонту 14 объектов культуры.

По состоянию на 1 ноября 2022 года из 12 Домов культуры техническая готовность составляет: по 5 объектам – 100 %, по 3 объектам – от 95 % до 99%, по 3 объектам – от 56 % до 94,0 %, по 1 объекту – 55 %. Плановый срок завершения работ по всем объектам – 1 декабря 2022 г.

В виду низких темпов строительных работ имеются риски завершения работ по капитальному ремонту Дома культуры в с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район (55,0 %).

В 2022 году, согласно ранее заключенным контрактам, запланировано завершение строительства следующих объектов:

– Дом танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект с 2020 года) – 444,8 млн рублей, техническая готовность которого на 1 ноября 2022 года составляет 70,0 %. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию: 30.12.2023 г. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 2324-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с ростом цен на строительные ресурсы выделены дополнительные средства в объеме 85,42 млн рублей. Общий объем средств по объекту на 2022 год составил 444,8 млн рублей (вместо ранее предусмотренных – 359,4 млн рублей);

– Центр культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан (переходящий объект с 2021 года) – 73,6 млн рублей, техническая готовность которого на 1 ноября 2022 года составляет 10 %. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 декабря 2023 года. В связи с низкими темпами проведения строительных работ частично перенесены на 2023 год ранее предусмотренные на 2022 год средства в сумме 60,6 млн рублей. Общий объем лимитов по объекту

на 2022 год составил 73,6 млн рублей, вместо ранее предусмотренных – 134,2 млн рублей;

– благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляре Республики Дагестан – строительная готовность – 0 %. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 декабря 2023 года. В целях снижения риска неосвоения частично перенесены на 2023 год предусмотренные на 2022 год средства в сумме 35,3 млн рублей. Общий объем средств по объекту на 2022 год составил 40,4 млн рублей, вместо ранее предусмотренных – 75,7 млн рублей.

Сроки ввода в эксплуатацию Дома танца ансамбля «Лезгинка» г. Махачкала и Центра культурного развития в городе Кизляр установлены на февраль 2023 года.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основные риски реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сосредоточены на мероприятиях, связанных со строительством и реконструкцией объектов дорожной сети.

По состоянию на 1 ноября 2022 года по региональному проекту «Дорожная сеть» остаются неисполненными:

– контракт МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала» с ООО «Спецремстроймонтаж» № 3054100850422000009 от 26 апреля 2022 года ремонт улицы Докузпаринская в г. Махачкала (срок исполнения – 30 сентября 2022 г). Кассовое исполнение по контракту составляет 107,5 млн рублей, или 70,6 % от его стоимости (152,3 млн рублей);

– контракт МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Город «ДЕРБЕНТ» с ООО «Строительно-монтажное управление-55» от 2 декабря 2020 года № 3054201850520000094 на выполнение работ по ремонту улицы Кобякова – Нанейшвили (срок исполнения работ – 2 июня 2022 года). Стоимость исполненных подрядчиком по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 129,8 млн рублей (117,3 млн рублей с учетом НДС (20 %)). Кассовое исполнение составило 52,3 млн рублей, или 42,3 % от годовых назначений (120,9 млн рублей).

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В 2022 году в рамках национального проекта (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») проводятся работы по благоустройству 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий (1 098,0 млн рублей), а также благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина города Буйнакск (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 93,5 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября 2022 года из 47 муниципальных образований средства на реализацию мероприятий регионального проекта не профинансированы МО «Хивский район».

По 46 муниципальным образованиям кассовое исполнение составляет 833,7 млн рублей, или 92,0 % от объема финансирования (906,6 млн рублей).

По 28 муниципальным образованиям обеспечено полное освоение годовых назначений, по 17 муниципальным образованиям уровень кассового освоения профинансированных средств составляет от 62 % до 99,96 %.

Низкие темпы освоения профинансированных объемов (менее 50 %) наблюдаются в МО «Дахадаевский район», МО «Казбековский район», МО «Чародинский район».

Завершены работы на 164 территориях (из них: 113 общественных и 51 дворовых) или 92% от общего числа территорий. Не завершены работы в городе Махачкала (3 общественные и 11 дворовых территорий с технической готовностью от 60 % до 85 %) и городе Хасавюрт (1 общественная территория с технической готовностью 90 %).

По объекту «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) г. Буйнакск» профинансировано 115,6 млн рублей, или 93,0 % от годовых назначений (124,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 56,9 млн рублей, или 45,8 % от годовых назначений. Готовность объекта составляет около 75%.

По региональному проекту «Чистая вода» из 7 объектов строительства и реконструкции (срок завершения – 2022 год) завершена работа по 2 объектам (реконструкция систем водоснабжения в городе Кизляре, строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского района)

По 3 объектам работы продолжаются в соответствии с графиком ведения работ. По 2 объектам 2022 года: «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» (уровень готовности 20 %, подрядчик ООО «Арт-строй»), «Водоснабжение городского округа город Южно-Сухокумск, Республика Дагестан» (отсутствие заключенного контракта) имеются риски завершения строительных работ в 2022 году.

Следует отметить, что по данным объектам выявлена необходимость корректировки проектной документации в связи с обнаружением недостатков проектов, влияющих на эксплуатационные характеристики, работоспособность и долговечность отдельных элементов (конструкций) объектов.

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан проводится согласование вопроса о перераспределении средств, предусмотренных на строительство данных объектов в сумме 302,3 млн рублей, на строительство объекта «Реконструкция и

восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск Республики Дагестан. Строительство водовода Чиркей-Буйнакск».

Национальный проект «Экология».

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех муниципалитетах республики, также может вызвать риски реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Кроме этого, имеются риски достижения целевых показателей к концу года из-за отсутствия мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан, в связи с чем необходима их корректировка.

В рамках национального проекта запланированы мероприятия по строительству 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов. 13 сентября 2022 г. на площадке IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в г. Москва состоялось подписание трёх концессионных Соглашений между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор». Объем инвестиций составит около 13 млрд. рублей. Комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В 2022 году на реализацию данных мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 60,8 млн рублей (средства республиканского бюджета). По состоянию на 1 ноября 2022 года финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.

Национальный проект «Цифровая экономика».

По мероприятию «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов» проводится работа по заключению договоров на оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов (СЗО) непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты СЗО. При этом, в бюджете организаций средства на указанные цели отсутствуют. Договоры на оказание услуг заключены по 1 363 объектам СЗО из 1732.

Контракт на проведение проектно-изыскательских работ с ПАО «Ростелеком» от 15 марта 2022 года № CERF-01 на сумму 70,41 млн рублей по 1 344 школам (1 994 помещений), срок исполнения – 30 октября 2022 г. Оплачено по контракту 67,84 млн рублей. По результату приемки работ по контракту № CERF-01 образовалась экономия в объёме 2,57 млн рублей (включена в сумму контракта № CERF-03). По состоянию на 1 ноября 2022 года подготовлены и приняты технические паспорта на 1 310 школ, или 97,5 % от плана (1 344 школ). По остальным 34 школам проектно-изыскательские работы не завершены.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

По национальному проекту по состоянию на 1 ноября 2022 года профинансированы и освоены расходы в размере 334,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Средства перечислены на счета 10 контрагентов.

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» проведен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения. Определены 10 победителей, с которыми заключены соглашения на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения. Срок исполнения до 31 декабря 2022 года.

Следует отметить, что вышеперечисленные получатели субсидий (за исключением ООО «Крепость») ранее не заключали государственные контракты (договоры) по строительству модульных некапитальных средств размещения (данные из открытых источников).

Осуществление указанными организациями основного вида деятельности несвязанного с предметом получения субсидий, отсутствие необходимого количества специалистов и иных работников для исполнения условий соглашений, могут свидетельствовать о наличии рисков своевременного завершения строительных работ по созданию модульных некапитальных средств размещения.

15.11. Проведенный мониторинг реализации национальных проектов показал, что из 13 национальных проектов по 4 национальным проектам существуют высокие риски своевременного завершения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения целевых показателей («Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура»). В данном случае, необходимо повысить оперативность контроля за соблюдением промежуточных результатов реализации мероприятий региональных проектов, и принять корректирующие меры в целях достижения плановых результатов.

По 6 национальным проектам («Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Безопасные и качественные автомобильные дороги») риски своевременного освоения бюджетных средств и достижения целевых показателей оцениваются как умеренные.

По 3 национальным проектам «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Наука и университеты» риски реализации отсутствуют.

16. Предложения

По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

- провести детальный анализ причин неисполнения мероприятий национальных проектов и низкого уровня освоения бюджетных средств, в том числе оценить риски выполнения мероприятий до конца 2022 года;

- принять меры, направленные на своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- с учетом фактического исполнения, подготовить предложения по уточнению показателей региональных проектов и государственных программ;

- обеспечить ежедневный контроль за финансированием и освоением, предусмотренных годовых назначений и выполнением мероприятий национальных (региональных) проектов;

- завершить мероприятия по заключению контрактов и принять меры по исполнению принятых контрактных обязательств с применением всего спектра претензионных мер за неисполнение или недобросовестное исполнение;

- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы по объектам, начало строительства которых планируется в 2022 году;

- усилить контроль за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов и вводом их в эксплуатацию в установленные сроки;

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов.

- повысить качество управления реализацией мероприятий национальных (региональных) проектов и оперативно применять корректирующие действия при несоблюдении промежуточных и конечных сроков реализации мероприятий;

- обеспечить прозрачность и достоверность информации о финансировании и освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов.

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить возможные риски реализации национальных (региональных) проектов.

Приложение на 5 листах.

**Счетная палата
Республики Дагестан**
