



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(за 2021 год)**

МАХАЧКАЛА 2021

Содержание

1.	Общие положения	4
2.	Национальный проект «Демография»	11
2.1	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	16
2.2	Региональный проект «Содействие занятости»	17
2.3	Региональный проект «Старшее поколение»	25
2.4	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»	27
2.5	Региональный проект «Спорт – норма жизни»	28
3.	Национальный проект «Здравоохранение»	30
3.1	Региональный проект «Первично медико-санитарная помощь»	42
3.2	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	45
3.3	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» ...	48
3.4	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	50
3.5	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	52
3.6	Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения»	56
3.7	Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»	63
4.	Национальный проект Образование»	64
4.1	Региональный проект «Современная школа»	67
4.2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	74
4.3	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	77
4.4	Региональный проект «Социальная активность»	78
4.5	Региональный проект «Молодые профессионалы»	80
4.6	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	81
5.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	83
5.1	Региональный проект «Жилье»	87
5.2	Региональный проект «Комфортная городская среда в Республике Дагестан».....	88
5.3	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	91
5.4	Региональный проект «Чистая вода»	93

6.	Национальный проект «Экология»	96
6.1	Региональный проект «Чистая страна»	99
6.2	Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО»	100
6.3	Региональный проект «Сохранение лесов»	102
7.	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	105
7.1	Региональный проект «Дорожная сеть»	108
7.2	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	114
7.3	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	116
8.	Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	117
8.1	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»	121
8.2	Региональный проект «Информационная инфраструктура»	122
8.3	Региональный проект «Информационная безопасность»	124
8.4	Региональный проект «Цифровые технологии»	126
8.5	Региональный проект «Цифровое государственное управление»	127
9.	Национальный проект «Культура»	129
9.1	Региональный проект «Культурная среда»	132
9.2	Региональный проект «Творческие люди»	135
9.3	Региональный проект «Цифровая культура»	138
10.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	139
10.1	Региональный проект «Поддержка самозанятых»	142
10.2	Региональный проект «Предакселерация»	145
10.3	Региональный проект «Акселерации субъектов МСП».....	147
11.	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	150
11.1	Региональный проект «Промышленный экспорт».....	152
11.2	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	153
11.3.	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».....	154
12.	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»	155
12.1	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	157
13.	Наука	158
14.	Выводы	160
15.	Предложения	169
	Приложения	170

1. Общие положения.

1. Счетной палатой Республики Дагестан (далее – Счетная палата) в целях выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации перед контрольно-счетными органами, и в соответствии с поручением Главы Республики Дагестан с 2019 года проводится мониторинг реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан.

В соответствии с постановлением Коллегии Счетной палаты от 10 апреля 2019 года № 17 проведение мониторинга национальных (региональных) проектов закреплено за аудиторами Счетной палаты и установлена персональная ответственность за качество, полноту и своевременность представления информации о достижении целевых индикаторов и национальных целей.

2. Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов осуществляется по двум направлениям: текущий контроль и проведение контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных (региональных) проектов.

3. Счетной палатой в адрес Главы Республики Дагестан, Народного Собрания Республики Дагестан, Правительства Республики Дагестан, Счетной палаты Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан, Прокуратуры Республики Дагестан, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу, Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, Отделение - Национальный банк по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Совета Безопасности Республики Дагестан, Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан ежемесячно направлялась информация о результатах мониторинга реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан.

Материалы о ходе мониторинга национальных (региональных) проектов размещаются на официальном сайте Счетной палаты.

4. Республика Дагестан участвует в реализации 12 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука и университеты».

Финансирование национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука и университеты» не предусматривалось.

В реализации национальных проектов задействовано 17 министерств и ведомств Республики Дагестан.

В рамках национальных проектов в 2021 году реализовывались 45 региональных проектов, из которых финансирование мероприятий осуществлено по 29 региональным проектам.

5. На финансовое обеспечение 10 национальных проектов в 2021 году были предусмотрены средства в сумме 23 787,3 млн рублей, в том числе за счет средств:


- федерального бюджета – 18 799,5 млн рублей, или 79,0 % от общего объема утвержденных назначений;

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 046,4 млн рублей, или 12,8 % от общего объема годовых назначений;

- иных источников - 1 941,4 млн рублей (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 512,4 млн рублей, средства Федерального фонда социального страхования – 83,5 млн рублей, муниципальных образований – 121,9 млн рублей, иных источников – 223,6 млн рублей, или 8,2 % от общего объема годовых назначений.

Финансирование национальных проектов в 2021 году

млн рублей

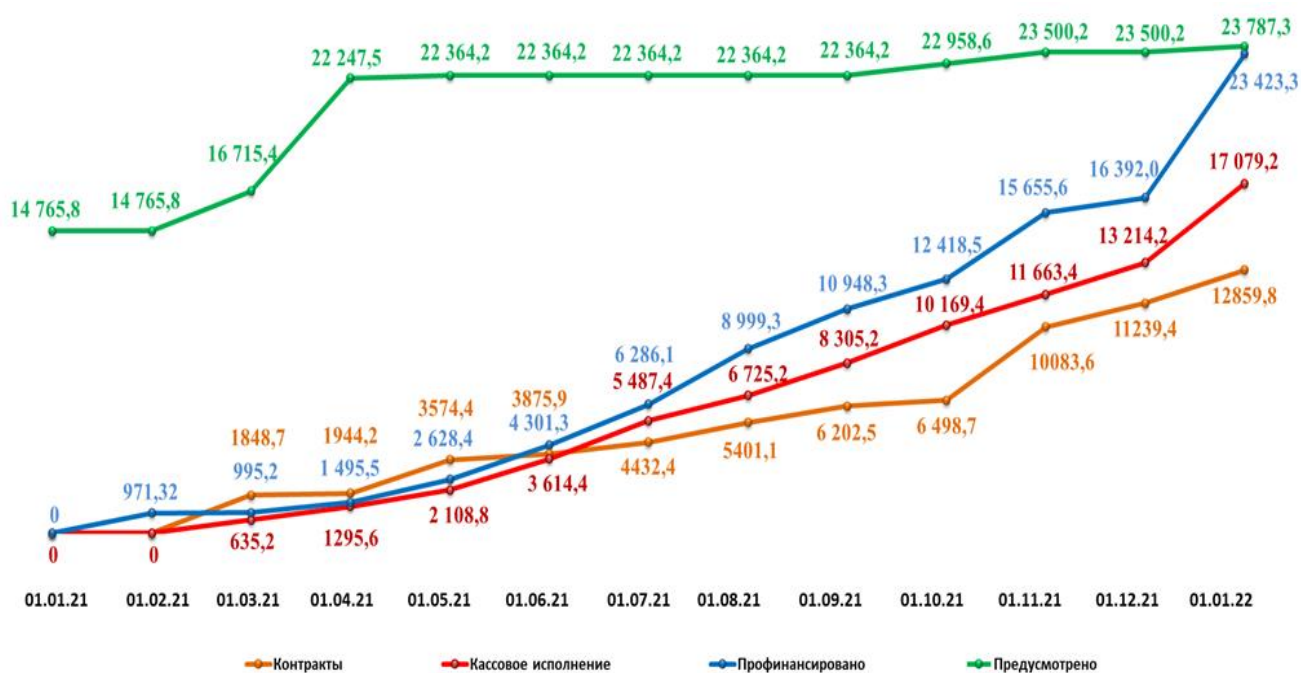

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В общем объеме бюджетных ассигнований (23 787,3 млн рублей) наибольший объем расходов был предусмотрен на реализацию мероприятий национальных проектов «Демография» – 7 812,6 млн рублей, или 32,8 %, «Образование» - 7 866,3 млн рублей, или 33,1 %, «Здравоохранение» – 2 816,8 млн рублей, или 11,8 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 2 687,0 млн рублей, или 11,3 %.

6. За 2021 год на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 23 423,3 млн рублей, или 98,5 % от годовых назначений (23 787,3 млн рублей).

Из общей суммы средств (23 423,3 млн рублей), профинансированных в 2021 году на реализацию национальных (региональных) проектов, фактически освоено 17 079,2 млн рублей, или 71,8 %.

Кассовое исполнение реализации мероприятий национальных проектов в 2021 году

млн рублей



По национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» (32,5 млн рублей), «Экология» (35,5 млн рублей) и «Малое и среднее предпринимательство» (215,7 млн рублей) профинансированные средства освоены в полном объеме.

По трем национальным проектам («Жилье и городская среда» – 1 781,0 млн рублей (98,1 %), «Цифровая экономика» - 34,9 млн рублей (96,7 %), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 540,0 млн рублей (94,7 %), освоение составляет от 94 % и более.

По национальному проекту «Здравоохранение» (2 479,3 млн рублей) освоение составляет 88,0 %, по национальному проекту «Культура» (416,7 млн рублей) – 88,8 %.

Низкий уровень освоения сложился по национальным проектам «Демография» - 81,0 % (6 329,8 млн рублей) и «Образование» – 41,0 % (3 214,4 млн рублей), которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан в виду необходимости обеспечения строительства объектов образования.

На протяжении 2021 года темпы освоения бюджетных средств оценивались как недостаточные для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов). Уровень кассового освоения в 2021 году (71,8 %) практически не изменился (+ 1,0 %) по сравнению с 2020 годом (70,8 %).

Министерства и ведомства, ответственные за реализацию национальных проектов, не приняли исчерпывающих мер по своевременному и эффективному освоению профинансированных бюджетных ассигнований. В результате, в 2021 году в ходе реализации национальных проектов в Республике Дагестан не освоены 6 708,1 млн рублей или 28,2 % от годовых назначений (23 787,3 млн рублей), выделенные на реализацию 7 национальных проектов:

- «Демография» - 1 482,7 млн рублей, или 19 % от объема финансирования (7 812,6 млн рублей);

- «Образование» - 4 652,0 млн рублей, или 61,8 % от объема финансирования (7 521,7 млн рублей), и 59,0 % от объема годовых назначений (7 866,3 млн рублей);

- «Здравоохранение» - 337,5 млн рублей, или 12,0 % от объема финансирования (2 816,8 млн рублей);

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 147,5 млн рублей, или 5,5 % от объема финансирования (2 682,0 млн рублей);

- «Культура» - 52,7 млн рублей, или 11,2 % от объема финансирования (469,5 млн рублей);

- «Жилье и городская среда» - 34,4 млн рублей, или 1,9 % от объема финансирования (1 800,9 млн рублей).


- национальный проект «Цифровая экономика» - 1,2 млн рублей, или 3,3 % от объема годовых назначений (36,1 млн рублей), за счет экономии средств.

7. В целях реализации национальных проектов в 2021 году заключено 600 контрактов (договоров) на общую сумму 12 859,8 млн рублей, или 99,3 % от планового объема (604 контрактов).

С учетом контрактов, заключенных в 2020 году и переходящих на 2021 год, общая сумма законтрактованных средств в 2021 году, а также контрактов, заключенных на подготовку проектно-сметной документации в целях реализации национального проекта «Экология» (66,1 млн рублей не включены в финансирование национального проекта) общая сумма законтрактованных средств в 2021 году составляла 20 068,6 млн рублей.

Не заключены 4 контракта по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2021 году

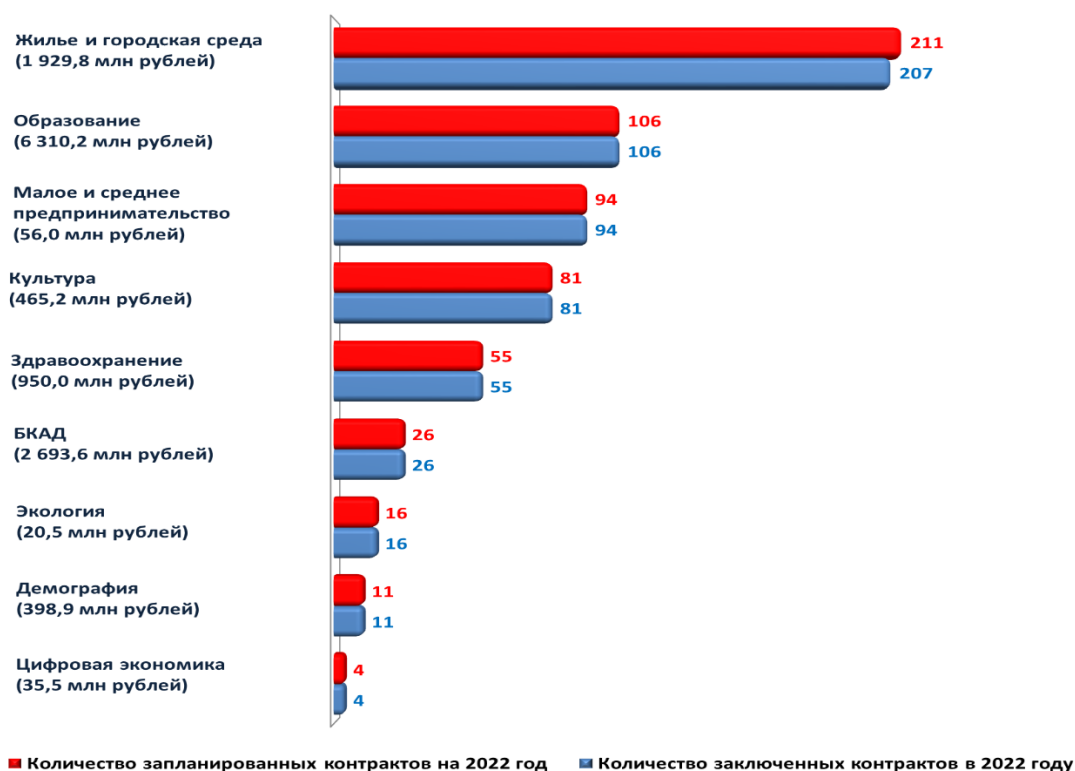

Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за реализацию национальных (региональных) проектов, не исполнены своевременно поручения данные Председателем Правительства Республики Дагестан в части принятия мер по своевременному заключению контрактов на выполнение мероприятий региональных проектов.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Информация о реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан за 2021 год представлена в следующей таблице.

млн рублей

Национальные (региональные) проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено за 2021 год		Остатки средств на 1 января 2022 года	
			Сумма	%	Сумма	%
ВСЕГО	23 787,33	23 423,33	17 079,2	71,8	6 708,09	28,12
НП «ДЕМОГРАФИЯ»	7 812,55	7 812,55	6 329,80	81,0	1 482,75	18,98
1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	4 898,35	4 898,35	4 898,02	100,0	0,33	0,01
2. «Содействие занятости»	2 818,42	2 818,42	1 336,15	47,4	1 482,27	52,59
3. «Старшее поколение»	0,048	0,048	0,048	100,0	0,0	0,0
4. «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. «Спорт – норма жизни»	95,73	95,73	95,58	99,8	0,15	0,16
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»	2 816,79	2 816,79	2 479,26	88,0	337,53	11,98
1. «Первичная медико-санитарная помощь»	140,16	140,16	140,16	100,0	0,0	0,0
2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	195,47	195,47	195,47	100,0	0,0	0,0
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»	1 694,47	1 694,47	1 691,42	99,8	3,05	0,18
4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	83,50	83,50	83,50	100,0	0,0	0,0
5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»	703,19	703,19	368,71	52,4	334,48	47,57
7. «Развитие экспорта медицинских услуг»	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	7 866,25	7 521,69	3 214,35	40,9	4 651,90	58,90
1. «Современная школа»	7 232,06	6 887,50	2 600,61	35,96	4 631,45	63,86
2. «Успех каждого ребенка»	526,56	526,56	506,11	96,12	20,45	2,80
3. «Патриотическое воспитание»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. «Цифровая образовательная среда»	11,70	11,70	11,70	100,0	0,0	0,0
5. «Молодые профессионалы»	89,84	89,84	89,84	100,0	0,0	0,0
6. «Социальная активность»	6,09	6,09	6,09	100,0	0,0	0,0
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»	1 815,44	1 800,93	1 781,00	98,1	34,44	1,90
1. «Жилье»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»	1 003,46	1 003,46	1 003,46	100,0	0,0	0,0
3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	86,95	72,44	52,63	60,5	34,32	39,5
4. «Чистая вода»	725,03	725,03	724,91	100,0	0,12	0,02

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Национальные (региональные) проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено за 2021 год		Остатки средств на 1 января 2022 года	
			Сумма	%	Сумма	%
НП «ЭКОЛОГИЯ»	35,52	35,52	35,52	100,0	0,00	0,00
1. «Чистая страна»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. «Комплексная система обращения с ТКО»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. «Сохранение уникальных водных объектов»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. «Сохранение лесов»	35,52	35,52	35,52	100,0	0,0	0,0
НП «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»	2 686,96	2 682,03	2 539,40	94,7	147,5	5,49
1. «Дорожная сеть»	2 469,23	2 469,23	2 327,7	94,3	141,53	5,73
2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	217,73	212,80	211,70	99,5	6,0	2,77
3. «Безопасность дорожного движения»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"	36,1	36,1	34,9	96,7	1,2	3,27
1. «Кадры для цифровой экономики»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. «Информационная инфраструктура»	31,1	31,1	29,9	96,2	1,2	3,8
3. «Информационная безопасность»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. «Цифровые технологии»	5,0	5,0	5,0	100,0	0,0	0,0
5. «Цифровое государственное управление»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП «КУЛЬТУРА»	469,49	469,49	416,75	88,8	52,74	11,23
1. «Культурная среда»	437,76	437,76	385,02	87,95	52,74	12,05
2. «Творческие люди»	29,53	29,53	29,53	100,0	0,0	0,0
3. «Цифровая культура»	2,20	2,20	2,20	100,0	0,0	0,0
НП «МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»	215,75	215,75	215,75	100,0	0,0	0,0
1. «Поддержка самозанятых»	9,58	9,58	9,58	100,0	0,0	0,0
2. «Предакселерация»	24,37	24,37	24,37	100,0	0,0	0,0
3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	181,80	181,80	181,80	100,0	0,0	0,0
НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»	32,48	32,48	32,48	100,0	0,0	0,0
1. «Промышленный экспорт»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. «Экспорт продукции АПК»	32,48	32,48	32,48	100,0	0,0	0,0
3. «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. «Системные меры по повышению производительности труда»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. «Адресная поддержка повышения труда на предприятиях»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НП «НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



2. Национальный проект «Демография»



Куратор национального проекта:
Казиев М. Н.

Врио заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Мугутдинова И. М.
Врио министра труда и
социального развития
Республики Дагестан



Беляева Т. В.
Врио министра
здравоохранения
Республики Дагестан



Сажидов С. Х.
Врио министра по
физической культуре и
спорту Республики
Дагестан



Азизов М. А
Начальник управления
Правительства Республики
Дагестан по капитальному
строительству



Бучаев Я. Г.
Врио министра
образования и науки
Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Демография» в Российской Федерации являются:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- финансовая поддержка семей при рождении детей;
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей;
- разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются 5 региональных проектов, в том числе:


- 1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- 2) «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»);
- 3) «Содействие занятости»;
- 4) «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»);
- 5) «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт-норма жизни»).

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2021 году задействованы 5 министерств и ведомств Республики Дагестан:

- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;
- Министерство образования и науки Республики Дагестан;
- Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству;
- Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
- Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

Финансирование национального проекта
«Демография» в 2021 году

млн рублей

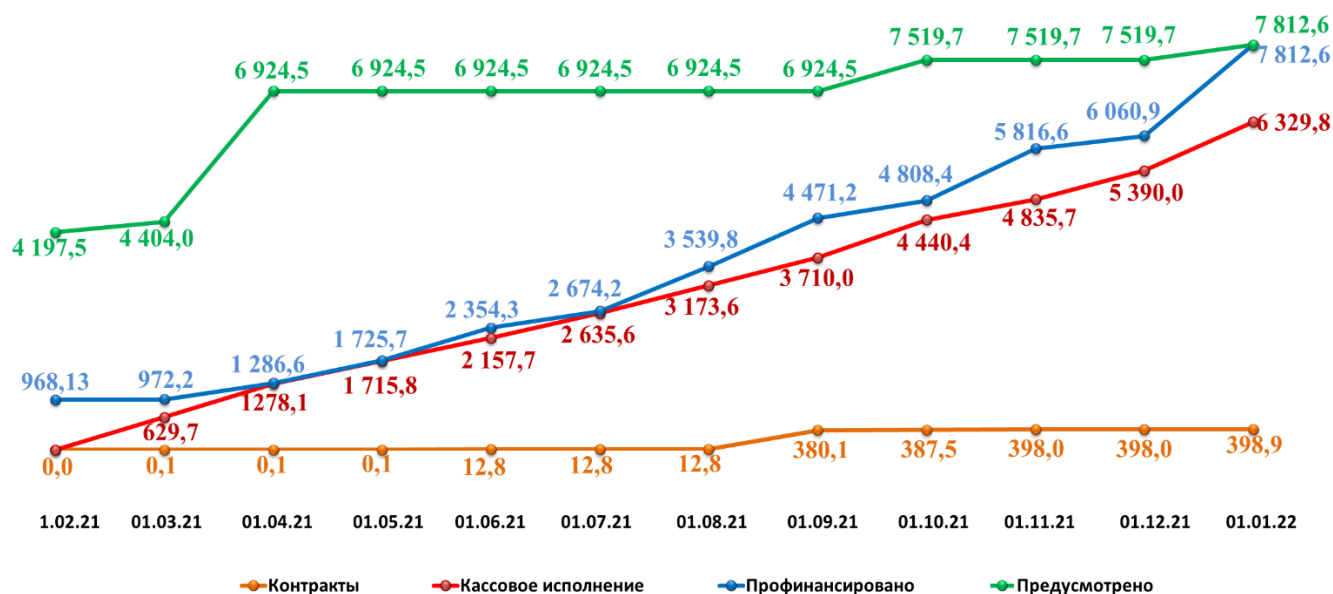

В 2021 году на реализацию национального проекта «Демография» профинансированы расходы в сумме 7 812,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (в том числе: за счет федерального бюджета – 7 240,7 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 448,8 млн рублей, внебюджетных средств (ТФОМС) – 123,0 млн рублей).

На 1 января 2022 года освоение выделенных средств составило 6 329,8 млн рублей, или 81,0 % от годовых назначений (7 812,6 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 1 482,7 млн рублей, или 19,0 % от объема годовых назначений.

Информация об освоении средств, выделенных на реализацию региональных проектов национального проекта «Демография» на территории Республики Дагестан представлена в следующей таблице.

Региональные проекты	Профинансировано	Освоено		Остатки средств на 1 января 2022 года	
		Сумма	%	Сумма	%
«ДЕМОГРАФИЯ», всего	7 812,60	6 329,8	81,0	1 482,75	19,0
1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	4 898,35	4 898,02	99,9	0,33	0,01
2. «Содействие занятости»	2 818,42	1 336,15	47,4	1 482,3	52,6
3. «Старшее поколение»	0,048	0,048	100	0	0
4. «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»	0	0	0	0	0
5. «Спорт – норма жизни»	95,73	95,58	99,8	0,15	0,16

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В ходе реализации национального проекта заключено 11 контрактов по 3 региональным проектам на общую сумму 399,0 млн рублей, или 100 % от планового объема.

С учетом контрактов по строительству объектов дошкольного образования на общую сумму 2 484,2 млн рублей и контракта по строительству футбольного поля в селении Ансалта Ботлихского района на сумму 31,0 млн рублей, заключенным в 2020 году и переходящим на 2021 год, общая сумма законтрактованных бюджетных средств по национальному проекту «Демография» составила 2 914,0 млн рублей.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий национального проекта «Демография» представлено в следующей таблице.

Нац проект	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
Демография	Поддержка семей при рождении детей	Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, тыс. семей	45,0	48,53	107,8
Демография	Содействие занятости	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %.	66,43	52,02	78,3
		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году, возрастающий, тысяча мест	9,1	0,91	10,0
Демография	Старшее поколение	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	16,5	23,5	142,4
		Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	25,2	35,7	141,7
		Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	64,7	65,4	101,1
		Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, возрастающий, %	11	10,08	91,6
		Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, вакцинацией против пневмококковой инфекции, проц.	95	100	105,2
Демография	Укрепление общественного здоровья	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого спирта	1,0	0,24	416,6
		Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий, процент	6,5	6,4	101,5
Демография	Спорт – норма жизни	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, возрастающий, процент	54,1	54,1	100
		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	52	52	100



2.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 году было предусмотрено обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей за счет предоставления ежемесячных выплат 24,14 тыс. семей в связи с рождением первого ребенка (3 838,89 млн рублей) и проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (1,6 тыс. циклов) семьям, страдающим бесплодием (166,08 млн рублей).

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и социального развития Республики Дагестан и Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы 4 898,35 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 4 775,35 млн рублей, средства ТФОМС – 123,0 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено средств в сумме 4 898,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Неосвоенный остаток составил 0,33 млн рублей, или 0,01 % от объема годовых назначений.

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

В ходе реализации регионального проекта ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 48,53 тыс. семей (нарастающим итогом с начала реализации национального проекта – 2019 год), в том числе в 2021 году – 12,39 тыс. новых получателей, или 107,8 % от планового объема (45,0 тыс. семей) на общую сумму 4 775,35 млн рублей.

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования обеспечено выполнение 1 290 процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием (123,0 млн рублей), или 108,4 % от плана (1 190 процедур). Следует отметить, что возобновившийся рост распространения новой коронавирусной инфекции привел к снижению

планового значения на 2021 год с 1 600 процедур до 1 190 процедур.

Целевой показатель регионального проекта «Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» выполнен на 107,8 % (план – 45,0 тыс. семей, факт – 48,3 тыс. семей).

В тоже время, в Республике Дагестан наблюдается устойчивое снижение рождаемости в среднем более, чем на 2 тыс. человек ежегодно. По оперативным данным, количество рожденных за 11 месяцев 2021 года (40 364 чел) на 6 687 чел. или 14,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (47 051 чел).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан данная тенденция сохранится и в последующие годы, что связано с вступлением в репродуктивный возраст граждан, родившихся на этапе демографического спада в 90-е годы (период экономического кризиса), а также с сохранением высокого уровня миграции населения репродуктивного возраста.

Предоставляемые в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», выплаты семьям при рождении первого ребенка в Республике Дагестан не являются определяющим условием увеличения рождаемости детей, что свидетельствует о несбалансированности мероприятий и показателей проекта.

Финансовая поддержка в рамках проекта оказывается с учетом критериев нуждаемости, что значительно сужает количество получателей поддержки.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**

- расширить виды оказываемой помощи при рождении детей;
- активизировать работу медицинских организаций районов и городов республики по обеспечению доступности процедуры ЭКО, а также рассмотреть вопрос открытия отделений ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» в частных медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам.



2.2. Региональный проект «Содействие занятости»

По региональному проекту «Содействие занятости» в 2021 году было предусмотрено обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на уровне 66,43 % за счет дополнительно созданных 9,1 тыс. мест в дошкольных организациях в ходе проведения следующих мероприятий:

- создание 1 950 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (незавершенное строительство 2020 года) - 317,58 млн рублей;
- создание на 7 150 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет - 2 500,8 млн рублей;
- создание не менее 15 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования;
- повышение квалификации 1,5 тыс. специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в негосударственном секторе дошкольного образования.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан и Управлением Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству.

С целью ускорения строительства объектов, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р, строительство объектов дошкольного образования передано ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «ГВСУ № 4»).

В 2021 году на реализацию 2 мероприятий по строительству объектов дошкольного образования осуществлено финансирование на сумму 2 818,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 1 336,1 млн рублей, или 47,4 % от годовых назначений (2 818,4 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 1 482,3 млн рублей, или 52,6 % от объема годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета – 1 230,2 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 252,0 млн рублей).

В целях реализации мероприятий регионального проекта в 2021 году заключено 5 контрактов на общую сумму 334,2 млн рублей, или 100 % от годового объема. С учетом остатков 2020 года в сумме 2 484,2 млн рублей, общая сумма законтрактованных средств по региональному проекту составляет 2 818,4 млн рублей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Всего в ходе регионального проекта предусмотрено строительство 58 объектов дошкольного образования на 9 100 мест, уровень строительной готовности которых на 1 января 2022 года представлен следующим образом:

Перечень детских садов по региональному проекту «Содействие занятости»

№	Детские сады	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	млн рублей	
				% строительной готовности	
1	Детсад г. Каспийск МКР № 10	100	73,26	Получена лицензия на образовательную деятельность	
2	Детсад в г. Буйнакск, улица Али-Клыча, 86	60	62,93	Получена лицензия на образовательную деятельность	
3	Детсад в г. Хасавюрт, ул. 40 лет Октября	120	101,08	Получена лицензия на образовательную деятельность	
4	Детсад в с. Кульзеб, Кизилюртовский район	60	75,08	Получена лицензия на образовательную деятельность	
5	Детсад в с. Араблинское Дербентский район	100	94,86	Получена лицензия на образовательную деятельность	
6	Детсад в п. Ленинаул Казбековский район	100	94,12	Получена лицензия на образовательную деятельность	
7	Детсад в с. Магарамкент Магарамкентский район	60	66,05	Получена лицензия на образовательную деятельность	
8	Детсад в г. Махачкала, МКР "Ак-Гель"	250	195,33	Получена лицензия на образовательную деятельность	
9	Детсад в г. Дербент	60	63,07	Получена лицензия на образовательную деятельность	
10	Детсад в с. Учкент Кумторкалинский район	100	95,70	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию	
11	Детсад в г. Кизляр	100	98,88	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию	
12	Детсад в с. Новые Викри, Каякентский район	120	125,0	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию	
13	Детсад в с. Эндирей Хасавюртовский район	120	107,95	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию	
14	Детсад в г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 32	60	75,50	Получено заключение о соответствии	
15	Детсад в г. Махачкала, ул. Фонвизина	60	75,36	99,08	
16	Детсад в г. Избербаш	100	116,33	98,89	
17	Детсад в с. Хамамятурт, Бабаюртовский район	100	95,19	85,37	
18	Детсад в с. Тинди Цумадинский район	60	69,26	80,4	
19	Детсад в с. Миарсо, Ботлихский район	100	95,15	74,15	
20	Детсад в п. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	107,65	52,2	
Итого		1 950	1 887,75		

Проведенный анализ показал, что из 20 детских садов **завершено строительство 14 детсадов на 1 410 мест, в том числе:**

- 9 объектов на 910 мест переданы в государственную собственность и получена лицензия на осуществление образовательной деятельности;

- по 4 объектам на 240 мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию (детские сады: на 100 мест в селении Учкент Кумторкалинского района, на 100 мест в г. Кизляре (ул. Кочубея), на 120 мест в селении Новые Викри Каякентского района, на 120 мест в селении Эндирей Хасавюртовского района;

- по 1 объекту на 60 мест получено заключение о соответствии (г. Махачкала (ул. Азиза Алиева).

Не завершено строительство 6 объектов на 540 мест с уровнем готовности:

- по 2 объектам на 160 мест - 99 % (детсад на 100 мест в г. Избербаше, ул. Кураева, 30 (98,9 %), на 60 мест в г. Махачкала, ул. Фонвизина (99,1 %).

- по 3 объектам на 260 мест - от 74,2 % до 85,4 % (детсады на 100 мест в селении Миарсо Ботлихского района - 74,2 %, на 60 мест в селении Тинди Цумадинского района - 80,4 %, на 100 мест в селении Хамаматюрт Бабаюртовского района – 85,4 %);

- по 1 объекту на 120 мест в г. Махачкале в поселке Шамхал-Термен – 52,2 %. Строительно -монтажные работы подрядчиком приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации (разночтения в разделах документации по разделам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также отсутствуют (просрочены) технические условия на газ, электричество, воду).

2) *Строительство и ввод эксплуатацию 38 детских садов (с вводом в эксплуатацию в 2021 году 37 садов на 7 150 мест):*

На реализацию мероприятия в 2021 году профинансированы средства в сумме 2 500,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2 172,0 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 328,8 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года, фактически освоено 1 227,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 066,0 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 161,2 млн рублей), или 49,0 % от годовых назначений (2 500,8 млн рублей).

Не использованный (не освоенный) остаток составил 1 273,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 106,0 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 167,6 млн рублей), или 37,8 % от объема финансирования.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень детских садов - яслей, запланированных построить в ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости»

млн. рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	% строит. готовности
1	Детсад (ясли) в г. Махачкала (МКР «ДОСААФ»)	200	167,33	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
2	Детсад (ясли) в г. Махачкала (пос. Сулак)	200	164,74	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
3	Детсад (ясли) в с. Доргели, Карабудахкентский район	200	173,22	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
4	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР №3)	250	191,99	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
5	Детсад (ясли) в г. Махачкала (пос. Богатыревка)	200	166,6	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
6	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР № 11)	250	205,0	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
7	Детсад (ясли) в с. Сиртыч, Табасаранский район	60	66,89	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
8	Детсад (ясли) в с. Буртунай, Казбековский район	60	67,07	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
9	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР «Кемпинг»)	250	202,9	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
10	Детсад (ясли) в г. Кизляр	250	211,75	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
11	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР № 10)	250	211,7	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
12	Детсад (ясли) в г. Махачкала, пос. Н.Хушет, МКР № 3	250	209,44	Получено заключение о соответствии
13	Детсад (ясли), с. Карабудахкент, Карабудахкентский район	250	190,64	Получено заключение о соответствии
14	Детсад (ясли) в с. Баршамай, Кайтагский район	120	112,35	Получено заключение о соответствии
15	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район	120	112,32	Получено заключение о соответствии
16	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	178,25	Получено заключение о соответствии
17	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР «Новый»)	250	194,2	100
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакск (ул. Шихова, 120-б)	250	197,1	96,83
19	Детсад (ясли) в г. Махачкала (МКР «Ипподром»)	200	174,71	96,06
20	Детсад (ясли) в с. Нечаевка, Кизилюртовский район	200	171,85	94,15
21	Детсад (ясли) в г. Хасавюрт (МКР «Мичурино»)	200	173,98	93,80
22	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух, Буйнакский район	120	102,60	89,31

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	% строит. готовности
23	Детсад (ясли) в г. Буйнакск (МКР «Молодежный»)	250	195,14	87,07
24	Детсад (ясли) в с. Эрпели, Буйнакский район,	120	102,18	83,95
25	Детсад (ясли) в г. Избербаш (ул. Морская, 2)	250	196,64	82,34
26	Детсад (ясли) в с. Мюрего, Сергокалинский район	120	102,96	81,43
27	Детсад (ясли) в г. Дербент	200	165,49	77,68
28	Детсад (ясли) в с. Джанга, Карабудахкентский район	120	106,86	77,06
29	<i>Детсад (ясли) в с. Каякент, Каякентский район (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	250	193,82	72,80
30	<i>Детсад (ясли) в с. Ботаюрт, Хасавюртовский район, (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	120	102,62	62,08
31	<i>Детсад (ясли) в г. Избербаш (ул. Российская, 15) (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	250	193,78	54,28
32	<i>Детсад (ясли) в с. Тагиркент Левашинский район (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	250	195,50	48,30
33	<i>Детсад (ясли) в с. Унцукуль, Унцукульский район (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	120	101,87	40,88
34	<i>Детсад (ясли) в г. Дербент (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	250	188,44	40,84
35	<i>Детсад (ясли) в с. Тарумовка (ул. Кирова, 21), лимит на 2021 год, (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	200	163,26	15,45
36	<i>Детсад (ясли) с. Куруш, Хасавюртовского района, (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	200	163,18	7,56
37	<i>Детсад (ясли) в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский»), (срок ввода перенесен на 2022 год)</i>	120	97,63	6,31
38	Детсад (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай (начало строительства – 2022 год, лимит на 2022 год - 57,29 млн рублей).			
	Всего	7 150	5 916,0	

Проведенный анализ показал, что из 38 детских садов (яслей) на 7 530 мест на 1 января 2022 года **завершено строительство 17 детсадов (ясли) на 3 360 мест**, в том числе по:

- 11 детсадам (ясли) на 2 170 мест получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе 2 объекта на 400 мест завершены в 2020 году);
- 4 детсадам (ясли) на 590 мест получено заключение о соответствии;
- 2 детсадам (ясли) на 500 мест (пос. Новый Хушет, г. Махачкала на 250 мест, МКР «Новый» в г. Кизилюрт на 250 мест) строительные работы завершены;

По **20 незавершенным объектам на 4 060 мест** уровень строительной готовности составляет от 6,31 % до 96,8 %, в том числе по:

- 4 детсадам (ясли) на 850 мест от 93,8 % до 96,8 %;
- 8 детсадам (ясли) на 1 430 мест от 73,0 % до 89,0 %
- 5 детсадам (ясли) на 990 мест от 41,0 % до 62,0 %;
- 3 детсадам (ясли) на 520 мест от 6,31 % до 15,5 %;

По **1 детсаду (ясли)** в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района начало строительства запланировано в 2022 году.

Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по состоянию на 1 января 2022 года из 58 объектов:

- по **29 объектам** получены разрешения на ввод в эксплуатацию и заключение о соответствии объекта (в том числе по 9 объектам получена лицензия на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования)
 - по **2 детсадам (ясли) на 500 мест** строительные работы завершены;
 - **продолжается строительство 26 объектов** (из них завершается 6 объектов с уровнем готовности от 93,8 % до 99,0 %);
 - планируется **начало строительства 1 объекта в 2022 году.**

В течение 2021 года ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», в виду несоблюдения графика ведения строительных работ, ежемесячно отодвигались планируемые сроки получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

С учетом сложившейся ситуации, по данным ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», по 28 объектам на 4 830 мест (6 детсадов и 22 детсада (ясли)¹) получение разрешения на ввод в эксплуатацию перенесено на 1 августа 2022 года.

Согласно дополнительному индикативному соглашению от 27 декабря 2021 года № 149-2019-Р2005-1/10 в 2021 году вместо изначально запланированных 7 150 мест количество плановых мест уменьшено до 5 390 мест.

¹ в том числе по 2 детсадам (ясли) на 500 мест строительные работы, по которым завершены (в МКР «Новый Хушет» в г. Махачкале на 250 мест, МКР «Новый» в г. Кизилюрт на 250 мест)

3) По результатам реализации **мероприятия по созданию не менее 15 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования**, создано 83 группы дошкольного образования, что в 5,5 раз больше планового объема (15 групп);

4) В целях реализации **мероприятия по повышению квалификации руководителей (специалистов) частных организаций**, осуществляющих обеспечение реализации программ дошкольного образования в негосударственном секторе, на базе ГБОУ ДПО «Дагестанского института развития образования» (на кафедре дошкольного образования) прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения 965 специалиста, или всего 64,3 % от плана (1,5 тыс. человек).

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1.	«Содействие занятости»	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %.	66,43	52,02	78,3
		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году, возрастающий, тысяча мест	9,1	0,91	10,0

По региональному проекту в 2021 году было предусмотрено достижение 2 целевых показателей, плановые значения которых по состоянию на 1 января 2022 года не выполнены.

По проведенного мониторинга следует отметить, В 2021 году существующие темпы строительства и освоения средств по объектам, которые должны были быть завершены в 2021 году были недостаточны для своевременного завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

По информации ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» неосвоение предусмотренных лимитов также связано с низкой исполнительской дисциплиной ФГУП «ГВСУ № 4» по представлению актов по формам КС-2 и КС-3, а также отсутствием исполнительно-технической документации, без которой технический заказчик (РУЗКС Минобороны России) при имеющемся достаточном «физическом» объеме выполненных работ не уполномочен осуществлять приемку работ. Следствием указанного является ситуация, когда на объектах, при наличии достаточных объемов выполненных работ, заказчику не могут быть предъявлены к оплате акты выполненных работ и, соответственно, кассовые расходы не осуществляются.

На своевременность расчетов по выполненным объемам работ оказывает влияние привлечение нескольких субподрядных организаций-операторов,

которые в свою очередь привлекали субподрядные организации для строительства объектов. Кроме этого, имело место затягивание подрядными организациями представления документов на оплату по объектам высокой готовности, или завершённым строительством объектам, обусловленное решением Правительства Российской Федерации о компенсации удорожания стоимости строительных материалов (при этом компенсации подлежат невыполненные объёмы работ).

Проектно-сметная документация по многим объектам была разработана ещё в 2019 году, на основании заданий на проектирование, подготовленных муниципальными образованиями с многочисленными недоработками, что в свою очередь привело к необходимости внесения изменений и уточнений.

Указанные недостатки значительно повлияли на реализацию регионального проекта, в частности мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены не в полном объёме, плановые значения целевых показателей не достигнуты.

С учетом практики строительства объектов дошкольного образования в Республике Дагестан, сложившейся в ходе реализации национального проекта «Демография» в 2019 – 2020 годах, сроки строительства по одному объекту составляют от 6 месяцев до 1,18 месяцев в зависимости от его мощности (количество мест). Таким образом, строительство и ввод объекта в течение одного года не представляется возможным.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств;
- с целью завершения строительства объектов в установленные сроки, подрядчику разработать график производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с учетом сроков сдачи объекта, согласовать график с заказчиком и ускорить темпы строительства;
- заказчику обеспечить строгий контроль за своевременностью выполнения строительных работ в соответствии с утвержденным графиком;
- заказчику совместно с подрядчиком установить оборудование и камеры видео-фото фиксации на объектах строительства, с целью мониторинга строительства объекта в режиме реального времени.
- подрядчику обеспечить качественное выполнение всего цикла строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
- органам исполнительной власти и муниципальных образований Республики Дагестан, уполномоченных по надзору за ходом строительства и вводу в эксплуатацию объектов строительства, обеспечить контроль за ходом строительства и приемки в эксплуатацию завершённых объектов строительства.



2.3. Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2021 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий:

- вакцинация против пневмококковой инфекции 95 % процентов лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания – 0,048 млн рублей (средства федерального бюджета);
- охват диспансерным наблюдением по поводу заболеваний и патологических состояний 64,7 % лиц старше трудоспособного возраста;
- оказание помощи по профилю «гериатрия» не менее 650 пациентам;

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта профинансировано и освоено 0,048 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключен контракт на сумму 0,048 млн рублей по закупке вакцины против пневмококковой инфекции. Поставлена вакцина в количестве 22 доз.

Министерством здравоохранения Республики Дагестан приказом от 22.12.2020 г. № 1113-Л на 2021 год утвержден контингент лиц, подлежащих вакцинации против пневмококковой инфекции (104 человека). Вакцинация проведена 105 гражданам старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, или 100 % от планового объема.

Открыты 4 гериатрических кабинета в ГБУ РД «Кизлярская центральная районная больница», ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», ГБУ РД «Ахвахская ЦРБ», ГБУ «Ногайская ЦРБ».

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по предварительным данным медицинских организаций охвачено 141 377 граждан старше трудоспособного возраста.

На базе ФГБОУ ВПО «Дагестанского Государственного Медицинского Университета» прошли повышение квалификации 3 врача, профессиональную переподготовку 2 врача и 10 специалистов среднего медицинского персонала по профилю «гериатрия».

На гериатрических койках пролечено 927 человек, или 23,5 ул. ед. на 10 тысяч населения соответствующего возраста.

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию охвачено 141,3 тыс. граждан старше трудоспособного возраста (35,7 %), при этом доля лиц данной категории, у которых выявлены заболевания и патология, находящиеся под диспансерным наблюдением, составила 65,4 %.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Старшее поколение	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	16,5	23,5	142,4
2		Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	25,2	35,7	141,7
3		Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	64,7	65,4	101,1
4		Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, вакцинацией против пневмококковой инфекции, проц.	95	100	105,2
5		«Доля граждан, старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, возрастающий»	11	10,1	91,6

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены. Однако, не достигнуто плановое значение по целевому показателю «Доля граждан, старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста - факт 10,08 % (план - 11 %).

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. № 442², Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, рассмотрев предложение Министерства труда и социальной защиты Республики Дагестан (письмо от 31 августа 2021 года) уменьшило плановое значения показателя на 2021 год с 19,6 % до 11 %. Тем не менее, в виду ограничительных мер, введенных в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, достижение указанного показателя в 2021 году, не обеспечено.

При определении данного показателя как «возрастающий», базовое значение показателя – 19,6 % меньше планового значения целевого показателя (11 %) и свидетельствует об отрицательной динамике его достижения.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает

- проводить работу по привлечению негосударственных организаций социального обслуживания в реестр поставщиков социальных услуг Республики Дагестан;

- усилить контроль за деятельностью организаций социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги лицам, старше трудоспособного возраста и инвалидам.

² «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставление социального обслуживания носит добровольный и заявительный характер»;



2.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья») предусмотрены разработка и внедрение:

- муниципальных программ общественного здоровья;
- корпоративных программ укрепления здоровья.

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В 2020 году создан и функционирует Центр общественного здоровья (постановление Правительства Республики Дагестан от 30.10.2020 г. № 234).

По результатам анализа распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний выявлены группы риска в разрезе каждого муниципального образования. Исходя из результатов, в 2021 году разработаны и реализуются 11 муниципальных программ общественного здоровья в следующих муниципальных образованиях: Бабаюртовский район, Бежтинский участок, Каякентский район, Кайтагский район, Курахский район, Ногайский район, Табасаранский район, Хивский район, Чародинский район, город Избербаш, город Дагестанские Огни.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 26 февраля 2021 года № 366-Л разработана корпоративная программа укрепления здоровья работников на рабочих местах.

Корпоративная программа укрепления здоровья работников на рабочих местах внедряется в 10 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Дагестан.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Укрепление общественного здоровья	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	1,1	0,24	416,6
2		Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий, процент	6,5	6,4	101,5

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает: внести изменения в показатель «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения» с учетом значительного превышения достигнутых результатов.



2.5. Региональный проект «Спорт- норма жизни»

В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2021 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 50,5 %, а также доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет до 52 %, за счет проведения следующих мероприятий:

- закупка спортивной экипировки для спортивных организаций по подготовке спортивного резерва – 13,62 млн рублей;
- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (установка в 5 муниципальных районах 5 малых спортивных площадок (ГТО) - 10,79 млн рублей;
- приобретение 2 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа 40,4 млн рублей.

Реализацию указанных мероприятий регионального проекта с общим объемом годовых назначений в сумме 64,81 млн рублей (средства федерального бюджета – 63,6 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,19 млн рублей) осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

В 2021 году также запланировано завершение строительства футбольного поля в селении Ансалта Ботлихского района (незавершенное строительство 2020 года). Готовность объекта на 1 января 2021 года составляла 75 %.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 26.02.2021 года № 30 «Вопросы Управления Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству», строительство футбольного поля в селении Ансалта Ботлихского района передано Управлению Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству.

На реализацию регионального проекта профинансированы средства в сумме 95,7 млн рублей, или 100,0 % от годовых назначений.

Освоено 95,6 млн рублей, или 99,8 % от годовых назначений (95,7 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 0,15 млн рублей, или 0,2 % от объема годовых назначений, и образован за счет экономии по торгам на закупку спортивно-технологического оборудования (ФОКОТ).

В ходе реализации регионального проекта Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан заключены 5 контрактов, или 100 % от планового объема на сумму 64,64 млн рублей, по которым осуществлена поставка:

- спортивной экипировки на сумму 12,74 млн рублей;

- спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок на сумму 10,8 млн рублей;

- комплектов спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТы) (г. Дербент, ул. С. Дрожжина и Ахвахский район, с. Карата) на общую сумму 30,08 млн рублей.

Управлением Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству на завершение строительства футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в с. Ансалта Ботлихского района Республики Дагестан. Профинансированы 30,9 млн рублей. Строительство футбольного поля завершено. Однако, объект не введен в эксплуатацию в установленные сроки (31 октября 2021 года). В связи с некачественно проведенными строительными работами на объекте, в настоящее время проводятся работы по устранению недостатков. Сроки ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 25 марта 2022 года.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Спорт – норма жизни	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, возрастающий, процент	54,1	54,1	100
2		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	52	52	100

Мероприятия, обеспеченные финансированием по региональному проекту не выполнены в полном объеме, однако целевые показатели достигнуты. Указанное свидетельствует о том, что обеспеченные финансированием мероприятия регионального проекта не взаимосвязаны с целевыми показателями реализации регионального проекта.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата Республики Дагестан предлагает:**

- обеспечить устранение недостатков и своевременный ввод в эксплуатацию футбольного поля в с. Ансалта Ботлихского района до 25 марта 2022 года);

- в план мероприятий по реализации регионального проекта включить кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительных комплексов и центров тестирования.



3. Национальный проект «Здравоохранение»



Куратор национального проекта:

Казиев Мурад Низамиевич

Врио заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан.

Руководитель региональных проектов:



Беляева Т. В.

Врио министра здравоохранения
Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Здравоохранение» в Российской Федерации являются:

- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

- увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год).


В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 7 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Первичная медико-санитарная помощь»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- 5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
- 6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), «Цифровой контур здравоохранения»»;
- 7) «Развитие экспорта медицинских услуг».

Ответственным за реализацию национального проекта «Здравоохранение» является Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Финансирование национального проекта
«Здравоохранение» в 2021 году

млн рублей

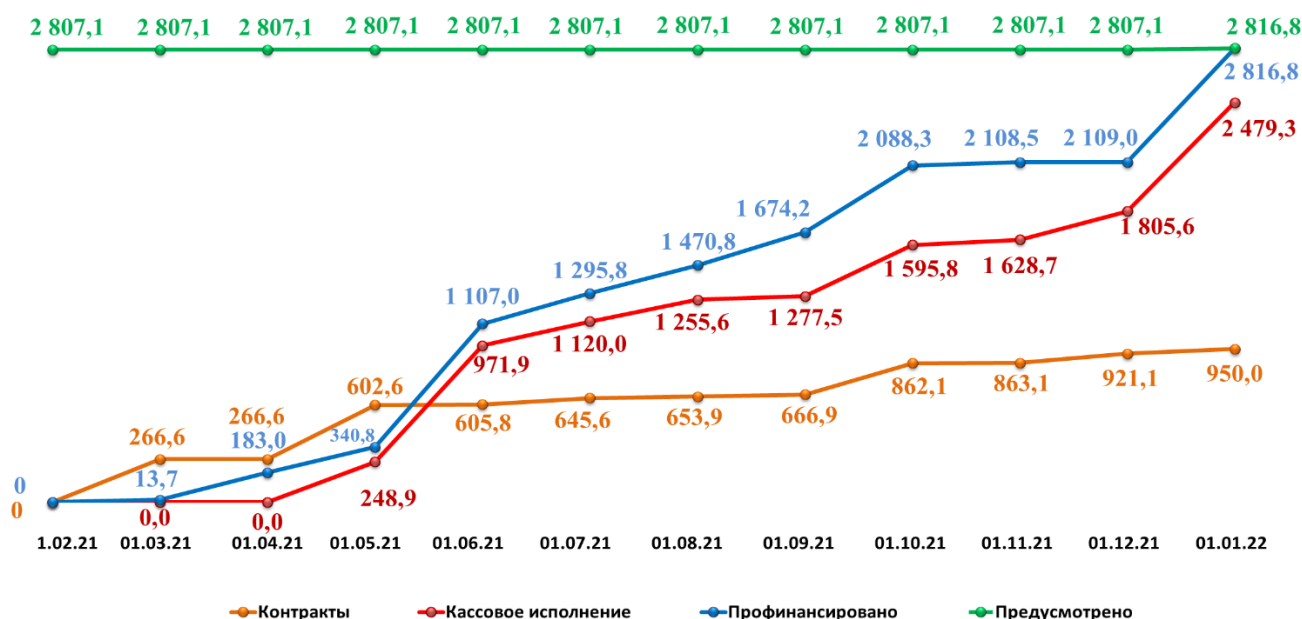

В 2021 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» профинансированы расходы в сумме 2 816,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений, в том числе:

- средства федерального бюджета - 999,1 млн рублей (в том числе: 176,5 млн рублей неиспользованный остаток средств по контрактам 2020 года);
- средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 130 млн рублей (в том числе: 1,75 млн рублей неиспользованный остаток средств по контрактам 2020 года);
- внебюджетные источники (средства ТФОМС, ФСС, медицинских организаций)³ - 1 687,7 млн рублей.

На 1 января 2022 года освоено 2 479,3 млн рублей, или 88,0 % от годовых назначений. Неиспользованный остаток составил 337,5 млн рублей или 12,0 % от годовых назначений (2 816,7 млн рублей), в том числе по региональным проектам:

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 3,1 млн рублей, или 0,2 % от объема годовых назначений (1 694,5 млн рублей);
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 334,5 млн рублей или 47,6 % от объема годовых назначений (703,2 млн рублей).

³ в том числе средства ТФОМС – 1 389,4 млн рублей, средства Федерального фонда социального страхования (родовые сертификаты) – 83,5 млн рублей, средства медицинских организаций – 214,8 млн рублей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Информация о реализации в 2021 году региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» на территории Республики Дагестан представлена в следующей таблице.

млн рублей

Региональные проекты	Профинансировано	Освоено на 1.01.2022 г.		Кассовое исполнение /профинансировано, %	
		Сумма	%	Сумма	%
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»	2 816,8	2 479,3	88,0	337,5	11,98
1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	140,16	140,16	100,00	0,00	0,00
2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	195,47	195,47	0,0	0,0	0,0
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»	1 694,5	1 691,4	99,8	3,1	0,18
4. «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	83,5	83,5	100,00	0,00	0,00
5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	703,2	368,7	52,4	334,5	47,6
7. «Развитие экспорта медицинских услуг»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» заключены 55 контрактов по 4 региональным проектам на сумму 950 млн рублей или 100 % от годового плана контрактов. С учетом остатков 2020 года на сумму 178,3 млн рублей общая сумма законтрактованных средств составила 1 128,3 млн рублей.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий национального проекта «Здравоохранение» представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
Здравоохранение	Первичная медицинская помощь	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий	5,2	3,9	75
		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, возрастающий	2,95	2,51	85,1
		Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастающий	99,84	99,8	100

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	3	0,9	30
		Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	97	100	103,1
		Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий	28	32	114,3
		Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий	69,2	70	101,1
		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	90	97	10,8
		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	168	199	118,4
		Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий	9139,3	7334,8	80,2
Здравоохранение	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	50	70	140
		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечнососудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях,	80	94,3	117,9
		Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	6	7	85,7
		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	8	9	88,9
		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	2,01	1,4	143,6

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед	3,24	2,07	63,88
Здравоохранение	Борьба с онкологическими заболеваниями	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	21,2	21,2	100
		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	52,1	52,3	100,4
		Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	49,7	54,2	109,0
		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	66	66,5	100,7
Детское здравоохранение		Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, убывающий	95	97,4	97,5
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	70	73,5	105
		Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	58	58,5	100,8
		Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	10,2	8,3	122,9
		Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	84	52	161,5
		Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	55	55,7	101,3
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	70	71,1	101,6
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	60	61,8	103,0
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	60	63,6	106,0
		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения	70	76,8	109,7
		Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и оснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%), возрастающий	40	82,5	206,2

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%		
			План	Факт			
		Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, возрастающий	91,8	92,9	101,2		
		Младенческая смертность, убывающий	7,5	6,7	111,9		
Здравоохранение	Квалифицированные кадры в медицинских организациях	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастающий	100	100	100		
		Укомплектованность медицинских организаций, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества в медицинских учреждениях, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачи, возрастающий, процент	90,9	92,9	102,2		
		Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	23893	19851	83,1		
		Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	33,5	34,2	102,1		
		Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	81,9	81,5	99,5		
		Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	5	4,9	98		
		Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)	22,1	1,3	5,88		
		Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий	100	97,8	97,8		
		Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	20,6	20	97,1		
		Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	12,6	12,4	98,4		
		Здравоохранение	Единый цифровой контур здравоохранения	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	71,55	166,17	232,2

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Дагестан, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ (ТВСП)	474	660	139,2
		Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Дагестан, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ (ФАП и ФП)	1005	986	98,1
		Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде (ТВСП)	300	343	114,3
		Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде (ФАП и ФП)	200	986	493
		Доля государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу	67	69	103
		Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации	50	48	96
		Доля отделений государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Республики Дагестан	4	1	25
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	359	454	126,5

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	1005	1005	100
		Доля аптечных организаций Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	85	83	97,6
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, возрастающий	402	402	100
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Дагестан	438	483	110,3
		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, подключенные к сети Интернет, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Дагестан	1005	986	98,1
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Дагестан	304	641	210,8
		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, подключенных к сети Интернет, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Дагестан	380	986	259,5
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Дагестан	474	660	139,2
		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Дагестан	1005	986	98,1
		Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»	134	349	260,4

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Республики Дагестан	154	248	161
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Республики Дагестан	79	79	100
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, возрастающий	170	170	100
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Республики Дагестан	30	30	100
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Республики Дагестан	30	30	100
		Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, возрастающий	1005	986	98,1
		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключённых к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС	1005	986	98,1
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»	474	660	139,2

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»	150	986	657,3
		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Дагестан, соответствующим требованиям Минздрава России	474	497	104,9
		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Дагестан, соответствующим требованиям Минздрава России	380	986	259,5
		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	80	80	100
		Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	40	14,03	35,1
		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ	50	50	100
		Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Республики Дагестан	34937	36545	104,6
		Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Республики Дагестан	16632	16633	100
		Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан (ТВСП)	15 627	15 655	100,2
		Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан (ФАП и ФП)	1005	986	98,1
		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном	12	10,21	85,1

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, возрастающий			
		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий	49	5,12	10,4
		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастающий, процент	82	100	121,95
	Экспорт мед. услуг	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	0,22	15	6 818,2
		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	0,01	0,73	7 300

В 2021 году по национальному проекту «Здравоохранение» было предусмотрено достижение 85 показателей. Согласно данным Государственной информационной системы «Электронный бюджет» выполнены плановые значения по 57 целевым показателям.

Не обеспечено достижение плановых значений по 28 целевым показателям, или 33 % от планового количества (из них по 5 показателям исполнение менее 35 %) по следующим региональным проектам:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – по 5 целевым показателям;

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – по 3 целевым показателям;

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» - по 1 целевому показателю;

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – по 7 целевым показателям;

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – по 12 целевым показателям.

Результаты анализа выполнения целевых показателей региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» свидетельствуют о низком качестве планирования системы показателей региональных проектов, возможном занижении прогнозных оценок, а также о наличии целевых показателей, значения которых не имеют динамику по сравнению с базовыми значениями. В 2021 году по 9 целевым индикаторам допущено перевыполнение показателей от 200 % до 7 300 % от запланированных значений на 2021 год. Указанное свидетельствует о занижении прогнозных оценок, а также о несвоевременной корректировке плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.



3.1. Региональный проект «Первичная медико-санитарной помощь»

Региональный проект направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи в Республике Дагестан, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах.

Основными целями реализации регионального проекта являются завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В ходе реализации регионального проекта в 2021 году были запланированы мероприятия по развитию санитарной авиации за счет обеспечения 168 вылетов в целях оказания экстренной медицинской помощи, а также по оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 140,16 млн рублей (за счет федерального бюджета – 68,5 млн рублей (в том числе с учетом неосвоенного остатка по контрактам 2020 года в сумме 394 тыс. рублей), республиканского бюджета Республики Дагестан – 71,6 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено выделенных средств в сумме 140,16 млн рублей, или 100 % от годовых назначений

Средства, выделенные по региональному проекту использованы на:

- оказание экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации (ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф») – 139,8 млн рублей;

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в 2020 году - 0,39 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта заключены 2 контракта, или 100 % от плана, на выполнение работ по санитарной авиации на сумму 139,8 млн рублей. Осуществлено 166 вылетов вертолетом санитарной авиации, или 99,4 % от планового объема (168 вылетов). Эвакуированы в медицинские организации 199 человек, из них 39 детей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Первичная медицинская помощь	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания возрастной, тыс. посещений	99,84	99,8	99,95
2		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА, в расчете на 1-го сельского жителя, возрастной, процент	2,95	2,51	85,1
3		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду возрастной, тыс. посещений	5,2	3,9	75,0
4		Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения возрастной, процент	28	32	114,3
5		Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, возрастной, процент	3	0,9	30,0
6		Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества организаций возрастной, процент	69,2	70	101,1
7		Число выполненных посещений гражданами поликлиник, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» тыс. посещений	9139,3	7334,8	80,2
8		Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), процент	97	100	103,1
9		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), возрастной, %	168	199	118,4
10		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	90	97	107,8

Запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, однако не обеспечено выполнение плановых значений по 5 показателям, в том числе:

- «Доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания» - 99,8 % (план - 99,84 %). Значение показателя не предполагает существенных изменений за год (+ 0,04 % по сравнению с базовым значением);

- «Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя» – 2,51 посещений (план - 2,95 посещений);

- «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду» - 3,9 тыс. посещений (план - 5,2 тыс. посещений). Плановое значение целевого показателя совпадает с базовым значением (5,2 тыс. посещений), и не имеет динамики роста до 2024 года;

- «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг в отчетном году, возрастающий, процент» – 0,9 % (план – 3 %)⁴;

- «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи, возрастающий, тыс. посещений» - 7 334,8 тыс. посещений (план - 9 139,3 посещений);

Принятые в 2021 году меры по реализации регионального проекта оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач. Запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, однако не обеспечено выполнение плановых значений по всем целевым показателям регионального проекта. Основной причиной неисполнения плановых значений целевых показателей является приостановление проведения диспансеризации и профилактических осмотров в Республике Дагестан в период с 29 июля 2021 года по 1 сентября 2021 года.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает реализацию мероприятий регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» в целях обеспечения оптимальной доступности медицинских организаций для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях увязать с мероприятиями государственной программы Республики Дагестан «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан».

⁴ данные с января по ноябрь 2021 года



3.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на обеспечение доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, снижение смертности от болезней системы кровообращения и инфаркта миокарда.

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.

Согласно региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году было предусмотрено:

- переоснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Городская клиническая больница», ГБУ «Кизлярская центральная городская больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации - 140,18 млн рублей (с учетом неиспользованных остатков за 2020 год - 0,74 млн рублей (заключено в 2020 году));

- проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска – 55,29 млн рублей (с учетом остатков по контрактам 2020 год - 0,23 млн рублей).

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 195,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета – 194,9 млн рублей (с учетом остатка по контрактам 2020 года в сумме 0,95 млн рублей), средства республиканского бюджета – 0,56 млн рублей (с учетом остатка по контрактам 2020 года в сумме 0,01 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 195,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В целях реализации регионального проекта заключено 30 контрактов на сумму 194,5 млн рублей⁵, или 100 % от планового объема (30 контрактов),

⁵ с учетом заключенных остатков средств за 2020 год в сумме 0,965 млн рублей

в рамках которых поставлены:

- ангиографическая рентгеновская система для ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» на сумму 91,54 млн рублей;
- компьютерный томограф для оснащения ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница» на сумму 45,0 млн рублей;
- комплект мягких модулей для ГБУ РД "Буйнакская центральная городская больница" и стол для кинезотерапии на сумму 0,148 млн рублей;
- тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия и подъемника для больных на сумму 0,638 млн рублей;
- прикроватные кресла с высокими спинками на сумму 0,158 млн рублей;
- аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей на сумму 0,462 млн рублей;
- стабиллоплатформа с биологической обратной связью на сумму 0,349 млн рублей;
- оборудование для ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» - на сумму 1,147 млн рублей;
- кардиопрепараты - 22 контракта на сумму 55,08 млн рублей.

Проведены работы по оснащению 2 региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и 2 первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Городская клиническая больница», ГБУ «Кизлярская центральная городская больница»).

В целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений проведена работа по лекарственному обеспечению пациентов высокого риска.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	2,01	1,4	143,6
2		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящим под диспансерным наблюдением	50	70	140

3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	6	7	85,7
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	8	9	88,9
5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а так же которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	80	94,3	117,9
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед	3,24	2,07	63,9

Принятые в 2021 году меры по реализации регионального оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач. Запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, однако не обеспечено выполнение 3 целевых показателей регионального проекта, в том числе:

- «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий» – 2,07 тыс. единиц (план – 3,24 тыс. единиц);
- «Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий, процент» - 7 % (план - 6 %);
- «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий, процент» - 9,0 % (план – 8 %);

В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией количество обращений больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинские организации, значительно уменьшилось. В то же время, указанное может являться свидетельством наличия недостатков организации диспансерного наблюдения больных на местах, а также неполного соблюдения стандартов обследования и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**

- провести анализ причин невыполнения целевых показателей регионального проекта и принять меры по их достижению;
- усилить текущий контроль за ходом реализации регионального проекта и достижения целевых показателей;
- обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для работы с медицинским оборудованием, приобретаемым в рамках реализации регионального проекта;
- обеспечить принятие своевременных решений по корректировке и минимизации рисков, возможных в ходе реализации мероприятий с учетом сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.



3.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» было предусмотрено обеспечение доступности профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний за счет проведения следующих мероприятий:

- открытие Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница» - 52,92 млн рублей;
- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» – 249,15 млн рублей;
- оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями - 1 389,35 млн рублей;

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 1 694,47 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета – 252,12 млн рублей (с учетом остатков по контрактам 2020 года в сумме 3,0 млн рублей), средства республиканского бюджета – 55,9 млн рублей, средства ТФОМС – 1 389,35 млн рублей),

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 1 691,42 млн рублей, или 99,8 % от объема годовых назначений. Неосвоенный остаток средств составил 3,1 млн рублей или 0,2 % от объема годовых назначений.

На реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения» за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования профинансированы и освоены средства в сумме 1 389,35 млн рублей.

Заключены 9 контрактов на сумму 301,2 млн рублей, или 100,0 % от запланированного объема, согласно которым проведены:

- ремонт и оснащение ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница» - 52,9 млн рублей. Проведен ремонт (2,01 млн рублей) и закуплено 30 единиц медицинского оборудования (50,9 млн рублей). В ноябре 2021 года состоялось открытие Центра амбулаторной онкологической помощи при ГБУ РД «Избербашская ЦГБ»;
- оснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» - 249,2 млн рублей. Закуплены плазменный стерилизатор (5,94 млн рублей), роботизированная система гистологической диагностики (51,15 млн рублей), магнитно-резонансный томограф (192,06 млн рублей).

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Борьба с онкологическими заболеваниями	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	21,2	21,2	100
2		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет, %	52,1	52,3	100,4
3		Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	49,7	54,2	109,1
4		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, (%)	66	66,5	100,7

В ходе реализации регионального проекта по всем показателям обеспечено достижение плановых значений на 2021 год. Однако, принятые меры оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач.

По показателю «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %» обеспечено перевыполнение планового значения за 2021 год на 9,1 % (план – 49,7 %, факт – 54,2 %). В то же время, по данным Счетной палаты Российской Федерации, Республика Дагестан отнесена к регионам, доля пациентов, у которых онкология была обнаружена на поздней стадии, составляет - 35,06 % от всех пациентов, впервые получивших диагноз «онкология», что существенно превышает общероссийский показатель (19,3%). Указанное свидетельствует о ненадлежащем проведении мероприятий по диспансеризации населения.

В 2021 году также не реализованы в полном объеме мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием. По состоянию на 1 января 2022 года не получено заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации, подготовленной в 2020 году в целях строительства референс - центра в ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения медицинского оборудования. В результате, не освоены средства федерального бюджета в сумме 3,0 млн рублей (средства 2020 года). При этом, закупленные в 2020 году по региональному проекту линейные ускорители на общую сумму 652,86 млн рублей, до настоящего времени не используются и подвержены моральному износу.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- принять меры по завершению проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и проведению конкурсных процедур по объекту «Строительство каньонов для лучевой терапии ГБУ РД «Республиканский онкологический центр».

- увеличить мероприятия по скринингу – проведению массовых обследований пациентов на предмет выявления возможных онкологических заболеваний;

- рассмотреть вопрос об организации услуг по проведению сцинтиграфии в Республики Дагестан.

- повысить качество проводимой диспансеризации населения.



3.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В рамках регионального проекта в 2021 году запланированы мероприятия по оказанию помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным (125,1 тыс. человек), снижению смертности детей, а также увеличению охвата детей до 17 лет профилактическими осмотрами (до 70 %).

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 83,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений за счет средств Федерального фонда социального страхования (родовые сертификаты), или 100% от профинансированных расходов.

Средства, профинансированные по региональному проекту направлены на развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным.

В ходе реализации регионального проекта оказана медицинская помощь 125,1 тыс. женщинам в период беременности и родов, или 100 % от планового значения.

В 2021 году заключение контрактов по региональному проекту не предусмотрено.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Детское здравоохранение	Младенческая смертность, убывающий, промиле (0,1 процента)	7,5	6,7	111,9
2		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	70	73,5	105
3		Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	58	58,5	100,8
4		Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	10,2	8,3	122,9
5		Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	84	52	161,5
6		Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	55	55,7	101,3
7		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткан	70	71,1	101,6
8		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными	60	61,8	103,0

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата			
9		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	60	63,6	106,0
10		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения	70	76,8	109,7
11		Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами (%)	91,8	92,9	101,2
12		Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (%)	95	97,4	97,5
13		Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	40	82,5	206,3

Анализ выполнения целевых показателей регионального проекта показал, что из 13 целевых показателей регионального проекта в 2021 году выполнены 12 показателей. Не обеспечено достижение плановых значений по 1 показателю:

- «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, убывающий» - 97,4 %, (план – 95 %).

В то же время, по данным Федеральной службы государственной статистики с января 2021 года по ноябрь 2021 года, Республика Дагестан вошла в тройку регионов с самым большим абсолютным числом умерших в возрасте до одного года детей (Ростовская область и Краснодарский край).

Согласно отчетам Территориального органа федеральной службы государственной статистики, в 2021 году в Дагестане умерло 332 ребенка в возрасте до 1 года, что на 19 детей больше, чем в 2020 году. В 2020 году Республика занимала второе место по величине показателя в стране после города Москвы.

Коэффициент младенческой смертности по Республике Дагестан в 2021 году составил 7,8 %, что на 1,1 % превышает значение 2020 года (6,7 %).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- внести изменения в показатели результативности мероприятий, с учетом достигнутых значений по результатам реализации в 2021 году;

- увеличить объемы и повысить качество проводимых профилактических осмотров детей и подростков, в целях выявления заболеваний на ранних стадиях, а также выявления факторов риска возникновения тех или иных болезней.



3.5. Региональный проект

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Согласно региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами» до 2024 года запланирована ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях.

В рамках реализации регионального проекта было запланировано:

- обеспечение единовременными компенсационными выплатами медицинских работников (врачи, фельдшера), прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - 188,5 млн рублей;

- подготовка специалистов по основным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования – 22,24 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.

Участие в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 000 рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики.

На реализацию вышеуказанных мероприятий профинансированы расходы в сумме 218,15 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 188,5 млн рублей, средства республиканского бюджетов – 29,65 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 218,15 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В 2021 году заключены 198 контрактов (165 контрактов по программе «Земский доктор» и 33 контракта по программе «Земский фельдшер»), или 108 % от планового количества (183 контракта) на общую сумму 188,5 млн рублей.

В 2021 году по программе «Земский доктор/фельдшер» было запланировано трудоустроить в сельскую местность 170 врачей и 13 фельдшеров, акушерок и медицинских сестер.

Повышение квалификации прошли 4 959 специалистов среднего медицинского звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (29,65 млн рублей).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Квалифицированные кадры в медицинских организациях	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)	33,5	34,2	102,1
2		Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	81,9	81,5	99,5
3		Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	20,6	20	97,1
4		Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)	90,9	92,9	102,2
5		Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)	100	100	100
6		Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий тыс. чел.	23,9	19,8	83,1
7		Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %	22,1	1,3	5,88
8		Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	12,6	12,4	98,4
9		Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	5	4,9	98,0
10		Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	100	97,8	97,8

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» из 10 целевых показателей регионального проекта на 1 января 2022 года не выполнены 7 показателей:

- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий» – 81,5 ед. (план – 81,9 ед);

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий» – 20,0 ед. (план - 20,6 ед.);

- «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения» - 4,9 ед. (план – 5 ед.);

- «Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий – 97,8 % (план – 100 ед.);

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения, возрастающий» - 12,4 % (план – 12,6 ед.);

- «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, возрастающий» – 19,8 тыс. человек (план – 23,9 тыс. человек);

- «Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %, возрастающий» - 1,3 % (план – 22,1 %);

Следует отметить, что для Республики Дагестан характерно неравномерное распределение медицинских кадров. Отчетливо проявляется тенденция их концентрации в городах, а соответственно и увеличения возможностей по оказанию доступной и качественной медицинской помощи с одновременным ограничением доступности и снижением качества медицинской помощи в сельской местности.

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан, в период с 2018 г. по 2020 г. в Республики Дагестан наблюдалась устойчивая тенденция нехватки медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по врачам: в 2018 году – 664,75 единиц, в 2019 году 576,75 единиц, в 2020 году - 504,75 единиц. При этом, единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор» предоставлены в 2018 году 202 врачам, в 2019 году - 224 врачам и 10 фельдшерам, в 2020 году – 181 врачам и 25 фельдшерам, в 2021 году - 165 врачам и 33 фельдшерам.

В текущих условиях единовременные компенсационные выплаты решают проблему нехватки кадров только на ограниченный период времени. По истечении 5 летнего срока, как правило, врачи/фельдшера устраиваются в более крупные города и центры. Кроме того, в основном, полученные выплаты участники программы тратят на приобретение или строительство жилья. Таким образом, неразвитая инфраструктура в сельских поселениях и низкая привлекательность условий труда медицинских работников, являются фактором оттока медицинских специалистов из сельской местности.

В результате, неукомплектованность медицинским персоналом приводит к увеличению нагрузки на медицинских работников, а также к увеличению сроков ожидания медицинской помощи.

Медицинские работники проходят повышение квалификации на территории Республики Дагестан, так как отсутствие у медицинских организаций дополнительных источников финансирования ограничивает их возможности выезда за пределы республики в целях изучения новых методов диагностики и лечения.

Счетной палатой Республики Дагестан в ходе проводимых проверок реализации программы «Земский доктор», выявлены 22 случая незаконных выплат в 2019 - 2020 годах на общую сумму 20 500 тыс. рублей, в том числе:

- Бабаюртовский район - 1 млн рублей (2 случая (2 фельдшера));
- г. Дагестанские Огни - млн рублей (4 случая (4 врача));
- Карабудахкентский район - 1 млн рублей (1 случай (врач));
- Кумторкалинский район - 2 млн рублей (2 случая (врачи));
- Кизилюртовский район – 1 млн рублей (1 случай (врач));
- Кайтагский район - 1 млн рублей (1 случай (врач));
- Магарамкентский район - 1 млн рублей (1 случай (врач));
- Тляртинский район - 1 млн рублей (1 случай (врач));
- Цумадинский район - 8,5 млн рублей (9 случаев (3 врача, 5 фельдшеров, 1 мед брат).

Материалы проверок направлены в правоохранительные органы, по которым возбуждены 11 уголовных дел.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- предусмотреть отдельные программные мероприятия (командировочные расходы, оплата учебы) по организации повышения квалификации медицинских работников за пределами субъекта в целях изучения новых методов диагностики и лечения для достижения результата - оказания качественной медицинской помощи населению;

- при формировании кадрового состава медицинских организаций обеспечить комплектацию штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов;

- активизировать деятельность администраций муниципальных районов по созданию необходимых условий для прибытия медицинских работников на село, в том числе за счет дополнительного стимулирования в виде предоставления земельных участков, служебного жилья и других мер поддержки медицинских работников;

- актуализировать перечни дефицитных специальностей Республики Дагестан на 2022 год.

- активно использовать средства массовой информации и возможности социальных сетей для проведения информационно-разъяснительной работы среди медицинских работников (врачей, фельдшеров) об условиях участия в программе «Земский доктор».



3.6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Согласно региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году предусматривалось создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В целях организации межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы было запланировано достижение 100 % оснащения автоматизированными рабочими местами медицинских учреждений Республики Дагестан.

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 703,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 483,5 млн рублей (в том числе средства по контрактам 2020 года -172,17 млн рублей), республиканского бюджета Республики Дагестан – 4,88 млн рублей (в том числе средства по контрактам 2020 года – 1,739 млн рублей), внебюджетных источников (средства ТФОМС, медицинских организаций) - 214,8 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 368,7 млн рублей, или 52,4 % от объема финансирования.

По итогам 2021 года неиспользованный (неосвоенный) остаток профинансированных средств составил 334,5 млн рублей, или 47,6 % от объема годовых назначений (за счет федерального бюджета - 123,5 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан - 1,2 млн рублей, внебюджетных источников - 209,8 млн рублей). Остаток образован в связи с необеспечением своевременного выполнения условий по заключенным контрактам.

Кроме этого, не освоены средства медицинских организаций в сумме 209,8 млн рублей, которые предусматривались ими для получения услуг по комплексному техническому сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД» в 2021 году. В 2021 году осуществлялась процедура перехода на модернизированную региональную медицинскую информационную систему «Единая цифровая платформа» (далее – ЕЦП). Завершение настройки ЕЦП и подключение к ней медицинских организаций началось с мая 2021 года. В связи с этим медицинскими организациями закупка услуг по техническому сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД», начата только с момента полного перехода на работу в ЕЦП. В 2021 году 72 медицинские организации

заключили контракты на техническое сопровождение ГИС «РФ ЕГИСЗ РД» на общую сумму 29,7 млн рублей, кассовое освоение составило 15 млн рублей. Из них 63 медицинских организаций заключили контракты со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года.

Заключено 14 контрактов на сумму 314,5 млн рублей, по которым поставка оборудования по состоянию на 1 января 2022 года полностью не завершена.

На оказание услуг по поставке, установке и настройке средств защиты информации в рамках развития (модернизации) системы защиты информации Регионального сегмента ЕГИСЗ Республики Дагестан израсходованы средства в сумме 3,9 млн рублей, на развитие подсистем Региональной медицинской информационной системы (РМИС) - 124,67 млн рублей.

Поставлено 10 программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator для подключения подразделений медицинских организаций к защищённой сети передачи данных (3,5 млн рублей), что позволило обеспечить подключение 100 % медицинских организаций Республики Дагестан к защищенным каналам связи.

В 2021 году достигнуто 100 % значение показателя оснащения АРМ медицинских работников, за счет поставки в медицинские организации Республики Дагестан 1 057 АРМ VipNetCoordinator (75,34 млн рублей), а также 560 АРМ для ФАП и ФП, подключенных к Интернет в 2020–2021 годах (37,2 млн рублей).

Осуществлена поставка 3 560 принтеров в медицинские организации, в том числе в 560 ФАП и ФП, на сумму 53,37 млн рублей.

Произведено расширение ресурсов Центра обработки данных Министерства здравоохранения Республики Дагестан за счет приобретения оборудования для расширения дискового пространства (12,98 млн рублей) и средств защиты информации (1,6 млн рублей).

Для подключения диагностического оборудования к центральному архиву медицинских изображений (ЦАМИ) медицинские организации Республики Дагестан оснащены 8 комплектами серверного оборудования (1,1 млн рублей).

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Рег. проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Единый цифровой контур здравоохранения	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.	71,55	166,17	232,2
2		Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Дагестан, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ (ТВСП)	474	660	139,2
3		Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Дагестан,	1005	986	98,1

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Рег. проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ (ФАП и ФП)			
4		Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде (ТВСП)	300	343	114,3
5	Единый цифровой контур здравоохранения	Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде (ФАП и ФП)	200	986	493
6		Доля государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу	67	69	103,0
7		Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации	50	48	96,0
8		Доля отделений государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Республики Дагестан	4	1	25,0
9		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	359	454	126,5
10		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	1005	1005	100
11		Доля аптечных организаций Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	85	83	97,6
12	Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	80	80	100	
13	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Дагестан	438	483	110,0	

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Рег. проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
14		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, подключенные к сети Интернет, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Дагестан	1005	986	98,1
15		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Дагестан	304	641	210,8
16	Единый цифровой контур здравоохранения	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, подключенных к сети Интернет, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Дагестан	380	986	259,5
17		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Дагестан	474	660	139,2
18		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Дагестан	1005	986	98,1
19		Доля клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Дагестан	134	349	260,4
20		Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Республики Дагестан	154	248	161,0
21		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Республики Дагестан	79	79	100
22		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастающий, процент	82	100	121,95
23		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Республики Дагестан	30	30	100
24		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Республики Дагестан	30	30	100
25			Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи	402	402

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Рег. проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС			
26		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключённых к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС	1005	986	98,1
27		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»	474	660	139,2
28		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»	150	986	657,3
29		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Дагестан, соответствующим требованиям Минздрава России	474	497	104,9
30		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Дагестан, соответствующим требованиям Минздрава России	380	986	259,5
31		Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ	170	170	100
32		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период , возрастающий, процент	49	5,12	10,4
33		Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ	50	50	100
34	Единый цифровой контур здравоохранения	Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Республики Дагестан	34937	36545	104,6
35		Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Республики Дагестан	16632	16633	100
36		Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан	15627	15655	100,2
37		Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к	1005	986	98,1

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Рег. проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
		защищенной сети передачи данных Республики Дагестан (ФАП и ФП)			
38		Доля записей на прием к врачу, совершённых гражданами дистанционно, возрастающий, процент	40	14,03	35,1
39		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, возрастающий	12	10,21	85,1
40		Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет	1005	986	98,1

В 2021 году принятые меры не позволили обеспечить завершение плановых мероприятий, обеспеченных финансированием, и достижение всех целевых показателей реализации регионального проекта.

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, из 40 запланированных целевых показателей (индикаторов) регионального проекта выполнен 28 целевой показатель. Не выполнены 12 целевых показателей (индикаторов), отражающих долю подключения медицинских организаций к централизованным системам Республики Дагестан «Лабораторные исследования», «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Управление потоками пациентов».

В 2021 году между ООО «Национальный центр информатизации» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан заключен контракт № 0103200008421002253 от 30.09.2021 года в целях развития государственной информационной системы «Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан». Нарушение со стороны исполнителя сроков и условий выполнения работ по модернизации ГИС «РФ ЕГИСЗ РД», привело к неисполнению целевых показателей регионального проекта, в том числе:

- «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» - 14,03 % (план - 40 %);

- «Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период» - 5,5 % (план - 12 %);

- «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период» - 5,12 (план - 49 %).

Следует отметить, что в результате срыва сроков поставки оборудования в 2020 году по региональному проекту «Цифровой контур здравоохранения» образовался остаток неисполненных бюджетных обязательств в сумме 173,9 млн рублей.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**

- повысить качество планирования системы показателей регионального проекта;
- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств;
- синхронизировать реализацию мероприятий регионального проекта в части подключения фельдшерско-акушерских пунктов к сети «Интернет», телемедицинской информационной системе «Цифровой ФАП» с мероприятиями регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Здравоохранение»;
- при проведении работ по подключению к сети «Интернет» определить обязательность подключения к централизованным системам Республики Дагестан (подсистемам) («Лабораторные исследования» «Телемедицинские консультации», «Лабораторные исследования», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями») ФАП и ФП Республики Дагестан, в том числе созданных в ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- ускорить процедуры по заключению контрактов на 2022 год и обеспечить качественную подготовку аукционной документации, а также соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения рисков приостановления процедур по заключению контрактов;
- при заключении контрактов предусмотреть ответственность сторон по контрактам (взыскание неустойки (пени, штрафы) в случае невыполнения обязательств подрядчиком (исполнителем), согласно статьи 34, 94, 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- обеспечить полноценное функционирование Единой государственной информационной системы здравоохранения «ЕГИСЗ» (Республика Дагестан»);
- организовать непрерывный процесс преподавания информатики и информационных технологий в системе базового, последипломного и дополнительного образования специалистов здравоохранения;
- использовать возможности всех средств массовой информации и сети "Интернет" для максимального охвата целевой аудитории в целях ознакомления с мероприятиями национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в Республике Дагестан (в том числе информации о существующих вакансиях, возможности электронной записи на прием и др).



3.7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

В ходе реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) до 2024 года.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

Финансирование проекта не предусмотрено. Реализация мероприятий регионального проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

Фактический объем экспорта медицинских услуг составил 648,5 тыс. долларов США, при плановом значении за 2021 год - 10 тыс. долларов.

Поступление финансовых средств в 2021 году на оказание экспортируемых медицинских услуг составило 47,76 млн рублей.

Выполнение целевого показателя (индикатора) мероприятия регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1.	Экспорт медицинских услуг	Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.	0,22	15	6818,2
2		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	0,01	0,73	7300

При плане 220 человек в год, фактическое значение выполнения целевого показателя в 2021 году составило 15 012 человек, то есть значительно (на 14 792 человек) превысило плановое значение. Таким образом, плановое значения целевого показателя регионального проекта необоснованно занижено и неактуально.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает пересмотреть показатели результативности мероприятий регионального проекта, в связи с значительным превышением фактических показателей над плановыми.



4. Национальный проект «Образование»



Куратор национального проекта:

Казиев Мурад Низамиевич
Врио заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан.

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.

Врио министра образования и науки Республики
Дагестан



Саидов К. Р.

Врио министра по делам молодежи РД



Азизов М. А

Начальник управления Правительства
Республики Дагестан по капитальному
строительству

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Образование» в Российской Федерации являются:

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования (2030 год);

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских организаций, до 15 процентов;

В рамках национального проекта «Образование» реализуются 6 региональных проектов.


- 1) «Современная школа»;
- 2) «Успех каждого ребенка»;
- 3) «Патриотическое воспитание»;
- 4) «Цифровая образовательная среда».
- 5) «Молодые профессионалы»;
- 6) «Социальная активность».

Ответственным за реализацию 5 региональных проектов национального проекта «Образование» определено Министерство образования и науки Республики Дагестан, а регионального проекта «Социальная активность» – Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

В реализации регионального проекта «Современная школа» ответственным исполнителем в части строительства объектов образования является Управление капитального строительства Республики Дагестан (в том числе ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»).

Финансирование национального проекта
«Образование» в 2021 году

млн рублей

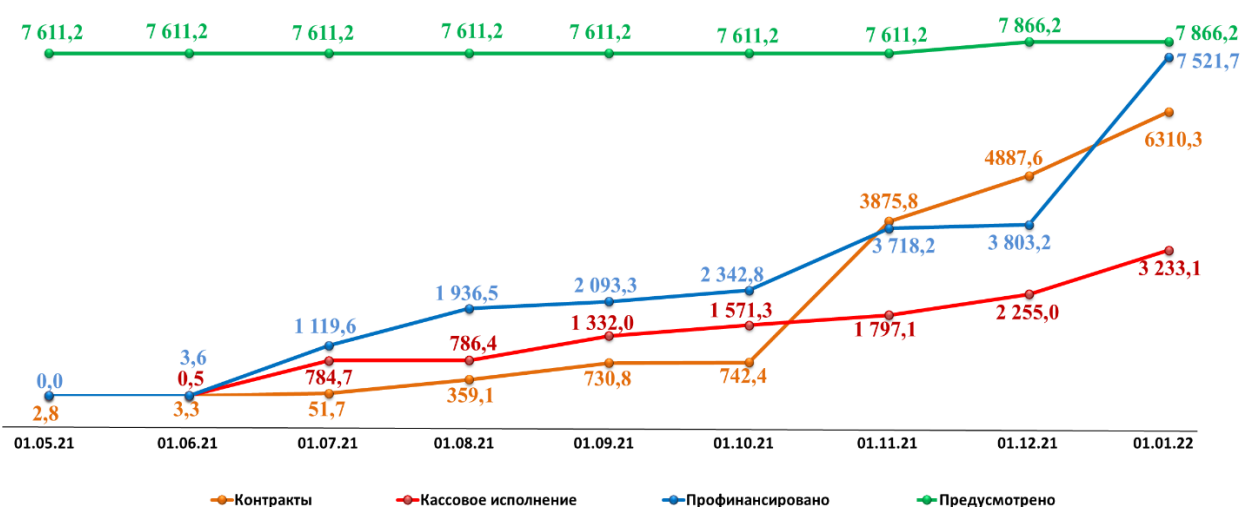

В 2021 году на реализацию 5 региональных проектов национального проекта «Образование» профинансированы расходы в сумме 7 521,7 млн рублей, или 95,6 % от годовых назначений (7 866,2 млн рублей). Финансирование регионального проекта «Патриотическое воспитание» в 2021 году не предусматривалось.

На 1 января 2022 года фактически освоено 3 214,4 млн рублей, или 41,0 % от годовых назначений (7 866,2 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 4 652 млн рублей, или 59,0 % от объема годовых назначений,

Информация о реализации региональных проектов национального проекта «Образование» за 2021 год представлена в следующей таблице.

Региональные проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено		Остатки средств на 01.01.2022г.	
			Сумма	%	Сумма	%
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	7 866,2	7 521,7	3 214,4	36,5	4 651,9	58,9
1. «Современная школа»	7 232,1	6 877,5	2 600,6	36,0	4 631,5	63,9
2. «Успех каждого ребенка»	526,6	526,6	506,1	96,1	20,5	2,8
3. «Патриотическое воспитание»	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4. «Цифровая образовательная среда»	11,7	11,7	11,7	100,0	0,0	0,0
5. «Молодые профессионалы»	89,84	89,84	89,84	100,0	0,0	0,0
6. «Социальная активность»	6,09	6,09	6,09	100,0	0,0	0,0

В 2021 году в целях реализации национального проекта «Образование» по 5 региональным проектам заключены 106 контрактов (договоров), или 100% от планового объема на сумму 6 310,3 млн рублей. Общая сумма законтрактованных средств по национальному проекту составляет 10 760,0 млн рублей (с учетом остатков 2020 года в сумме 4 449,3 млн рублей).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий национального проекта «Образование» представлено в следующей таблице.

№	Региональ ый проект	Наименования показателей	Значения целевых показателей на 1.01.2022 г. %		
			План	Факт	%
1.	Современная школа	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, возрастающий, процент	12	20,8	173,3
2.	Успех каждого ребенка	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, убывающим итогом, процент	59	59	100
3.		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий	1	1	100
4.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий, процент	30	127,3	424,3
5.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий, процент	3	5,3	176,6
6.		Цифровая образовательная среда	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, возрастающий, процент (в 2021 году оснащение образовательных организаций в рамках создания цифровой образовательной среды не запланировано), базовое значение	7,05	7,05
7.	Молодые профессионалы	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, возрастающий, процент	2,2	2,3	104,5
8.		Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, возрастающий, процент	58	58,96	101,7
9.		Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, возрастающий, единица	4 225	62 424	1 477,5
10.	Социальная активность	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, возрастающий, млн. чел	0,0608	0,071	116,8



4.1. Региональный проект «Современная школа».

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» запланировано обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также возможность получения профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников.

- 1) Строительство общеобразовательных организаций;
- 2) Создание центров естественно-научной и технологической направленностей (Центр образования «Точка роста»), расположенных в сельской местности и малых городах;
- 3) Обновление материально-технической базы и содержания предмета «Технология»;
- 4) Создание мобильного технопарка «Кванториум»;
- 5) Создание и функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство образования Республики Дагестан совместно с Управлением Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству.

На реализацию регионального проекта были профинансированы расходы на сумму 6 887,5 млн рублей, или 95,2 % от годовых назначений (7 232,1,2 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 436,1 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан - 795,95 млн рублей).

Освоено 2 600,6 млн рублей, или 36,1 % от годовых назначений (в том числе: Министерство образования и науки Республики Дагестан освоено 301,4 млн рублей, ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика - застройщика» освоено 2 223,0 млн рублей, МО «город Дербент» - 76,2 млн рублей).

Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 4 631,4 млн рублей, или 63,9 % от объема годовых назначений (в том числе средства федерального бюджета – 4 124,9 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 506,6 млн рублей).

В целях реализации регионального проекта заключено 33 контракта, или 100 % от годового объема на общую сумму 5 683,0 млн рублей.

С учетом остатков 2020 года в сумме 4 449,25 млн рублей, общая сумма законтрактованных средств по региональному проекту составила 10 132,2 млн рублей.

Профинансированные на реализацию регионального проекта бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. Строительство общеобразовательных организаций.

Общий объем бюджетных ассигнований, профинансированный на строительство общеобразовательных организаций в 2021 году составил 6 929,3 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 6 136,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 793,0 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 2 299,1 млн рублей, или 33,2 % от годовых назначений (6 929,3 млн рублей), (в том числе: ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» освоено 2 223,0 млн рублей, Муниципальным образованием «город Дербент» - 76,2 млн рублей).

Неиспользованный (неосвоенный) остаток бюджетных средств составил 4 630,2 млн рублей, или 66,8 % от объема годовых назначений (6 929,3 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года общее количество школ, предусмотренных построить в ходе реализации регионального проекта «Современная школа», составляло 35 школ на 17 078 мест (период с 2019 года по 2022 год). В том числе, в 2021 году было запланировано строительство 33 общеобразовательных учреждений на 16 180 мест ученических мест.

По состоянию на 1 января 2022 года из общего объема, предусмотренных к строительству в ходе реализации регионального проекта (35 школ), **введены в эксплуатацию 10 объектов на 3 350 ученических мест**, в том числе:

- **6 школ на 1744 уч. мест введены в 2020 году** (получена лицензия на образовательную деятельность и начат учебный процесс с 1 сентября 2021 года в школах в с. Акбулатюрт на 120 уч.мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч. мест, в с. Кандаураул на 300 уч. мест, в с. Эндирей, блок-пристройка к МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» на 300 уч. мест Хасавюртовского района, блок пристройка к МБОУ «СОШ № 26» на 604 уч. места в г. Махачкала, МКОУ «Теречное СОШ» на 300 уч. мест в с. Теречное в Хасавюртовского района;

- **4 школы на 1 606 уч. мест введены в 2021 году** (получено разрешение на ввод в эксплуатацию (школа на 304 уч. места в с. Оружба Магарамкентского района, школа на 400 уч. мест в с. Луткун Ахтынского района, школа на 400 уч. мест в с. Новокостек и на 502 уч. мест в с. Эндирей Хасавюртовского района).

По 12 школам на 7 104 ученических мест, запланированным построить в 2021 году, в связи с удорожанием строительных материалов, труднодоступностью отдельных объектов, расположенных в горной местности, и особенностями природно-климатических условий (невозможность ведения строительных работ в осенне-зимний период), плановый срок ввода в эксплуатацию, по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации был перенесен на 2022 год.

По 13 школам на 6 624 ученических мест срок ввода в эксплуатацию предусмотрен на 2022 год. В целях строительства данных школ в 2021 году

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

заключены 13 контрактов на проектирование и строительство на общую сумму 5 381,2 млн рублей. Однако, за исключением школы на 804 ученических мест в городском округе «город Дербент», планируемое строительство 12 школ в 2021 году не начато. По состоянию на 1 января 2022 года предусмотренное авансирование в соответствии с заключенными контрактами не произведено.

Перечень объектов образования, запланированных построить в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» (генподрядчик - ФГУП «ГВСУ № 4»)

млн рублей

	Школы	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	% строят. готовности
1	МКОУ «Эндирейская СОШ №2» (блок-пристройка), в с.Эндирей Хасавюртовского района	300	281,45	Передана в муниципальную собственность
2	Школа в с. Новокостек, Хасавюртовского района	400	433,35	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
3	Школа в с. Эндирей Хасавюртовского района	502	422,14	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
4	Школа с. Луткун Ахтынского района	400	382,96	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
5	СОШ № 41 в п. Загородный, г. Махачкала	502	374,94	92,4
6	Школа в с.Кванада Цумадинского района	120	160,56	72,11
7	СОШ №58 в пос. Семендер г. Махачкалы	1224	1 017,59	59,61
8	Школа в с. Гигатли Цумадинского района	120	185,24	53,6
9	Школа в с. Солнечное, Хасавюртовского района, (ввод в 2021 г.)	804	758,92	48,77
10	Школа в с.Авадан, Докузпаринского района	400	419,24	46,8
11	Школа г. Каспийск	1224	984,75	44,97
12	Школа в с.Хамавюрт Хасавюртовского района	502	346,63	42,35
13	МБОУ "СОШ №27" (блок-пристройка) в г. Махачкала	604	495,09	38,72
14	Школа в с. Хебатли Цунтинского района	80	125,56	26,64
15	Школа в МКР «Ипподром» г. Махачкала	1224	985,25	23,93
16	СОШ №2 г. Каспийск	300	262,72	13,87
	Итого	8 706	7 636,4	

Строительство **16 школ** на 8 706 ученических мест осуществляется генеральным подрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», из которых на 1 января 2022 года завершено строительство и введены в эксплуатацию **4 школы**, в том числе:

- 1 школа введена в эксплуатацию и функционирует (МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» (блок-пристройка) на 300 уч. мест в с. Эндирей Хасавюртовского района) введена в эксплуатацию в 2020 году;

- 3 школы (МКОУ «Новокостекская СОШ» в с. Новокостек Хасавюртовского района на 400 мест, школа на 400 уч. мест в с. Луткун Ахтынского района, на 502 уч. мест в с. Эндирей Хасавюртовского района) введены в эксплуатацию в 2021 году.

Уровень технической готовности по **12 школам** составляет от 13 % до 92 %, в том числе: по 2 школам от 72 % до 92 %, по 6 школам от 42 % до 59 %, по 4 школам от 13 % до 38 %.

В 2021 году генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4» не производились работы на 2 объектах с общим объемом выделенных средств в сумме 194,14 млн рублей, в том числе: школа на 300 уч. мест в г. Каспийске – 131,36 млн рублей, и школа на 60 мест в с. Хебатли Цунтинского района - 62,78 млн рублей.

Строительство на данных объектах не ведется в связи с некачественной разработкой проектно-сметной документации, по которой осуществляются доработка и корректировка.

2) Создание центров естественно-научной и технологической направленностей (Центр образования «Точка роста») на базе 170 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.

В целях создания Центров «Точка роста» в 2021 году профинансировано 267,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Освоено 265,6 млн рублей, или 99,5 % от годовых назначений. Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 1,4 млн рублей, или 0,5 % от объема годовых назначений (в том числе средства федерального бюджета – 1,3 млн рублей).

Заключено 5 контрактов на сумму 265,6 млн рублей, согласно которым осуществлена поставка оборудования.

С 4 октября 2021 года в образовательных Центрах «Точка роста» начался образовательный процесс в очном и дистанционном формате.

3) Обновление материально-технической базы и содержания предмета «Технология» в двух коррекционных учреждениях (интернатах) города Махачкалы I и IV вида.

В целях реализации мероприятия в 2021 году профинансировано 14,71 млн рублей. Освоено 11,57 млн рублей, или 77,2 % от годовых назначений (15,0 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 3,4 млн рублей, или 22,8 % от объема годовых назначений.

Заключены 13 контрактов на сумму 14,7 млн рублей, согласно которым осуществлена поставка оборудования.

4) Создание мобильного технопарка «Кванториум» (на базе МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Махачкала) в целях реализации

основных образовательных программ естественнонаучного (физика, химия и биология) и технологического циклов (IT-технологии, робототехника, информатика).

На создание мобильного технопарка «Кванториум» в 2021 году профинансированы и освоены 21,36 млн рублей, или 100 % от годовых назначений

Заключены 2 контракта на сумму 21,4 млн рублей и 2 прямых договора на сумму 20,0 тыс. рублей. Оборудование поставлено.

23 сентября 2021 года открыт первый школьный детский технопарк «Кванториум» численностью обучающихся 1 463 человека.

5) Создание и функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (финансирование не предусмотрено).

В 2021 году ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов» запланировано достижение показателя результативности по охвату более 5 000 педагогических работников. Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации составила 2 088 человек или 41,8 % от плана (5 000 педагогических работников).

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значение показателей		%
			План	Факт	
1	Современная школа	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ	12,0	208,	173,3

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, не выполнены в полном объеме. Однако, на 173,3 % обеспечено значительное перевыполнение целевого показателя реализации регионального проекта на 2021 год. Следует отметить, об отсутствии согласованности целевого показателя с мероприятиями, проводимыми в целях реализации регионального проекта «Современная школа».

Приведенные данные о реализации регионального проекта «Современная школа» свидетельствуют о повторении в 2021 году ситуации предыдущих двух лет, связанной со срывом сроков окончания строительства объектов образования и неосвоением профинансированных бюджетных средств.

Результаты проведенного мониторинга показали, что Министерством строительства Республики Дагестан, ГКУ «Дирекцией единого государственного заказчика-застройщика», ФГУП «ГВСУ № 4» не было обеспечено принятие качественных управленческих решений в целях своевременного освоения выделенных средств и строительства объектов в установленные сроки. Слабая организация выполнения строительных работ,

отсутствие установленного рабочего графика проведения работ, необходимой строительной техники и оборудования для выполнения строительно-монтажных работ, а также нехватка персонала привели к срыву плановых сроков строительства объектов и неосвоению профинансированных бюджетных средств.

Проектно-сметная документация по многим объектам была разработана еще в 2019 году, на основании заданий на проектирование, подготовленных муниципальными образованиями с многочисленными недоработками, что в свою очередь привело к необходимости внесения изменений и уточнений.

По информации ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» неосвоение предусмотренных лимитов также связано с низкой исполнительской дисциплиной ФГУП «ГВСУ № 4» по представлению актов по формам КС-2 и КС-3. Следствием указанного является ситуация, когда на объектах, при наличии достаточных объемов выполненных работ, заказчику не могут быть предъявлены к оплате акты выполненных работ и, соответственно, кассовые расходы не осуществляются.

На своевременность расчетов по выполненным объемам работ оказывает влияние привлечение нескольких субподрядных организаций-операторов, которые в свою очередь также привлекали субподрядные организации для строительства объектов. Кроме этого, имело место затягивание подрядными организациями представления документов на оплату по объектам высокой готовности, или завершённым строительством объектам, обусловленное решением Правительства Российской Федерации о компенсации удорожания стоимости строительных материалов (при этом компенсации подлежат невыполненные объемы работ).

Помимо вышеуказанного, в ходе реализации регионального проекта в 2021 году были отмечены случаи несвоевременного проведения конкурсных процедур, отмены аукционов, жалоб со стороны участников торгов, нарушений условий контрактов.


По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- привести объемы финансирования, указанные в государственной программе Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» и паспорте регионального проекта в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в республиканском бюджете Республики Дагестан;

- органам исполнительной власти и муниципальных образований Республики Дагестан уполномоченных по надзору за ходом строительства, и по вводу в эксплуатацию объектов завершённого строительства (муниципалитеты) надлежит обеспечить строгий контроль за ходом строительства и приемки в эксплуатацию завершённых объектов;

- в перечень мероприятий по реализации регионального проекта включить мероприятия по кадровому обеспечению образовательных организаций.

- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной документации по объектам, строительство которых планируется в 2022 году.



4.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В 2021 году в ходе реализации регионально проекта «Успех каждого ребенка» было предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 59 %, за счет проведения следующих мероприятий:

- создание 76 786 новых мест дополнительного образования путем модернизации материально-технической базы для реализации дополнительных общеразвивающих программ по 6 направлениям⁶ - 447,21 млн рублей;

- создание в 80 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт 15 спортзалов и оснащение 60 школ открытыми спортивными площадками, установка 5 мини-футбольных полей) – 79,3 млн рублей.

В 2021 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» профинансированы расходы в сумме 526,5 млн рублей или 100 % от годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета - 512,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 14,1 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 506,1 млн рублей, или 96,1 % от объема годовых назначений. Неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил 20,5 млн рублей, или 2,8 % от объема финансирования, образованный за счет экономии по итогам проведения конкурсных процедур и выполнения ремонтных работ, а также неисполнения обязательств по контракту. Средства в сумме 17,37 млн рублей возвращены в федеральный бюджет.

В ходе реализации регионального проекта заключено 38 контрактов на общую сумму 519,8 млн рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

- «Создание новых мест по дополнительному образованию детей» - 14 контрактов на сумму 446,2 млн рублей. По 1 контракту поставка оборудования (3d-принтеры) и средств обучения поставщиком не осуществлена. в связи с отсутствием необходимого товара у поставщика (ООО «Высокие технологии»). Контракт на сумму 16,06 млн рублей расторгнут.

- «Создание в 80 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» - 24 контракта на сумму 73,5 млн рублей (в том числе: приобретение 60 воркаут-площадок - 4 контракта на сумму 18,0 млн рублей, установка 5 футбольных мини-полей - 5 контрактов на сумму 16,0 млн рублей; ремонт 15 спортзалов - 15 контрактов на сумму 39,5 млн рублей).

⁶ естественнонаучное, техническое, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное.

Результаты мероприятий, проведенных в ходе реализации регионального проекта в 2021 году представлены следующим образом:

1) Создание 76 786 новых мест дополнительного образования путем модернизации материально-технической базы образовательных организаций (447 млн рублей). Всего по региональному проекту нарастающим итогом по состоянию на 1 января 2022 года количество мест дополнительного образования в Республике Дагестан должно было составить 81 173 мест.

В целях самореализации и раскрытия талантов детей в 592 образовательных организациях республики (434 школы, 69 детских садов, 71 учреждений дошкольного образования, 18 учреждений среднего профессионального образования) обновлена материально-техническая база для реализации дополнительных общеразвивающих программ по 6 направлениям (техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное – 1 501 мест, художественное – 600 мест, социально-педагогическое – 505 мест).

Лицензии на обучение по дополнительному образованию получили 592 организации. В соответствии с данными региональной системы «Навигатор дополнительного образования детей в Республике Дагестан» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 393 667 человека от общего количества 643 771 детей.

В 2021 году выдано 393 667 сертификатов учета дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Таким образом, общий охват дополнительным образованием детей составляет 61,15 % (план – 59 %).

Общий охват деятельностью ДТ «Кванториум», Мобильного технопарка «Кванториум-05», Центра цифрового образования ИТ-куб, г. Махачкала (создан в 2019 году), Центра цифрового образования ИТ-куб, г. Каспийск (создан в 2020 году), составил 19 767 человек, что составляет 5,0 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся дополнительным образованием 393 667 человек.

Школьники 1-11 классов приняли участие в онлайн-уроках «Проектория – Интернет – портал ранней профнавигации для школьников) с целью профориентационной работы в количестве 359 789 человек

В 2021 году охват детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", составил 59 630 человек (план - 12 394 человек).

В рамках деятельности Регионального центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) проведены профориентационные мероприятия с охватом 49 800 человек.

По данным отчета Министерства образования и науки в ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено достижение результата на 2021 год в части создания 81 173 мест новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

2) Создание в 80 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом (79,3 млн рублей).

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2021 год № 92-р утвержден перечень 80 сельских школ, для приобретения открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) для 60 школ, проведения капитального ремонта 15 спортзалов и установки 5 футбольных мини-полей.

В 2021 году в 60 школах завершена установка воркаут-площадок. В 5 муниципальных образованиях (Тарумовский район, Хивский район, Хасавюртовский район, Каякентский район, Магарамкентский район) установлены мини-футбольные поля. Завершены ремонтные работы 15 спортивных залов.

По данным отчета в ГИИС «Электронный бюджет» обеспеченно достижение результата на 2021 год в части обновления материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, нарастающим итогом – 392 единицы

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Успех каждого ребенка	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	59	59	100
2		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT- куб», возрастающий	3	5,3	176,6
3		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий	30	127,3	424,3
4		Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед.	1	1	100

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, не выполнены в полном объеме. В то же время обеспечено достижение плановых значений по всем 4 целевым показателям регионального проекта.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- обеспечить качественную подготовку аукционной документации, а также соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения рисков приостановления процедур по заключению контрактов.

- в план мероприятий включить мероприятия по кадровому обеспечению физкультурно-оздоровительных комплексов.



4.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» было запланировано создание Центра цифрового образования «IT клуб» в г. Буйнакск на базе МБОУ «Гимназия города Буйнакск имени Анатолия Хуторянского».

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансированы и освоены расходы в сумме 11,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета - 11,58 млн рублей, республиканского бюджета – 0,12 млн рублей).

Заключены 3 контракта на сумму 11,7 млн рублей, или 100 % от планового объема (осуществлена поставка оборудования в полном объеме).

В 2019-2020 годах на базе ГБУ ДО РД «Малая Академия наук» г. Махачкалы и МБОУ «Каспийская гимназия № 11» открыты Центры цифрового образования детей «IT-клуб».

В сентябре 2021 года начал функционировать Центр цифрового образования «IT клуб» в г. Буйнакске на базе МБОУ «Гимназия города Буйнакск имени Анатолия Хуторянского», где обучаются 253 школьника.

По состоянию на 1 января 2022 года охват обучающихся от 12 до 18 лет, прошедших обучение в Центрах «IT – клуб» городов Махачкала, Каспийск и Буйнакск, составил 8934 человек.

Преподаватели центра цифрового образования прошли курсы повышения квалификации по федеральным программам.

По состоянию на 1 января 2022 года 102 образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (результат 2020 года).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 2021 году следует отметить, что мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме. В то же время, достижение целевого показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», базовое значение (31.12.2020 г.) обеспечено за счет реализации мероприятий, реализованных в 2020 году. Мероприятия по обеспечению реализации цифровой трансформации системы образования в 2021 году не реализовывались.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает осуществлять мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в комплексе с мероприятиями по цифровой трансформации в целях улучшения показателей по «цифровой зрелости» системы образования Республики Дагестан.



4.4. Региональный проект «Социальная активность»

В ходе реализации регионально проекта «Социальная активность» было запланировано создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) и увеличение общей численности граждан в Республики Дагестан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) до 60,8 тыс. человек, в том числе за счет участия в шести практиках поддержки добровольчества во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (волонтерский корпус «Общественные инспекторы охраны культурного наследия», проект «Школа добрых дел «Наставник», развитие серебряного добровольчества «Лига выдающихся джентльменов», развитие добровольчества в паллиативной сфере, создание волонтерского корпуса «Феникс», создание волонтерского корпуса «Волонтеры инклюзии»).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 6,09 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 6,03 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,06 млн рублей), или 100% от утвержденных назначений.

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 6,09 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Заключено 14 контрактов на сумму 6,09 млн рублей, или 100 % от планового объема, в том числе:

- организация транспортных расходов – 1 контракт на сумму 89,1 тыс. рублей;

- услуги наемных работников для организации мероприятий – 1 контракт на сумму 705,0 тыс. рублей;

- поставка звукового оборудования - 1 контракт на сумму 50,0 тыс. рублей;

- услуги тренеров для проведения мероприятий – 2 контракта на общую сумму 416,5 тыс. рублей;

- обеспечение проживания и питания при проведении мероприятий – 1 контракт на сумму 1 342,5 тыс. рублей;

- поставка канцтоваров - 1 контракт на сумму 145,63 тыс. рублей;

- услуги полиграфии - 2 контракта на сумму 356,8 тыс. рублей;

- поставка атрибутики - 1 контракт на сумму 657,83 тыс. рублей;

- поставка мебели - 1 контракт на сумму 488,0 тыс. рублей;

- услуги видеографа - контракт на сумму 106,0 тыс. рублей

- поставка оргтехники и оборудования - контракт на сумму 1 024,85 тыс. рублей;

- создание дополнительного муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества и дооснащение регионального ресурсного центра поддержки добровольчества – 705,18 тыс. рублей (на сумму экономии).

В Дагестане реализуются следующие направления добровольческой деятельности: экологическое, социальное, сервисное, медицинское, инклюзивное, культурное, волонтерство в сфере образования и в сфере формирования комфортной городской среды, волонтеры Победы, поиск людей, а также юные добровольцы.

В 2021 году проведены мероприятия по стажировке координаторов добровольцев (волонтеров) на базе центров поддержки добровольчества - 327 человек (план – 229 человек).

На площадке Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Республики Дагестан проведен конкурс «Развитие сети ресурсных центров добровольчества в Дагестане» в рамках реализации субсидии «Регион добрых дел». По результатам конкурса были отобраны города Махачкала, Каспийск, Дербент, Ахтынский и Бабаюртовский районы, в которых созданы ресурсные центры добровольчества.

Проведена информационная компания с охватом 126,9 тыс. человек (план 105,1 тыс. человек).

Проведено 15 встреч в формате онлайн/офлайн с охватом молодежи более 5 100 человек.

В рамках Фестиваля творческих сообществ «Таврида – ART», проведены презентации образовательных программ для студентов профильных средних специальных и высших учебных заведений Республики Дагестан с охватом более 450 человек

Сформирован корпус «Волонтеры туризма Республики Дагестан». Проведен набор волонтеров на участие во Всероссийской переписи населения - 2020 - 550 человек в возрасте от 16 до 50 лет.

На 1 января 2022 года по целевому показателю «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами) поддержки добровольчества (волонтерства) образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность составило 71,0 тыс. человек, или 116,8 % от планового значения (60,8 тыс. человек).

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году мероприятия, обеспеченные финансированием, и целевые показатели регионального проекта выполнены.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает осуществлять мероприятия по развитию добровольчества в сфере паллиативной помощи, в том числе с вовлечением молодежи в решение социальных проблем семей с неизлечимо больными детьми, и формированию добровольческой практики системной помощи детским больницам.



4.5. Региональный проект «Молодые профессионалы»

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта запланировано обучение более 4 тыс. человек по программам дистанционного обучения, а также увеличение доли обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, за счет проведения следующих мероприятий:

- оснащение 8 мастерских по направлению «Информационные технологии» в ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» и ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе»;

- создание Центра опережающей профессиональной подготовки.

На реализацию регионального проекта заключены соглашения о предоставлении грантов из федерального бюджета, в соответствии с которыми профинансированы и полностью освоены расходы в сумме 89,84 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 75,83 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 8,86 млн рублей, иные средства – 5,15 млн рублей).

Заключены 18 контрактов на сумму 89,84 млн рублей на оснащение 8 мастерских, в том числе:

- оснащение 4 мастерских ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» по направлению «Транспорт и логистика» - 9 контрактов на сумму 38,6 млн рублей;

- оснащение 4 мастерских ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» по направлению «Машиностроение» - 8 контрактов на сумму 49,9 млн рублей.

Поставка оборудования осуществлена по всем контрактам.

В рамках реализации регионального проекта проведены следующие мероприятия.

8 сентября 2021 года состоялось открытие 4 мастерских в ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» по компетенциям: «Инженерный дизайн САД», «Аддитивные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

30 сентября 2021 года начали функционировать 4 мастерские по компетенции «Обслуживание транспорта и логистика» в ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж».

В 2020 г. оснащено современным оборудованием 5 мастерских по направлению «Информационные технологии» ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева». Таким образом, на 1 января 2022 года создано 13 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.

В Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан (создан в 2020 году) прошли обучение 3 394 человек, из них:

- 111 слушателей по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

- 142 педагогических работника прошли обучение по программам повышения квалификации «Цифровая грамотность педагога», «Применение активных и интерактивных технологий в образовании», «Проектирование и создание электронных образовательных курсов в системе MOODLE» (удостоверение о повышении квалификации);

- 118 студентов прошли обучение по программам профессиональных модулей для среднего профессионального образования;

- 30 студентов прошли обучение по программам профессионального обучения по профессии «Оператор ЭВМ»;

- 223 студентов по общеразвивающей программе (для детей и взрослых) «Основы бережливого производства»;

- 279 школьников прошли обучение первой профессии с подключением ресурсов колледжей - сетевиков по практикоориентированным программам профессионального обучения по следующим профессиям: «Цифровой куратор», «Спасатель», «Повар», «Медсестра по уходу за больными», «Портной», «Парикмахер», «Оператор ЭВМ».

Профориентационной работой охвачены 61 017 человек.

В регионе зарегистрировано 37 центров проведения демонстрационного экзамена. В 2021 году 2 223 учащихся сдали дистанционный экзамен, из них в рамках промежуточной аттестации – 356, государственной итоговой аттестации – 1867. Проведено 136 демонстрационных экзаменов (ПА – 21, ГИА - 115).

Выполнение целевого показателя регионального проекта представлено в следующей таблице:

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Молодые профессионалы	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, возрастающий, процент	2,2	2,3	104,5
2		Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, возрастающий, процент	58	58,96	101,7
3		Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, единица	4 225	62 424	1 477,5

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает совместно с центрами занятости населения в городах и районах осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников, прошедших обучение в мастерских.



4.6. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В рамках национального проекта «Образование» реализуется региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который позволит привить детям духовные и нравственные ценности.

В ходе реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2021 году было запланировано:

- проведение более 7 тыс. мероприятий (Российское движение школьников, Юнармия, ТОКС), направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;

- внедрение рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (до 90 %).

Финансирование, заключение контрактов, достижение целевых показателей по региональному проекту в 2021 году не запланировано.

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Дагестан «О внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях среднего профессионального образования Республики Дагестан» от 25 августа 2021 г. № 08-01-455/21 принята примерная региональная программа воспитания Республики Дагестан, целью которой является разработка и внедрение программы воспитания обучающихся в школах и профессиональных образовательных организациях.

22 августа 2021 года в муниципальных образованиях республики прошла акция «Триколор» приуроченная ко Дню Государственного флага России. В мероприятии приняло участие 20 000 человек;

22 мая 2021 года во Дворце спорта им. Али Алиева прошел Двадцатый Чемпионат Дагестана по армейскому рукопашному бою на Кубок Главы Республики Дагестан (150 спортсменов, 8 команд Южного военного округа, 25 военно-спортивных клубов из районов и городов Дагестана).

Выполнение мероприятия «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами», (план 155 тыс. человек) обеспечено в ходе проведения Всероссийской акции «Окна Победы», посвященная 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (300 000 человек из городов и районов Дагестана).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает в целях улучшения материально-технической базы системы патриотического воспитания провести оценку эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты.



5. Национальный проект «Жилье и городская среда»



Куратор национального проекта:

Мажонц М. Л.

Врио заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Сулейманов А. А.

Врио министра строительства
Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Российской Федерации являются:

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее, чем до 120 млн. кв. метров в год (до 2030 г.);

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

 - улучшение качества городской среды в полтора раза (до 2030 года);

 - создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

- повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 4 региональных проекта:

- 1) «Жилье»;

- 2) «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»;

- 3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

- 4) «Чистая вода».


Реализацию национального проекта осуществляет Министерство строительства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

В 2021 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» профинансированы расходы в сумме 1 801,0 млн рублей, или 99,2 % от годовых назначений (1 815,4 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 1 781,0 млн рублей, или 98,1 % от годовых назначений (1 815,4 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 34,4 млн рублей, или 1,9 % от объема годовых назначений.

Финансирование национального проекта
«Жилье и городская среда» в 2021 году

млн рублей

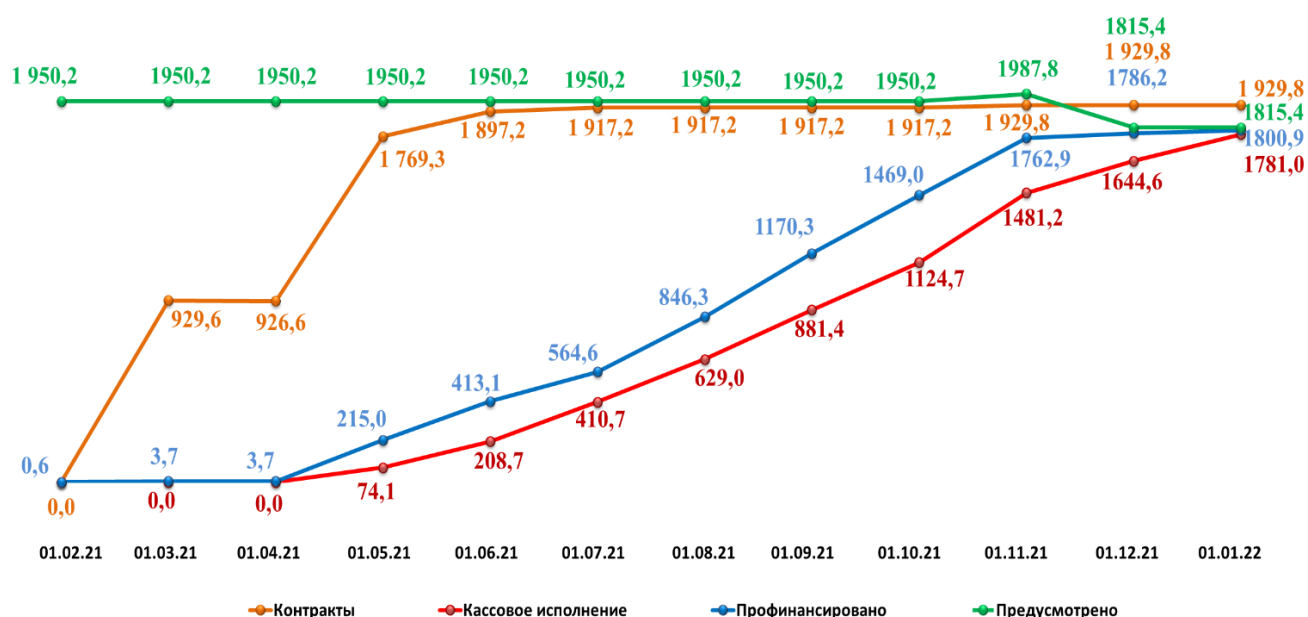

В ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по 3 региональным проектам заключено 207 контрактов на общую сумму 1 929,8 млн рублей, или 98,1 % от годового объема (211 контрактов). Не заключены 4 контракта по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Информация о реализации региональных проектов национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Дагестан за 2021 год представлена в следующей таблице.

млн рублей

Национальные (региональные) проекты	Профинансировано	Освоено за 2021 год		Остатки средств на 1 января 2022 г.	
		Сумма	%	Сумма	%
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»	1 800,9	1 781,0	98,1	34,4	1,9
1. «Жилье»	0	0	0	0	0
2. «Формирование комфортной городской среды»	1 003,5	1 003,5	100,0	0	0
3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	72,44	52,6	60,5	34,3	39,5
4. «Чистая вода»	725,0	724,9	100	0,12	0,02

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта «Жилье и городская среда» представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значение показателя		%
			План	Факт	
1	Жилье	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	0,937	1,03	110
2	Комфортная городская среда	Индекс качества городской среды, возрастающий, балл	172	172	100
3		Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	499	519	104,0
4		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. нарастающий	3	3	100
5		Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	30	30	100
6		Количество городов с благоприятной городской средой	3	3	100
7		Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, возрастающий, процент, единица,	9	9	100
8		Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	100	111,1
9		Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,	15	15	100
10	Сокращение непригодного жилого фонда	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий, процент и	1,13	1,884	166,7
11		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий, тыс. человек	0,07	0,172	245,7
12	Чистая вода	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий, процент	71,1	71,1	100
13		Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий, процент	90,0	90,0	100
14		Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.	10	6	60



5.1. Региональный проект «Жилье».

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Жилье» предусматривалось увеличение объема жилищного строительства до 937,0 тыс. кв. метров.

В виду отсутствия заявок муниципальных образований и готовых проектов с положительным заключением государственной экспертизы, Республика Дагестан не приняла участие в отборе субъектов для финансирования в 2021 году регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

По данным Дагестанстата за январь-декабрь 2021 года введено 1 031,2 тыс. кв. метров общей площади жилья (106,3 % к январю - декабрю 2021 года), в том числе: индивидуальных жилых домов – 486,3 тыс. кв. м (99,6 % по сравнению с 2020 годом), многоквартирных домов – 545 тыс. кв. м (113 % по сравнению с 2020 годом).

С учетом данных Дагестанстата в 2021 году обеспечено достижение объема ввода жилья в объеме 1 031,2 тыс. рублей, или 110 % от планового значения (937,0 тыс. кв.м)

Проведенный анализ действующих в 2021 году разрешений на строительство многоквартирных жилых домов (далее – МКД) общей площадью 2 406,0 тыс. кв. метров, показал, что 113 МКД с общей площадью 1 518,9 тыс. кв. метров, срок действия разрешений на строительство, которых истекает в 2021 году, не могут быть введены в эксплуатацию в текущем году. Данные многоквартирные дома, имеют низкий уровень строительно-технической готовности, не позволяющий получить заключение о соответствии построенного объекта и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году, в том числе:

- 17 МКД со степенью готовности 10-15 % (котлован, фундаменты);
- 29 МКД со степенью готовности 25-50 % (1-5 этажи);
- 42 МКД со степенью готовности 50-70 % (6-10 этажи);
- 25 МКД со степенью готовности 70-90 % (10-й этаж и выше).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает проводить мероприятия по развитию высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства в Республике Дагестан, а также реализовывать программы по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства, реализуемые в составе федерального проекта «Жилье». В условиях дефицита высококвалифицированных кадров строительных специальностей в Республике Дагестан решение данной задачи обеспечило бы достижение общественно значимого результата для республики.



5.2. Региональный проект «Комфортная городская среда в Республике Дагестан».

В ходе реализации регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» в 2021 году было предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за счет проведения следующих мероприятий:

- благоустройство 223 территорий в 48 муниципальных образованиях Республики Дагестан (10 городов и 38 муниципальных районов), в том числе 142 общественных и 81 дворовых территорий - 908,21 млн рублей;

- благоустройство улицы Рзаева города Дербент Республики Дагестан» (Ворота Магалов) - 88,7 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансировано 1 003,5 млн рублей, или 100 % годовых назначений (за счет федерального бюджета – 970,04 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 9,35 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено средств в сумме 1 003,46 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключены 149 контрактов, или 100 % от планового объема, на выполнение работ по благоустройству 223 (81 дворовых и 142 общественных территорий с учетом 5 дополнительных территорий) на сумму 989,35 млн рублей.

По результатам торгов образовалась экономия в размере 60,96 млн рублей, из которых 22,76 млн рублей направлено на благоустройство 5 дополнительных территорий в г. Каспийск, Ботлихский район, Ногайский район, Сулейман- Стальский район, Хивский район.

Завершены работы по всем 223 территориям, или 100 % от планового объема.

По результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «исторические поселения» победителем в 2020 году стал проект города Дербент «Благоустройство улицы Рзаева города Дербент Республики Дагестан» (Ворота Магалов).

На реализацию мероприятия профинансировано 87,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 44,5 млн рублей, средства администрации городского округа «город Дербент» - 43,2 млн рублей). Публичные мероприятия по открытию данного объекта проведены 3 апреля 2021 года.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значение показателя		%
			План	Факт	
1	Комфортная городская среда	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %, возрастающий	9,0	9,0*	100
2		Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий	499	519	104,0
3		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*	3	3	100
4		Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	30	30*	100*
5		Количество городов с благоприятной городской средой	3	3*	100
6		Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	172	172*	100
7		Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	100*	111,1
8		Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	15	15	100

* итоговое значение по итогам 2021 года будет рассчитано Министерством строительства Российской Федерации не позднее 1 апреля 2022 года.

В 2021 году запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме и обеспечено достижение целевых показателей реализации регионального проекта.

Всего с начала реализации регионального проекта в Республике Дагестан благоустроены 519 общественных территорий, а также реализованы 3 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**

- органам исполнительной власти и муниципалитетам усилить контроль за реализацией государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»;
- рекомендовать городским округам и муниципальным районам увеличить долю софинансирования из местного бюджета на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;
- обеспечить синхронизацию выполнения работ на благоустраиваемых объектах с мероприятиями, реализуемыми в муниципальных районах в рамках федеральных и республиканских программ: «Безопасные и качественные дороги», «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», «Доступная среда»;
- принять меры по своевременному заключению государственных контрактов с целью обеспечения исполнения обязательств поставщиками в установленные сроки;
- при заключении контрактов и определении сроков выполнения мероприятий регионального проекта предусмотреть резерв времени в целях снижения рисков возможных нарушений графика выполнения работ;
- проводить претензионно-исковую работу по некачественному выполнению обязательств в соответствии с заключенными контрактами;
- принять меры по устранению перечня недоделок, допущенных при проведении строительных работ и монтаже оборудования, за счет собственных средств подрядчика;
- обеспечить оперативный контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству территорий;
- исключить факты неэффективного использования выделенных бюджетных средств;
- использовать «Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды с учетом особенностей территорий, на основе мнения жителей», а также Методические рекомендации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 г. № 913/пр;
- определить персональную ответственность руководителей органов исполнительной власти и муниципальных образований за качественным завершением регионального проекта и достижением утвержденных индикативных показателей;
- обеспечить ведение претензионной работы с подрядными организациями в части устранения, выявленных в течение гарантийного срока недостатков.



5.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах».

Согласно указанной программе в рамках 4 этапов до 31 декабря 2023 года предусмотрено расселить 227 человек (72 семьи) и ликвидировать аварийный жилищный фонд площадью 2,75 тыс. кв. метров.

Согласно Соглашению от 3 марта 2021 года, заключенному Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, принято решение о досрочном завершении в 2021 году программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Непосредственными заказчиками и исполнителями мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда являются муниципальные образования, на территориях которых реализуется программа переселения, а именно администрации муниципальных образований «город Махачкала» и «Унцукульский район».

На реализацию регионального проекта в 2021 году профинансированы расходы в сумме 72,44 млн рублей, или 83,3 % от годовых назначений (86,9 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 52,63 млн рублей, или 60,5 % от объема годовых назначений (86,95 млн рублей).

Заключены 49 контрактов (этап 2020-2021 годов, этап 2021-2022 годов и этап 2022-2023 годов), или 92,5 % от планового объема (53 контракта) на сумму 77,1 млн рублей.

В рамках досрочного завершения программы переселения расселено 56 семей (172 чел.), не расселёнными остаются 16 семей (55 чел.), в том числе: на территории г. Махачкалы – 8 семей (27 чел.), на территории муниципального района «Унцукульский район» – 8 семей (28 человек).

Из 16 (не расселенных) семей осталось заключить соглашения с 4 семьями на выкуп жилых помещений на территории г. Махачкалы, в том числе: в связи с судебным процессом – 3 соглашения, с передачей права собственности на жилье на правах наследования – 1 соглашение.

Следует отметить, что средства Фонда содействию реформирования

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с запросом на финансирование регионального проекта по заключенным контрактам (этап 2020-2021 годов, этап 2021-2022 годов и этап 2022-2023 годов) поступили в Республику Дагестан 29 декабря 2021 года и не доведены до собственников в полном объеме по состоянию на 1 января 2022 года.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значение показателя		%
			План	Факт	
1	Сокращение непригодного жилого фонда	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий, процент и	1,13	1,884	166,7
2		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий, тыс. человек	0,07	0,172	245,7

В рамках ускоренной реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Унцукульского района проведена оценка жилых помещений в аварийном многоквартирном доме и жильцам данного дома предложена оценочная выкупная стоимость.

Согласно утвержденному 31 марта 2021 года Главой г. Махачкалы План-графику ускоренного завершения программы переселения в 2021 году, заключение контрактов на приобретение жилых помещений для нанимателей было запланировано не позднее июля 2021 года.

Следует отметить, что администрацией г. Махачкалы не на должном уровне ведется разъяснительная работа с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, в том числе в части определения наиболее подходящего для жильцов способа расселения (выкуп жилого помещения, приобретение жилых помещений либо строительство нового многоквартирного дома), что приводит к затягиванию сроков заключения договоров с жильцами аварийных многоквартирных домов.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- муниципальным образованиям, в целях недопущения судебных разбирательств с гражданами, жилье которых попадает под расселение из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан, привлечь специализированные организации для определения технического состояния и аварийности жилых домов.



5.4. Региональный проект «Чистая вода».

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 71,1 % и доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 90,0 % путем строительства и реконструкции 6 объектов водоснабжения, с завершением строительства 5 объектов в 2021 году и 1 объекта в 2022 году, в том числе:

- реконструкция системы водоснабжения в г. Кизляр;
- реконструкция межпоселкового водовода «Верхнее Казанище – Бетаул – Кырлар» Буйнакского района;
- водоснабжение в с. Хунзах Хунзахского района;
- строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского района;
- реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт;
- водоснабжение сел Батлаич Хунзахского района (переходящий на 2022 год).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

На 1 января 2022 года профинансированы средства в сумме 725,03 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 717,8 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 7,25 млн рублей).

Освоено 724,9 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений (725,03 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 0,12 млн рублей, или 0,02 % от объема годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключено 9 контрактов, или 100 % от запланированного объема на общую сумму 863,37 млн рублей.

Следует отметить, что общий объем финансирования на реализацию регионального проекта на 2021 год первоначально составлял 915,06 млн рублей (за счет федерального бюджета – 905,9 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 9,15 млн рублей).

Однако, администрации муниципалитетов систематически не соблюдали график производства работ и ежемесячный план кассового освоения средств, а также не принимали должных мер по наращиванию динамики строительных работ. В результате Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях исключения возможных рисков неосвоения средств из федерального бюджета, заключено дополнительное

заклучение с Правительством Республики Дагестан об уменьшении бюджетных ассигнований, в соответствии с которым общий объем финансирования на 2021 год уменьшен на 170,5 млн рублей и составил 725,03 млн рублей (средства федерального бюджета - 717,78 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 7,25 млн рублей). Соответственно были уменьшены целевые показатели регионального проекта и сроки ввода объектов в эксплуатацию.

**Перечень объектов, запланированных построить в ходе реализации
регионального проекта «Чистая вода»
национального проекта «Жилье и городская среда»**

тыс. рублей

№	Стройки и объекты	Мощность	Стоимость по контракту	готовность объекта %
	Итого		863,37	
1	Реконструкция межпоселкового водовода «В. Казанище – Бетаул-Кырлар», Буйнакский район	10,26 км.	169,0	95
2	Реконструкция систем водоснабжения города Кизляр (3 контракта)	30,64 км.	219,72	95
3	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт	23,07 км.	397,93	95
4	Водоснабжение с. Хунзах, Хунзахского района, РД	17,02 км.	44,13	95
5	Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского района	1200 куб. м/сут.	24,37	99
6	Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района (переходящий объект)	18,04 км.	8,21	100

Из 5 объектов с запланированным вводом в эксплуатацию в 2021 году, ввод в эксплуатацию 4 объектов перенесен на 2022 год, в том числе:

- реконструкция межпоселкового водовода «Верхнее Казанище -Бетаул Кырлар» Буйнакский район - 169,0 млн рублей;
- реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра - 219,7 млн рублей;
- реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт (переходящий на 2022 год) – 397,9 млн рублей;
- водоснабжение с. Хунзах Хунзахского района - 44,1 млн рублей.
- строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского района (ввод в эксплуатацию в 2021 г.) – 24,37 млн рублей;
- водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района (переходящий на 2022 год) - 42,5 млн рублей.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Чистая вода	Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	71,1	72,0*	101,3
2		Доля городского населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	90,0	90,0*	100
3		Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.	10,0	6	60,0

* предварительно

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» предусмотрено достижение 2 целевых показателей, которые рассчитываются по итогам года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан. По итогам подсчета Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Республике Дагестан указаны предварительные значения.

За период реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Республики Дагестан с 2019 года по 2020 год построены 5 объектов водоснабжения. В связи с переносом ввода в эксплуатацию 4 объектов водоснабжения с 2021 года на 2022 год фактически реализовано 6 объектов, вместо предусмотренных 10 объектов.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**

- принять комплекс мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, допущенных в ходе реализации регионального проекта;
- принять меры по своевременной разработке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы по объектам водоснабжения, запланированным к строительству в 2022 году;
- при разработке проектно-сметной документации предусмотреть обязательное наличие обеззараживающей бактерицидной установки на объекте водоснабжения;
- закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд осуществлять строго в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- предусмотреть персональную ответственность глав муниципальных образований и городских округов за качеством выполнения работ и достижением утвержденных показателей.



6. Национальный проект «Экология»



Куратор национального проекта:
Мажонц М.Л.
Врио заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Гамидов Р. М.
Врио министра природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному
хозяйству Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года N 474) основными целями реализации национального проекта «Экология» в Российской Федерации являются:

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;

- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;

- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий и другие.


В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» реализуются 4 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Чистая страна»;
- 2) «Комплексная система обращения с ТКО»;
- 3) «Сохранение уникальных водных объектов» (с 2023 года);
- 4) «Сохранение лесов»;

Ответственными исполнителями за реализацию национального проекта являются Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан (региональный проект «Сохранение лесов»).

Финансирование национального проекта «Экология» в 2021 году

млн рублей

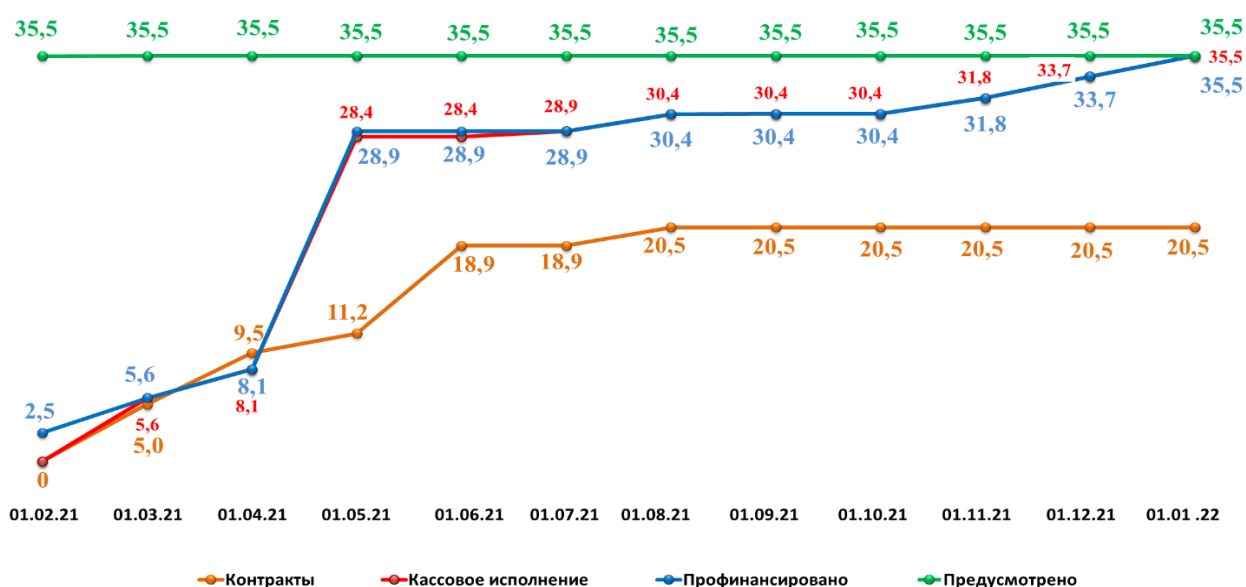

В 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» профинансированы расходы в сумме 35,52 млн рублей, или 100% от годовых назначений (в том числе за счет средств федерального бюджета – 31,32 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,5 млн рублей, внебюджетных средств (ГБУ «Республиканские леса») - 3,7 млн рублей).

На 1 января 2022 фактически освоено 35,52 млн рублей, или 100% от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта заключены 16 контрактов на общую сумму 20,50 млн рублей, или 100 % от планового объема контрактов.

Финансирование и заключение контрактов осуществлено по региональному проекту «Сохранение лесов».

Следует отметить, что в 2021 году в целях реализации мероприятий и достижения целевых показателей национального проекта «Экология» в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» (утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года N 657) дополнительно профинансированы средства республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 87,85 млн рублей, в том числе по:

- *региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* на разработку проектно-сметной документации по строительству 5 мусоросортировочных комплексов - 40,0 млн рублей. Освоено 4,4 млн рублей, или 11,0 % от объема финансирования;

- *региональный проект «Чистая страна»* на разработку проектно-сметной документации по рекультивации 4 несанкционированных свалок - 47,85 млн рублей. Кассовое исполнение отсутствует.

Выполнение целевых показателей национального проекта «Экология» представлено в следующей таблице:

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Комплексная система обращения с ТКО	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО, убывающий	100	100	100
2		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	39	0	0
3		Количество разработанных электронных моделей.	100	100	100
4		Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	90	90	100
5	Сохранение лесов	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %.	100	100	100



6.1 Региональный проект «Чистая страна».

В рамках реализации проекта «Чистая страна» к 2023 году запланирована ликвидация 5 свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены в границах городских округов (г. Буйнакск, г. Каспийск, г. Хасавюрт, г. Южно-Сухокумск).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Общий объем финансирования на 2023-2024 годы предполагается в сумме 586,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 556,7 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 29,30 млн рублей).

В 2021 году финансирование и заключение контрактов в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрено.

Региональный проект реализуется в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» (утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года N 657), согласно которой в 2021 году на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированных свалок в городах: Буйнакск, Каспийск, Южно-Сухокумск, Хасавюрт за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан профинансировано 47,85 млн рублей⁷.

В целях подготовки проектно-сметной документации 28 декабря 2021 года заключены 4 контракта на общую сумму 33,84 млн рублей (экономия - 14,0 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года на проведение работ перечислен аванс (30 %) в сумме 10,2 млн рублей.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- обеспечить разработку проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированных свалок и проведение экспертизы в установленные сроки;

- разработать и внедрить программу экологического просвещения населения, направленную обучение разделному сбору отходов и снижению образования отходов.

⁷ распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2021 № 363-р



6.2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в целях решения проблем, связанных с отсутствием инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), были запланированы мероприятия по подготовке к строительству 5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения твердых коммунальных отходов.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Для строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов ТКО выделены земельные участки в городах Дербент (площадью 3 га), Кизляр (2,3 га), а также Буйнакском (3,5 га), Хасавюртовском (10 га), Сулейман-Стальском (1 га) районах.

В 2021 году на разработку проектно-сметной документации профинансированы средства в сумме 40,0 млн рублей (в 2020 году освоено 21,68 млн рублей) на строительство 5 мусоросортировочных комплексов в Республике Дагестан за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, подготовлена проектная документация по следующим объектам:

- «Мусоросортировочный комплекс производительностью 100 тыс. тонн в год на территории Хасавюртовского района Республики Дагестан»;
- «Мусоросортировочный комплекс производительностью 15 тыс. тонн в год на территории с. Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан»;
- «Мусоросортировочный комплекс производительностью 100 тыс. тонн в год на территории Дербентского района Республики Дагестан»;
- «Мусоросортировочный комплекс производительностью 50 тыс. тонн в год на территории Кизлярского района Республики Дагестан»;
- «Мусоросортировочный комплекс производительностью 140 тыс. тонн в год на территории Буйнакского района Республики Дагестан».

По состоянию на 1 января 2022 года проектно-сметная документация направлена в ГА РД «Государственная экспертиза» для получения положительного заключения государственной экспертизы.

На 1 января 2022 года освоение выделенных средств составило 4,4 млн рублей, или 11,0 % от объема финансирования.

После получения заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации требуется определение источников финансирования на строительство мусоросортировочных комплексов. Однако, до настоящего времени не определен механизм субсидирования проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на федеральном уровне.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Комплексная система обращения с ТКО	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	100	100	100
2		Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, %.	90	90	100

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году обеспечено достижение плановых значения по 2-м целевым показателям. Однако низкие темпы реализации мероприятий регионального проекта создают риски недостижения целей, задач и показателей в области обращения с ТКО, определенных Указом Президента России от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Согласно требованиям, установленным Министерством природы и экологии Российской Федерации, к 1 июня 2022 года во всех субъектах Российской Федерации должно быть завершено оформление документов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов.

Неопределенность с источниками финансирования строительства 5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения твердых коммунальных отходов может привести к срыву плановых сроков начала реализации мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**

- обеспечить разработку проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированных свалок и проведение экспертизы в установленные сроки;

- подготовить предложения по определению источниками финансирования строительства 5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения твердых коммунальных отходов с привлечением ресурсов частного сектора на принципах государственно-частного партнерства.

- включить в план реализации мероприятий регионального проекта мероприятия по созданию развитой инфраструктуры обращения с отходами.



6.3. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году предусматривалось обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов, увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, формирование запаса лесных семян для лесоразведения, оснащение учреждений специализированной и лесопожарной техникой для проведения мероприятий по лесовосстановлению и охране лесов от пожаров, а также повышение качества эффективности работ на лесных участках.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» профинансированы расходы в сумме 35,52 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет средств федерального бюджета - 31,32 млн рублей, средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 0,5 млн рублей, внебюджетных средств (ГБУ «Республиканские леса») - 3,7 млн рублей).

Профинансированные средства направлены на:

- лесовосстановительные работы - 11,28 млн рублей (в том числе за счет внебюджетных источников - 2,7 млн рублей). Площадь лесовосстановления составила 464 гектара, или 100 % от планового объема на 2021 год.

- работы по лесоразведению – 0,38 млн рублей. Проведено лесоразведение на 50 гектарах;

- заготовку 5,5 тонн семян лесных растений (сосны, акации, лоха, вяза, ясени, желудей дуба) - 1,05 млн рублей (в том числе за счет внебюджетных источников - 1,0 млн рублей);

- оснащение учреждений лесопожарной техникой и оборудованием – 12,08 млн рублей. Осуществлена поставка техники и оборудования (автоцистерн (3 ед), автомобилей ГАЗ 231073 (3 ед), УАЗ Пикап (2 ед), прицепа, вездехода, квадрокоптеров (2 ед), раций (14 шт), ранцевых огнетушителей (120 шт), воздуховок (4 ед);

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием – 8,4 млн рублей. Осуществлена поставка техники (минитрактор Беларусь- 132Н (2 ед), трактор Беларусь – 1021 (3 ед), плуги (3 ед)).

По состоянию на 1 января 2022 года освоение выделенных средств составило 35,52 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключено 16 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 20,5 млн рублей.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Сохранение лесов	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	100	100	100

По итогам реализации регионального проекта запланированные в 2021 году мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты.

В то же время, проведенный анализ реализации регионального проекта в период с 2019 года по 2021 год, показывает на наличие проблем в части проведения мероприятий по профилактике возникновения лесных пожаров и ограничению их распространения.

Согласно Государственной программе Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан» ежегодно объемы лесовосстановительных работ, необходимо выполнить в среднем на площади 500 гектаров. В 2021 году плановое значение по данному показателю составило 464 гектаров (-36 гектаров).

Закупаемая в рамках регионального проекта техника и оборудование не позволяют обеспечить эффективную защиту лесов от пожаров в горных массивах, в виду отсутствия дорог к очагам пожаров. Общая протяженность лесных дорог в Республике Дагестан составляет 2,6 тыс. км, то есть на 1 тыс. га земель лесного фонда приходится 8,2 км дорог (при норме 10 - 12 км на 1,0 тыс. га). Мероприятия по созданию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров в рамках реализации регионального проекта не предусмотрены.

Высокая интенсивность горения при лесном пожаре в горных районах ограничивает или полностью исключает возможность его тушения наземными силами. В данном случае, тушение лесных пожаров с использованием противопожарной авиации наиболее действенный способ погасить очаг возгорания и не дать распространиться огню. Однако, в рамках регионального

проекта мероприятия по повышению роли противопожарной авиации при тушении пожаров в лесных массивах Республики Дагестан не предусмотрены (обеспечение специализированной техникой, оборудованием, снаряжением)

Не предусмотрены также мероприятия по устройству пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, что затрудняет возможности тушения пожаров.

Согласно национальному проекту «Экология», к 2024 году объемы вырубок и потерь лесов от пожаров должны сравняться с объемами лесовосстановления. В то же время, мероприятия национального проекта по восстановлению лесов ограничиваются посадками леса и обеспечением запасами семян, малоэффективны без проведения последующих агротехнических и лесоводственных уходов. Отсутствие ухода за лесными культурами, обесценивает ранее проведенные лесовосстановительных мероприятия.

С целью предупреждения вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста древесины в лесах республики необходимо также проведение комплекса работ, включающих санитарно-оздоровительные мероприятия и лесопатологические обследования.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- провести мероприятия по оборудованию точек водоснабжения (открытые противопожарные водоемы), противопожарных просек вблизи лесных массивов;
- расширить перечень мероприятий регионального проекта за счет проведения мероприятий по профилактике возникновения лесных пожаров и ограничению их распространения.
- включить мероприятия по обеспечению последующих агротехнических лесоводственных и агротехнических уходов в региональный проект «Сохранение лесов»;
- включить в региональный проект мероприятия по повышению роли противопожарной авиации при тушении пожаров в лесных массивах Республики Дагестан (обеспечение необходимой специальной техникой, оборудованием, снаряжением);
- обеспечить соответствующие условия содержания техники и оборудования приобретенного в рамках реализации регионального проекта (размещение в постоянных или временных гаражах либо на оборудованных автостоянках).



7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Куратор национального проекта
Эмеев Б. Э.

Врио Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Гаджимурадов Ш. У.

Врио министра транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Российской Федерации являются:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;
- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 %;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.


В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта:

- 1) «Дорожная сеть»;
- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
- 3) «Безопасность дорожного движения».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

**Финансирование национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году**

млн рублей

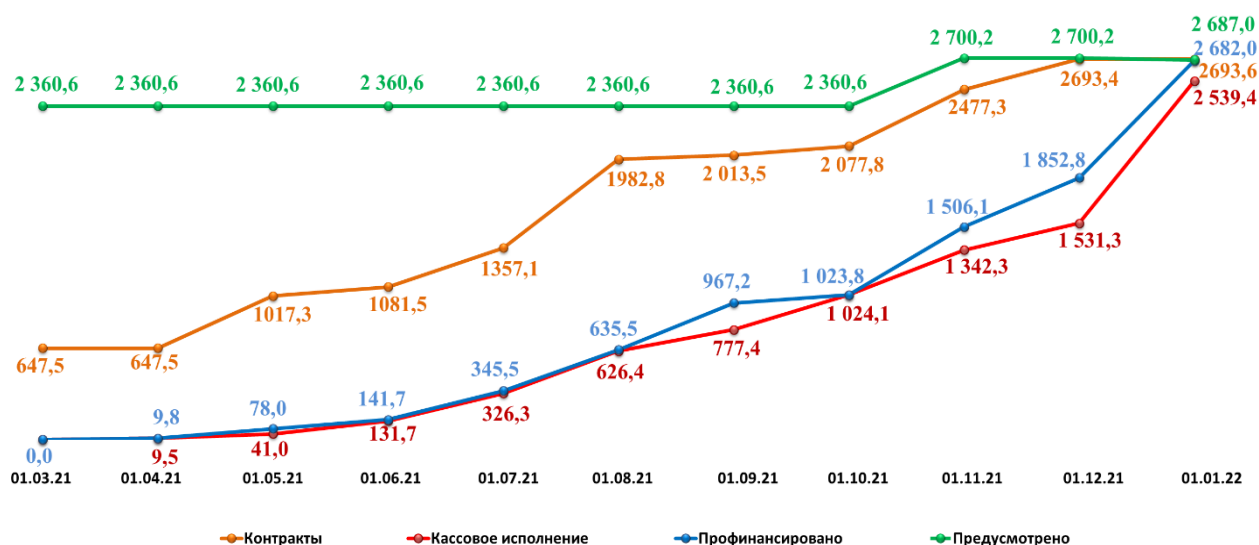

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2021 году на реализацию национального проекта были предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 687,0 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 1 186,7 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 500,23 млн рублей).

На 1 января 2022 года профинансированы расходы в сумме 2 682,0 млн рублей, или 99,8 % от годовых назначений (2 687,0 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 2 539,4 млн рублей, или 94,5 % от объема годовых назначений. Неосвоенный остаток средств составил 147,5 млн рублей, или 5,5 % от годовых назначений (в том числе средства федерального бюджета – 22,3 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 125,2 млн рублей).

Заключено 26 контрактов по 2 региональным проектам 100 % от планового количества.

Информация о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Республики Дагестан за 2021 год представлена в следующей таблице.

Национальный проект/региональные Проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено за 2021 год		Остатки средств на 1 января 2022 года	
			Сумма	%	Сумма	%
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	2 686,96	2682,0	2539,4	94,7	147,5	5,3
1. «Дорожная сеть»	2 469,2	2469,2	2469,2	2327,7	141,5	5,7
2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	217,7	217,7	212,8	211,7	6,0	2,8
3. «Безопасность дорожного движения»	0	0	0	0	0	0

Информация о реализации целевых показателей (индикаторов) национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Дорожная сеть	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процент	79	79	100
2		Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий, процент	58,6	58,6	100
3		Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, процент	62,0	62,0	100
4	Развитие дорожного хозяйства	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, процент	7	7	100
5		Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий, процент	10	10	100
6	Безопасность дорожного движения	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (убывающим итогом), человек	11,12	11,12	100
7		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (убывающим итогом), человек	4,27	4,27	100



7.1. Региональный проект «Дорожная сеть».

Согласно паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году было запланировано:

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 58,6 %;

- доведение в Махачкалинской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 79 %, за счет проведения ремонта (содержание), капремонта, реконструкции, а также организации дорожного движения.

В ходе реализации регионального проекта были запланированы мероприятия по ремонту (содержанию), капремонту, реконструкции, а также организации дорожного движения на 142 объектах, из них: 132 объекта улично-дорожной сети (УДС) г. Махачкалы (в том числе: 93 объекта - ремонт и капремонт, организация дорожного движения, 3 автодороги регионального значения, входящие в состав Махачкалинской городской агломерации, 7 дорог регионального значения вне агломерации).

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 2 469,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 1 080 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 389,23 млн рублей).

Следует отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1769-р Республике Дагестан были предусмотрены средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400,0 млн рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Средства направлены в бюджет администрации г. Махачкалы на капитальный ремонт 26,7 км объектов улично-дорожной сети г. Махачкалы.

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 2 327,7 млн рублей, или 94,3 % от объема годовых назначений (2 469,2 млн рублей).

Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 141,5 млн рублей или 5,7 % от годовых назначений, образован за счет:

- **28,9 млн рублей** (в том числе средства федерального бюджета - 22,3 млн рублей), предусмотренных на реконструкцию ул. Коркмасова г. Махачкалы. Завершение работ запланировано в 2022 году. Отставание стало следствием позднего

заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ в связи с задержками с получением экспертизы проектной документации;

- **108,1 млн рублей** (средства регионального бюджета), предусмотренные на реконструкцию а/д Гели-Талги, км 0 - км 4. Контракт от 13 июля 2021 года с ООО «Севкавдорстрой» расторгнут в одностороннем порядке 01 октября 2021 года заказчиком - ГКУ «Дагестанавтодор» в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ. Подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Новый контракт заключен 21 октября 2021 г. с ООО «Нарт». Объект является переходящим на 2022 год, ввод в эксплуатацию в 2021 году не предусматривался;

- **1,92 млн рублей** (средства регионального бюджета), которые остались не востребованными (экономия) по итогам завершения работ (ремонт автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Левашы – В. Гуниб на участке км 57 – км 72, ремонт автомобильной дороги Дербент – Хучни – Хив на участке км 0 – км 16, ремонт автомобильной дороги Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставропольского края на участке км 30 – км 40, реконструкция автомобильной дороги Махачкала-Буйнакск-Левашы-В. Гуниб на участке км 0 - км 3);

- **2,6 млн рублей** (средства регионального бюджета), предусмотренные на строительный контроль за строительством автомобильной дороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» км 0 – км 3+900». В Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год на реализацию мероприятия предусмотрено 6,3 млн рублей, из которых 2,6 млн рублей в соответствии с контрактом переходят на 2022 год.

В целях реализации мероприятий регионального проекта заключены 22 контракта на сумму 2 467,5 млн рублей, или 100,0 % от планового количества контрактов.

Государственным казенным учреждением Республики Дагестан «Управление автодорог Республики Дагестан» по 10 объектам регионального и межмуниципального значения заключены 10 контрактов, в том числе:

- реконструкция а/д Гели-Талги, км 0 - км 4 - контракт № 69/21-РЕК/Р от 21 октября 2021 года на 222,35 млн рублей с ООО "Нарт" (200,0 млн рублей в рамках нацпроекта);

- строительство автомобильной дороги Манаскент – Подъезд от федеральной дороги "Кавказ" к санаторию "Каспий" - контракт №77/21-СТР/Р от 5 июля 2021 года на 420,0 млн рублей (из них в рамках нацпроекта - 341,7 млн рублей);

- содержание автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке км 0 - км 4 - контракт №313/19-РЕМ/Р от 16 декабря 2019 года на 0,68 млн рублей (переходящий объект);

- ремонт автомобильной дороги Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставропольского края на участке км 30 – км 40, Ногайского района РД - контракт №198/20-РЕМ/Р от 14 декабря 2020 года на 96,0 млн рублей;

- ремонт автомобильной дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб на участке км 57 – км 72, Буйнакского района РД - контракт №201/20-РЕМ/Р от 14 декабря 2020 года на 185,8 млн рублей;

- ремонт автомобильной дороги Буйнакск – Кизилюрт км 0 – км 7, Буйнакского района РД - контракт №199/20-РЕМ/Р от 14 декабря 2020 года на 100,5 млн рублей;

- ремонт автомобильной дороги Дербент – Хучни – Хив на участке км 0 – км 16, Дербентского района - контракт №200/20-РЕМ/Р от 18 декабря 2020 года на 126,6 млн рублей;

- реконструкция автомобильной дороги Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб на участке км 0 - км 3 - контракт №33/17-РЕК/Р от 02 мая 2017 года на 137,9 млн рублей (переходящий объект);

- ремонт автомобильной дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке км 15 – км 23 - контракт №155/21-РЕМ/Р от 29 сентября 2021 года на 113,78 млн рублей (25,00 млн рублей в 2021 году в рамках нацпроекта) с ООО "Дорсервис-09";

- ремонт автомобильной дороги Бабаюрт - Гребенская на участке км 0 - км 8 - контракт №154/21-РЕМ/Р от 29 сентября 2021 года на 106,28 млн рублей (25,00 млн рублей в 2021 году в рамках нацпроекта) с ООО «Дорсервис-09».

ГКУ РД «Управление автодорог Республики Дагестан» реализованы мероприятия за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан бюджета в размере (1 189,3 млн рублей). Завершены работы на дорожной сети, протяженностью 51 километр.

По объектам регионального значения завершены работы на всех предусмотренных 51 км.

В целях проведения работ на объектах Махачкалинской городской агломерации МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала» заключено 12 контрактов на сумму 1 278,1 млн рублей, в том числе:

- капремонт улиц Кировского района г. Махачкалы, - контракт №82-21 от 20.04.2021 на 360,0 млн рублей;

- капремонт улиц Советского района г. Махачкалы, - контракт №88-21 от 1 июня 2021 года;

- капремонт улиц Ленинского района г. Махачкалы - контракт №94-21 от 10 июня 2021 года на 275,6 млн рублей;

- ремонт улиц Советского района г. Махачкалы - контракт №120-21 от 7 июля 2021 года на 18,8 млн рублей;

- ремонт улиц Ленинского района г. Махачкалы - контракт №118-21 от 7 июля 2021 года на 21,3 млн рублей;

- ремонт улиц Кировского района г. Махачкалы - контракт №119-21 на 43,9 млн рублей;

- организация дорожного движения -контракт 163-21X от 13.08.2021 на 30,5 млн рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Махачкалы (Кировский район) - контракт №177-21 от 07.09.2021 на 113,3 млн рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Махачкалы (Ленинский район) - контракт №182-21 от 09.09.2021 на 120,4 млн рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Махачкалы (Советский район) - контракт №181-21 от 07.09.2021 на 57,9 млн рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Махачкалы (Кировский район) - контракт №176-21 от 06.09.2021 на 107,6 млн рублей;

- капитальный ремонт ул. Коркмасова - контракт № 250-21 от 30 сентября 2021 года на 64,6 млн рублей.

По объектам улично-дорожной сети г. Махачкалы выполнено и оплачено работ на 1 251,1 млн рублей, приведено в нормативное состояние 84 км дорог.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Дорожная сеть	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий, процент	79	79	100
2		Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий, процент	58,6	58,6	100
3		Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, процент	62,0	62,0	100

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены не в полном объеме, что привело к неосвоению средств в сумме 141,5 млн рублей или 5,7 % от годовых назначений (2 469,2 млн рублей). Однако согласно данным ГИС «Электронный бюджет» в связи с опережающим достижением показателя нормативного состояния дорог агломерации в 2021 году, отставание по графику выполнения объекта (перенос срока ввода в эксплуатацию)

не повлияло на достижение целевых показателей регионального проекта. Указанное является свидетельством того, что мероприятия регионального проекта не увязаны с достижением плановых значений по целевым показателям.

В соответствии с Соглашением № 108-17-2019-006 от 5 апреля 2019 года, заключенным между Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) и Правительством Республики Дагестан, отчет о завершении работ по мероприятиям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», должен был быть представлен 2 декабря 2021 года. Однако, мероприятия по ремонту улично-дорожного хозяйства Махачкалинской агломерации в установленные сроки не были завершены.

Недостатки, допущенные на этапе подготовки мероприятий регионального проекта отрицательным образом сказались на своевременности реализации плановых мероприятий. Длительные сроки прохождения экспертизы проектной документации привели к срыву сроков заключения контракта и неоднократному переносу сроков заключения контрактов

Низкое качество подготовки документов в целях проведения аукционных процедур привело к жалобам участников торгов, отмене аукциона или определения поставщика по контракту. Превышение лимитов бюджетных обязательств согласно разработанной проектно-сметной документации вызвало необходимость ее корректировки.

Администрацией городского округа «город Махачкала» по автомобильным дорогам, входящим в городскую агломерацию, с 2019 года не проводилась инструментальная диагностика. В случае проведения инструментальной диагностики, базовое значение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети может не подтвердиться, что приведет к недостижению целевого показателя по национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» (Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474).

По объектам улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации не завершена работа по оформлению технических паспортов и прав собственности. По 94 улицам, отремонтированным в городе Махачкала в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в оперативном управлении МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Махачкалы» технические паспорта оформлены на 35 улиц.

Значения целевых показателей регионального проекта «Дорожная сеть» не имеют динамики роста и совпадают с базовым значением на начало периода.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает**

- обеспечить взаимосвязь мероприятий, целевых показателей и объемов финансирования, отраженных в республиканском бюджете Республики Дагестан, государственной программе Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан» и в паспорте регионального проекта;
- завершить работы по инструментальной диагностике автодорог регионального значения, а также провести инструментальную диагностику автомобильных дорог, входящих в состав Махачкалинской городской агломерации (приказ Минтранса России от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»);
- оформить технические паспорта на все улицы города Махачкалы, которые значатся в реестре Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы;
- зарегистрировать права собственности на объекты улично-дорожной сети города Махачкалы;
- принять меры по закреплению улиц, находящихся в муниципальной собственности г. Махачкалы на праве оперативного управления за МКУ «УЖКХ г. Махачкала»;
- обеспечить синхронизацию работ, проводимых в рамках мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» с мероприятиями, проводимыми ресурсно-снабжающими организациями по ремонту и реконструкции инженерных сетей водопровода и канализации, а также с мероприятиями регионального проекта «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда»;
- принять меры по своевременному заключению государственных контрактов с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств поставщиками;
- в целях исключения рисков приостановления процедуры по заключению контрактов провести работу по укреплению квалифицированными специалистами аукционной комиссии и обеспечения соблюдения требований законодательства в сфере закупок.



7.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр должна составить 10 % от общего количества объектов, а доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения – 7 % от общего количества контрактов запланировано использование новых технологий в дорожной отрасли. Достижение указанных показателей запланировано достичь за счет проведения следующих мероприятий:

- установка 10 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (35,0 млн рублей);
- строительство пункта весогабаритного контроля на автодороге регионального значения (66,0 млн рублей);
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (120 млн рублей) и системы мониторинга транспортных потоков на автодорогах регионального и межмуниципального значения (10,0 млн рублей);

На 1 января 2022 года профинансированы расходы в сумме 212,8 млн рублей, или 97,7 % от годовых назначений (217,73 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 211,7 млн рублей, или 97% от годовых назначений.

Неиспользованный остаток составил 6,0 млн рублей (средства республиканского бюджета Республики Дагестан), или 7,55 % от объема финансирования, или 4,5 % от годовых назначений. Остаток образован за счет экономии по результатам торгов (4,9 млн рублей) и не востребовавшихся средств по итогам завершения работ по размещению пункта весогабаритного контроля (1,59 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключены 4 контракта на общую сумму 226,1 млн рублей, в том числе

- 1 контракт на установку системы мониторинга транспортных потоков – № 283662 от 18 мая 2021 года на сумму 9,8 млн руб.;
- 1 контракт с ООО «Севкавинформцентр» на установку камер от 18 ноября 2021 года №101121 на сумму 32,2 млн рублей;
- 1 контракт на размещение автоматического пункта весогабаритного контроля от 11 ноября 2021 года №251021 на сумму 64,1 млн рублей;

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- 1 контракт от 23 ноября 2021 года № 375-21 на сумму 320,3 млн рублей на период 2021 г. - 2023 г. (в том числе на 2021 год - 106,7 млн рублей) на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации. Срок ввода в эксплуатацию – 1 ноября 2024 года. Бюджет 2021 года в размере 106,7 млн рублей освоен в полном объеме.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %	10	10	100
2		Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %	7	7	100

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены. Плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.

Достижение показателя «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» (10 % от общего количества объектов) обеспечено в процессе исполнения контракта на ремонт автомобильной дороги Буйнакск – Кизилюрт км 0 – км 7, работы завершены.

Достижение показателя «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» (7 % от общего количества контрактов) обеспечено в рамках исполнения контракта на строительство автомобильной дороги Манаскент – Подъезд от федеральной дороги "Кавказ" к санаторию "Каспий", контракт заключен 5 июля 2021 года.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**

- обеспечить бесперебойную работу всех комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящихся в ведении Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «ЦОДД»);

- обеспечить своевременную рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных автоматизированными средствами фото и видеофиксации скоростного режима.



7.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2021 году предусматривается снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Республике Дагестан, в том числе: снижение количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях не более 11,2 человек на 100 тысяч населения и не более 4,27 человек на 10 тысяч транспортных средств.

Проект реализуется совместно с Министерством внутренних дел Республики Дагестан.

Несмотря на запланированные мероприятия по приобретению медицинского оборудования и специализированного автотранспорта, финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	«Безопасность дорожного движения»	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.	4,27	4,27	100
2		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, чел.	11,2	11,2	100

По данным Министерства внутренних дел по Республики Дагестан динамика дорожно-транспортных нарушений по Республике Дагестан за 2018-2021 годы приведена в следующей таблице:

Динамика дорожно-транспортных нарушений по Республике Дагестан с 2018 года по 2021 год

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество зарегистрированных ДТП, в которых:				
погибло (чел.)	368	351	316	304
ранены (чел.)	2 630	2 248	1976	1918

По результатам мониторинга реализации регионального проекта **Счетная палата предлагает** активизировать деятельность по размещению в средствах массовой информации социальной рекламы, публикаций, роликов, статей по обеспечению безопасности дорожного движения, информации о фактах резонансных ДТП при перевозках пассажиров и грузов, а также о результатах проверок, проводимых по данному направлению и принятых мерах.



8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»



Куратор национального проекта:

Эмеев Б. Э.

Врио Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Буганов Т.Г.

Врио министра цифрового развития Республики
Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основной целью реализации национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации является цифровая трансформация, в ходе которой должны быть обеспечены:

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 97 процентов;

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года.

- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 5 региональных проектов:


- 1) «Кадры для цифровой экономики»;
- 2) «Информационная инфраструктура»;
- 3) «Информационная безопасность»;
- 4) «Цифровые технологии»;
- 5) «Цифровое государственное управление»;

Ответственным исполнителем региональных проектов является Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

В 2021 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» профинансированы расходы в сумме 36,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 30,78 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 5,32 млн рублей).

Финансирование национального проекта
«Цифровая экономика» в 2021 году

млн рублей

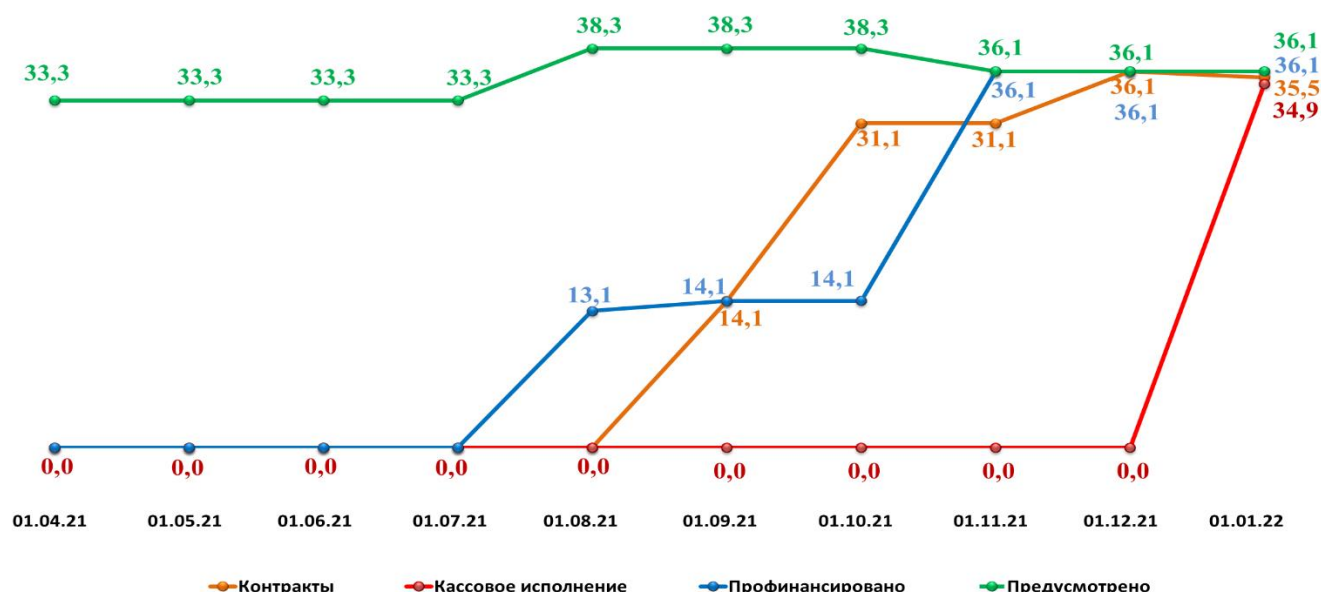

На 1 января 2022 года фактически освоено 34,9 млн рублей, или 96,7 % от объема финансирования. Неиспользованный (неосвоенный) остаток бюджетных средств составил 1,17 млн рублей, или 3,2 % от объема финансирования, который сложился в виду образовавшейся экономии по результатам приемки работ.

Финансирование мероприятий национального проекта «Цифровая экономика» осуществляется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан».

В ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика» заключено 4 контракта на сумму 35,52 млн рублей, или 100% от планового объема.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) национального проекта «Цифровая экономика» представлено следующим образом:

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Кадров для цифровой экономики	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, возрастающий	161	95	59,0
2	Информационная инфраструктура	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий	100	100	100

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
3		Доля судебных участков мировых судей, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, возрастающий	100	100	100
4		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастающий	25	95,2	380,8
5		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий	3,8	4,09	107,6
6		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, возрастающий	15	15,7	104,6
7	Цифровое государственное управление	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий	25	80	320
8		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проективном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий	10	80	800
9		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, возрастающий	25	99	396
10		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий	30	51	170



8.1. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

Основной целью реализации регионального проекта является обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для развития цифровой экономики в Республике Дагестан.

В ходе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2021 году были запланированы мероприятия по обучению 161 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта в 2021 году не предусматривалось.

В целях реализации регионального проекта, в адрес Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации направлено письмо о готовности обеспечить условия для обучения в дистанционном формате должностных лиц органов исполнительной власти Республики Дагестан, программам повышения квалификации: «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (60 ак. часов) и «Основы цифровой трансформации» (20 ак. часов).

В 2021 году от Республики Дагестан зарегистрировались на обучение 420 человек, что составляет 261% от предусмотренной квоты на обучение. Однако, в связи с отсутствием возможности обеспечить набор слушателей в соответствии с заявленным регионом количеством, зачислено 95 человек, или 22,6 % от зарегистрированного количества.

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году не обеспечено достижение целевого показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» - 95 человек, или 59 % от планового объема (161 человек). Причиной недостижения целевого показателя является невозможность обеспечить набор слушателей в соответствии с заявленным регионом количеством.

Министерством цифрового развития Российской Федерации доведена информация о признании наличия объективных факторов, препятствующих достижению планового значения целевого показателя и решении не применять санкции к регионам, необеспечившим исполнение планового значения.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает синхронизировать мероприятия по формированию кадров для цифровой экономики с мероприятиями национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» в части обучения специалистов компетенциям в сфере цифровой трансформации.



8.2. Региональный проект «Информационная инфраструктура».

Основной целью реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» является решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории Республики Дагестан.

- создание необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет 1 552 социально значимых объектов (далее – СЗО), в том числе государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»;

- обеспечение доступа судебных участков мировых судей к ГАС «Правосудие» и организация защищенного межведомственного электронного взаимодействия» (131 участок мировых судей (540 рабочих мест, 377 помещений).

На реализацию регионального проекта в 2021 году профинансированы расходы в сумме 31,1 млн рублей, или 100 % годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета – 30,8 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,3 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 29,9 млн рублей или 96,2 % от годовых назначений (31,1 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 1,2 млн рублей, или 3,8 % от объема годовых назначений, который образован по итогам экономии по результатам проведенных работ.

Заключены 3 контракта на сумму 30,52 млн рублей, в том числе:

- контракт от 23 августа 2021 года № 01032000008421001926 на проведение работ по организации защищенных каналов передачи данных между участками мировых судей и ГАС «Правосудие» на сумму - 12,15 млн рублей.

- контракт от 7 сентября 2021 года № 01032000008421002047 на проведение работ по созданию локальной вычислительной сети, на сумму – 17,77 млн рублей (образовалась экономия на сумму 1,2 млн рублей).

В связи с экономией средств по контракту № 01032000008421002047 «Создание локальной вычислительной сети» заключен договор № 17/1221

от 17.12.2021 с ООО «Айти-Проект» на настройку автоматических рабочих мест на участках мировых судей с ГАС «Правосудие», на сумму – 0,6 млн рублей.

Всего на территории Республики Дагестан подключены 131 участков мировых судей, размещенных на 55 объектах.

Согласован перечень социально значимых объектов (1 552 объекта), подлежащих подключению к сети Интернет в 2021 году в рамках государственного контракта. Министерство республики Дагестан заключило договор с АО «Квант-Телеком» от 19.08.2019 г. № 0173100007519000102_144316 на проверку и тестирование 1552 СЗО, из них 485 получают услугу с 1 сентября 2021 года, остальные 1067 с 1 октября 2021 года.

По состоянию на 1 января 2022 года времени работы завершены, планируемый к достижению целевой показатель достигнут.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Информационная инфраструктура	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий	100	100	100
2		Доля судебных участков мировых судей, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, возрастающий	100	100	100

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме. Плановые значения по целевым показателям достигнуты.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- синхронизировать количество объектов, школ, дошкольных образовательных организаций, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые требуют подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или же которые имеют скорость ниже 10 Мбит/с с учетом количества объектов, введенных в 2021 году и вводимых в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Демография», национального проекта «Образование», национального проекта «Здравоохранение».



8.3. Региональный проект «Информационная безопасность».

В рамках регионального проекта «Информационная безопасность» предусмотрено:

- обеспечение преимущественной маршрутизации интернет-трафика органов исполнительной власти Республики Дагестан через российский сегмент сети «Интернет» (RSNet);
- повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры;
- проведение мониторинга использования органами власти Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования;
- проведение анализа средств защиты информации государственных информационных систем органов власти Республики Дагестан;
- обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами власти Республики Дагестан;
- получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2021 году не предусматривались.

Подключение к RSNet осуществляется подведомственным Министерству цифрового развития Республики Дагестан учреждением ГАУ РД «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан» с финансированием на 2021 год в сумме 1,45 млн рублей (вне регионального проекта). По данным Министерства цифрового развития Республики Дагестан, по состоянию на 1 января 2022 года 33 органа исполнительной власти Республики Дагестан подключены к защищенному каналу передачи данных ЕГСУПД (сеть 2365).

Информация о необходимости проведения работ по отнесению к категориям объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Дагестан и их подведомственных учреждений, а также доведению уровня их информационной безопасности до установленных законодательством Российской Федерации норм, доведена до органов исполнительной власти Республики Дагестан.

В целях проведения мониторинга использования органами власти Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, Министерством цифрового развития Республики Дагестан проведен анализ закупок программного обеспечения и оборудования отечественных разработчиков. По результатам проведенного мониторинга установлено, что телекоммуникационное оборудование российского происхождения ПАК VIPNET Coordinator HV4 различной модификации использует 31 орган власти Республики Дагестан.

Использование ПАК VIPNET Coordinator HV4 не подтверждено Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан и Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан. Из 52 муниципальных органов власти указанное программное обеспечение не используется в Администрации МО «Рутульский район»,

В целях проведения анализа средств защиты информации государственных информационных систем в органы исполнительной власти Республики Дагестан подготовлены и направлены рекомендации о необходимости использования средств защиты информации.

Во исполнение направлено письмо в адрес органов исполнительной власти Республики Дагестан о необходимости подключения к защищенному сегменту сети «Интернет» (RSNet) (письмо Министерства цифрового развития цифры Республики Дагестан от 25 июня 2021 года № 09-09-1542/21).

В рамках реализации регионального проекта необходимо было проведение мероприятий по обеспечению доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами власти Республики Дагестан, а также получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра.

Однако, в виду отсутствия методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проведение сроки проведения данной работы перенесены на 2022 год.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- обеспечить использование органами исполнительной власти Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования;
- предоставить доступ гражданам к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Дагестан;
- завершить мероприятия по получению органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра.



8.4. Региональный проект «Цифровые технологии»

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» в 2021 году было предусмотрено:

- содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение и находящихся на территории Республики Дагестан, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки (грант) из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта;

- проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Республики Дагестан;

- развитие региональной геоинформационной системы (РГИС).

В Законе Республики Дагестан от 28.12.2020 № 103 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий регионального проекта «Цифровые технологии» бюджетные ассигнования не предусмотрены. Однако, в соответствии с принятым Постановлением от 7 июля 2021 года № 170 «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан», запланировано дополнительное финансирование регионального проекта (5,0 млн рублей) на формирование единой геоинформационной системы Республики Дагестан.


На реализацию регионального профинансированы расходы в сумме 5,0 млн рублей (средства республиканского бюджета Республики Дагестан).

На 1 января 2022 года кассовое освоение составило 5,0 млн рублей или 100 % от годового финансирования

Заключен 1 контракт на сумму 5 млн рублей или 100% от годового объема, в целях проведения работ по оказанию услуг по техническому сопровождению единой геоинформационной системы Республики Дагестан и расширению функциональных возможностей программного обеспечения РусГИС (исполнитель ПАО «Ростелеком»). Работы завершены.

Достижение целевых показателей по итогам реализации регионального проекта в 2021 году не предусматривалось.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает организовать работу по использованию органами государственной власти Республики Дагестан единой геоинформационной системы Республики Дагестан для решения комплексных задач, связанных со сбором, хранением, обработкой, анализом информации и формирования на их основе аналитических отчетов.



8.5. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году было предусмотрено обеспечение использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления 33 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ по Республике Дагестан – 25 % от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде).

Финансирование и заключение контрактов по региональному проекту в 2021 году не предусматривалось.

В Республике Дагестан определены 84 региональные массовые социально значимые услуги⁸, в том числе;

- 62 услуг переводятся через Платформу государственных сервисов (ПГС).
- 22 услуги переводятся в электронный вид посредством ведомственных информационных систем (ВИС).

По состоянию на 1 января 2022 года переведено в электронный формат 75 услуг в 19 органах исполнительной власти и 52 администрациях муниципальных районов и городских округов.

Следует отметить, что из переведенных в электронный формат 75 услуг, информационного освещения возможности предоставления государственных и муниципальных услуг на Едином портале государственных услуг осуществлено только по услуге «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семь лет».

На официальных сайтах государственных органов власти размещен уникальный код виджета, который позволяет населению обращаться в орган власти напрямую.

На 1 января 2022 год создано 2 715 учетных записей, в том числе со:

- статусом «подтвержден» - 1 938;
- «не подтвержден» - 777, или 28,6 % от общего количества (сотрудники учреждений не начали работать с системой).

⁸ утверждены постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2021 году № 359 «Об утверждении перечня массовых социально-значимых услуг Республики Дагестан, переводимых в электронный формат».

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значение показателя		%
			План	Факт	
1	Цифровое государственное управление»	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий, балл	3,8	4,09	107,6
2		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастающий, процент	25	95,2	380,8
3		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, возрастающий, процент	15	15,7	104,6
4		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, ед.	10	80	800,0
5		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, возрастающий, процент	25	99	396,0
6		Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий, шт	25	80	320,0
7		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий, процент	30	51	170,0

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме. Плановые значения целевых показателей достигнуты.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- осуществлять информационное освещение всего перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на Едином портале государственных услуг, в средствах массовой информации и социальных сетях;
- провести работу с учреждениями, сотрудники которых не начали работать с системой и статус которых «не подтвержден» (777 работников, или 28,6 % от общего количества (сотрудники учреждений);
- уточнить значения целевых показателей реализации регионального проекта с учетом значительного превышения фактических значений над плановыми.



9. Национальный проект «Культура»



Куратор национального проекта:
Телякавов М. П.
Врио заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:
Бутаева З. А.
Врио министра культуры Республики
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в целях достижения национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» запланировано

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.


Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

- 1) «Культурная среда»;
- 2) «Творческие люди»;
- 3) «Цифровая культура».

Реализацию региональных проектов осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан и муниципальные образования Республики Дагестан.

В 2021 году на реализацию национального проекта «Культура» профинансированы расходы в сумме 469,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 374,3 млн рублей, средства республиканского бюджета - 85,1 млн рублей, средства местных бюджетов 10,1 млн рублей).

Финансирование национального проекта «Культура» в 2021 году

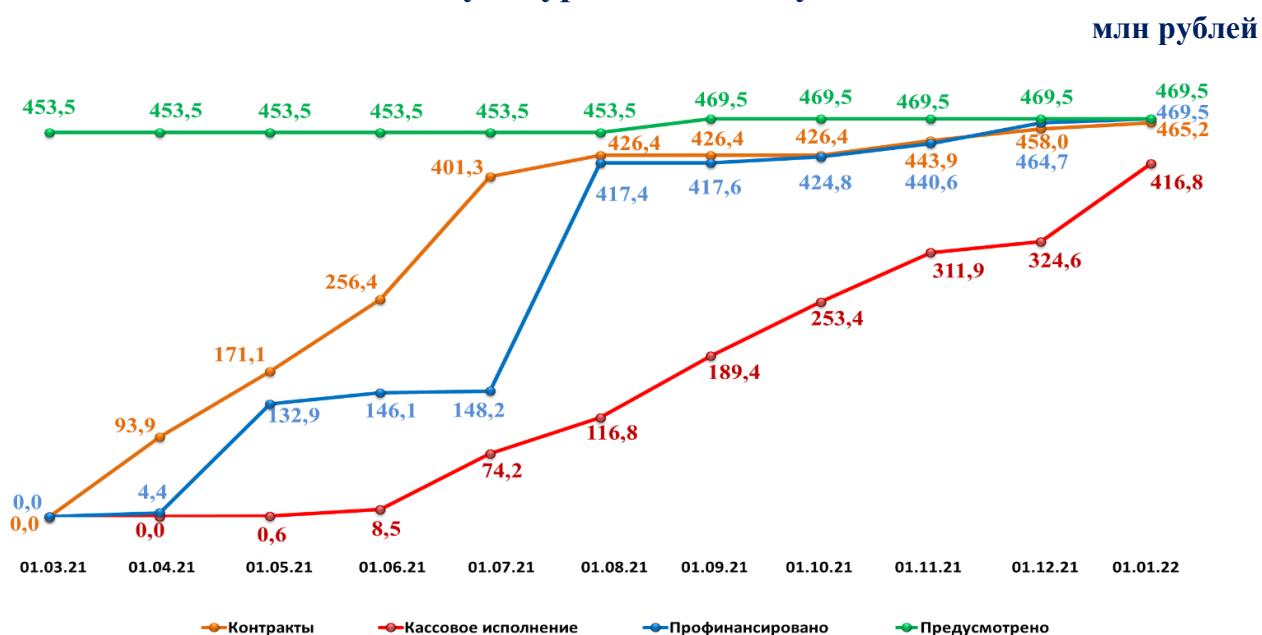

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

На 1 января 2022 года освоение выделенных средств составило 416,7 млн рублей, или 88,8 % от объема финансирования. По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил 52,7 млн рублей, или 11,2 % от годовых назначений.

Информация о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан представлена в следующей таблице.

Национальные (региональные) проекты	Профинансировано	Освоено		Остатки средств на 1.01.2022 г.	
		Сумма	%	Сумма	%
НП «КУЛЬТУРА»	469,5	416,7	88,8	52,7	11,2
1. «Культурная среда»	437,8	385,0	88,0	52,8	12,1
2. «Творческие люди»	29,5	29,5	100	0,0	0,0
3. «Цифровая культура»	2,2	2,2	100	0,0	0,0

В ходе реализации национального проекта «Культура» заключен 81 контракт (договор) на общую сумму 465,2 млн рублей, или 100 % от планового объема контрактов (4,30 млн рублей по национальному проекту не подлежат контрактации). Кроме того, на сумму 17,57 млн рублей заключены дополнительные соглашения к действующим контрактам

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий региональных проектов национального проекта «Культура» представлено в следующей таблице.

№	Региональ ный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Культурная среда	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, нарастающим итогом, ед.	42	42	100
2		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, ед.	16	16	100
3		Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, посещений	0	0	0
4	Творческие люди	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)	1236	1236	100
5		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (единиц)	2	2	100
6		Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» нарастающим итогом, чел.	527	527	100
7	Цифровая культура	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности нарастающим итогом, ед.	3	3	100
8		Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, с нарастающим итогом	1	1	100



9.1 Региональный проект «Культурная среда»

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» было предусмотрено увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование (до 16 ед.), количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (до 42 ед.), в ходе проведения следующих мероприятий:

- капитальный ремонт 7 учреждений культуры - 75,45 млн рублей;
- строительство 4 учреждений культуры - 116,9 млн рублей;
- капитальный ремонт 3 школ искусств - 62,14 млн рублей;
- строительство центра культурного развития в городе Кизляр (период строительства 2021 г. - 2022 г.) - 147,08 млн рублей (в том числе на 2021 год - 52,53 млн рублей);
- благоустройство территории учреждений культуры - 16,5 млн рублей («Дом культуры в с. Губден Карабудахкентского района» - 7,15 млн рублей, «Дом культуры в с. Зидьян-Казмаляр Дербентского района» - 9,34 млн рублей);
- создание 2 модельных библиотек - 15,0 млн рублей;
- строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкала Республики Дагестан (период строительства 2020 г. - 2022 г.) - 778,5 млн рублей (в том числе на 2021 год - 93,94 млн рублей).

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 437,76 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 370,28 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 57,42 млн рублей, средства муниципальных образований – 10,06 млн рублей), или 100 % от утвержденных назначений.

По состоянию на 1 января 2022 года освоено 385,0 млн рублей, или 88,0 % от объема финансирования.

Заключено 54 контракта (договора)⁹ на сумму 437,76 млн рублей, или 100 % от планового объема, в том числе:

- по капитальному ремонту 7 учреждений культуры (с. Советское, Магарамкентский район, с. Н. Инхо, Гумбетовский район, с. Юхари-Ярак, Хивский район, с. Мегеб, Гунибский район, с. Тпиг, Агульский район, с. Салта Гунибский район, с. Урари Дахадаевского района) – 7 контрактов на сумму 70,35 млн рублей. Работы завершены;

- по строительству 4 учреждений культуры (Дом культуры на 300 мест в с. Кунбаттар, Ногайский район, в с. Сагаси-Дейбук, Каякентского района,

⁹ 26 контрактов на конкурсной основе, 26 прямыми договорами

Центр культурного развития в с. Зидьян-Казмаляр Дербентского района, с. Губден Карабудахкентский район - 4 контракта на сумму 109,24 млн рублей. Работы завершены;

- проведение капитального ремонта 3 детских школ искусств (г. Махачкала, с. Хив, Хивского района, г. Дагестанские Огни) – 3 контракта на сумму 57,44 млн рублей. Работы завершены;

- создание 2 модельных библиотек - 8 контрактов и 26 прямых договоров на сумму 15,0 млн рублей. Созданы 2 модельные библиотеки в г. Махачкале и г. Каспийске;

- благоустройство объекта «Дом культуры с. Губден Карабудахкентского района (7,15 млн рублей), благоустройству объекта «Дом культуры в с. Зидьян - Казмаляр Дербентского района (9,34 млн рублей) - 2 контракта на сумму 16,5 млн рублей. Работы по капитальному ремонту завершены.

- строительство Центра культурного развития в г. Кизляр – 1 контракт со сроком исполнения 2 года на общую сумму 138,6 млн рублей (в том числе на 2021 год - 57,9 млн рублей). Строительная готовность объекта составляет 3,0 %.

В 2020 году заключены 3 контракта на строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка» на общую сумму 778,5 млн рублей (период строительства с 2020 года по 2022 год, в том числе с выполнением работ в 2021 году на сумму 93,94 млн рублей). Строительная готовность объекта составляет 33,3 %.

На сумму 17,4 млн рублей заключены дополнительные соглашения к действующим контрактам.

Контракт на строительство Центра культурного развития в городе Кизляре» заключен 7 мая 2021 года на сумму 138,6 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» г. Кизляр, подрядная организация – ООО «Фаворит»). Строительная готовность объекта составила 3,0 %, при плановом значении – 36 %. Освоено 4,3 млн рублей, или 7 % от годовых назначений (57,9 млн рублей).

В 2021 году на объекте выполнены только подготовительные работы (планировка территории, установка ограждений, жилых вагонов, электричество, водоснабжение, свайный фундамент).

В ходе строительства объекта на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ГУП РД «Дагестангражданкомунпроект» произведен перерасчет стоимости работ по объекту и выявлена потребность в дополнительных средствах на строительно-монтажные работы в объеме 41,58 млн рублей.

Учитывая изложенное, ответственными исполнителями не выполнены работы, предусмотренные 1-м этапом в 2021 году, и не освоены лимиты

2021 года в сумме 52,7 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 52,5 млн рублей.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Культурная среда	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, нарастающим итогом, ед.	42	42	100
2		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, ед.	16	16	100

По данным отчета в ГИС «Электронный бюджет» обеспечено достижение 2 целевых показателей регионального проекта в 2021 году. В то же время, в результате неосвоения средств, выделенных на строительство Центра культурного развития в городе Кизляре, в 2021 году мероприятия, обеспеченные финансированием, не выполнены в полном объеме.

Указанное свидетельствует о том, что мероприятия регионального проекта не взаимосвязаны с целевыми показателями регионального проекта.

Следует отметить, что в отчетах о реализации регионального проекта отсутствуют статистические данные, позволяющие оценить уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в сфере культуры, а также показатели обеспеченности муниципальных образований Республики Дагестан учреждениями культуры.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- обеспечить своевременное и эффективное освоение выделяемых средств;
- ускорить темпы строительства объектов и обеспечить их ввод в эксплуатацию в установленные сроки;
- обеспечить проведение ежедневного контроля за ходом строительства объектов капитального строительства;
- обеспечить доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья учреждений культуры, в том числе строящихся в ходе регионального проекта «Культурная среда»;
- принять меры по своевременному исполнению обязательств по государственным контрактам;
- принять меры по подключению к сети «Интернет» учреждений культуры, расположенных в сельской местности;
- осуществлять оценку уровня удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры, по итогам реализации мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Культура» в Республике Дагестан.



9.2. Региональный проект «Творческие люди».

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» было предусмотрено увеличено (нарастающим итогом) количество специалистов, прошедших повышение квалификации до 1 236 человек, количества поддержанных творческих инициатив до 53 единиц, количества граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности в области культуры до 843 человек в ходе проведения следующих мероприятий:

- повышение квалификации 598 работников культуры;
- поддержка муниципальных учреждений органов культуры (29 денежных поощрений по 100 тыс. рублей) - 2,9 млн рублей;
- поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры (26 денежных поощрений по 50 тыс. рублей) – 1,3 млн рублей;
- организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов – 0,35 млн рублей;
- поддержка добровольческих движений – 0,43 млн рублей;
- реализация 2 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности – 6,55 млн рублей;
- реализация 3 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства – 12,5 млн рублей;
- реализация 17 выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев – 4,8 млн рублей;
- реализация культурно-познавательных программ для школьников (2 мероприятия для 5 000 школьников) - 0,25 млн рублей;
- организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи - 0,35 млн рублей.

На реализацию регионального проекта «Творческие люди» профинансированы и освоены расходы в сумме 29,53 млн рублей, или 100 % от финансирования (за счет федерального бюджета - 4,05 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 25,44 млн рублей, средства муниципальных образований – 0,04 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта заключено 26 контрактов¹⁰ на сумму 25,23 млн рублей, или 100 % от планового объема контрактов.

¹⁰ 5 контрактов на конкурсной основе, 21 – прямые договоры

Из общего объема профинансированных средств (29,53 млн рублей), средства в сумме 4,30 млн рублей не подлежат контрактации.

В 2021 году на основании приказа Министерства культуры Республики Дагестан от 14 января 2021 года № 16/од «Об итогах конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками в 2021 году» осуществлены выплаты муниципальным учреждениям культуры (29 денежных поощрений по 100 тыс. рублей на общую сумму 2,9 млн рублей), и лучшим работникам культуры (26 денежных поощрений по 50 тыс. рублей на общую сумму 1,3 млн рублей).

Проведены следующие массовые культурные мероприятия, фестивали и выставочные проекты в ведущих федеральных музеях Российской Федерации:

- фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России», посвященный 100-летию со дня образования ДАССР - 0,35 млн рублей;
- III Республиканский форум «Волонтеры культуры – 0,43 млн рублей;
- Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» (г. Махачкала), Республиканский праздник традиционной культуры «Дербент – перекресток цивилизаций» - 6,55 млн рублей;
- фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи», Международный фестиваль национальных театров, Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары» - 12,5 млн рублей;
- Первый инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «Вместе к новым вершинам» - 0,35 млн рублей;
- 4 культурно-познавательные программы для школьников - 0,25 млн рублей;
- 18 выставочных проектов в ведущих федеральных и региональных музеях (выставка «Дагестан мононациональный» к 100-летию образования ДАССР (г. Москва), выставка «Августовичи – Конопацкие – Колесниковы - Мурзабековы (г. Черкесск), выставка Национального музея Республики Дагестан в г. Сочи (курорт «Роза Хутор»), выставка «Вдохновленные ковром» (г. Курск), проект "Открытые храмы - VIAR-360" (г. Казань), выставка «Кубачи - Зирехгеран» (г. Москва), выставка М. Даудова «Пласты времени» (г. Пятигорск), выставка «Дагестан в произведениях Е. Е. Лансере» (г. Kisловодск), выставка «Вдохновленные ковром» (г. Белгород), выставка С. Батырова (г. Ставрополь), передвижная выставка изобразительного искусства «Многообразие красок Кавказа» (г. Нальчик, г. Санкт-Петербург, с. Абрамцево, Московская область), выставка «Российские императоры» (г. Армавир, г. Астрахань), выставка «Гагарин - певец Кавказа» (г. Владикавказе), выставка «Древний Дербент» (г. Набережные Челны), выставка «Нить времен» (г. Белгород) - 4,8 млн рублей .

Прошли обучение 598 работников культуры, или 100,0 % от плана на 2021 год.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения Показателей		%
			План	Факт	
1	Творческие люди	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)	1236	1236	100
2		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	53	55	103,8
3		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий	843	1266	150,2

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты.

Следует отметить, что целевые показатели регионального проекта не отражают эффективность реализации мероприятий с точки зрения востребованности и охвата аудитории (число посещений организаций культуры).

Кроме этого, достижение целевого показателя «Число участников культурно-просветительских программ для школьников (тыс. чел), нарастающим итогом» федерального проекта «Творческие люди» в ходе реализации регионального проекта «Творческие люди», не предусмотрено.

Как свидетельствуют данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики за 2020 год¹¹ в Республике Дагестан наблюдалось снижение посещаемости учреждений культуры, в том числе: численность зрителей театров – 110,4 тыс. человек (2019 год – 392,1 тыс. человек); число посещений театров на 1000 человек населения – 35 человек (2019 год – 126 человек), число посещений музеев – 320,5 тыс. человек (2019 год – 659,1 тыс. человек), число посещений музеев на 1000 человек населения – 102 человека (212 человек).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 2021 году расширив формат проведения мероприятий в виде онлайн-проектов;
- обеспечить участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
- провести мероприятия по увеличению посещаемости культурно-досуговых мероприятий.

¹¹ Данные по результатам 2021 года будут представлены в мае 2022 года



9.3 Региональный проект «Цифровая культура».

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» было предусмотрено увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами (нарастающим итогом) до 3 единиц в результате создания мультимедийного гида по экспозициям с использованием технологии виртуальной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи».

В 2021 году на реализацию регионального проекта профинансировано 2,0 млн рублей (средства республиканского бюджета Республики Дагестан), или 100 % от годовых назначений.

В целях реализации мероприятий регионального проекта заключен 1 контракт на сумму 2,2 млн рублей. Работы завершены.

Выполнение целевого показателя регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Цифровая культура	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности нарастающим итогом, ед.	3	3	100

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, целевой показатель достигнут. Однако, целевой показатель по региональному проекту не отражает эффективность реализации мероприятий с точки зрения востребованности и охвата аудитории: количество онлайн-трансляций, число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры и др. Таким образом, отсутствует возможность оценки эффективности достижения общественно значимого результата «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям проводимых культурно-массовых мероприятий» по результатам реализованных мероприятий.

На 1 января 2022 года указано значение показателя с учетом создания 2 мультимедийных гидов в ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой» (2019 год) и ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (2020 год).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата Республики Дагестан предлагает обеспечить представление информации о достижении общественно значимых результатов реализации мероприятий регионального проекта с точки зрения востребованности и охвата аудитории.



10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Куратор национального проекта:

Эмеев Б.Э.

Врио заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Абашилев Х. Ш.

Врио руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Батгалов Б. В.

Врио министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан


Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основной целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

В Республике Дагестан в 2021 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются три региональных проекта, в том числе:

- 1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»);
- 2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»);
- 3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Реализацию мероприятий указанных региональных проектов осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан («Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»).

**Финансирование национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году**

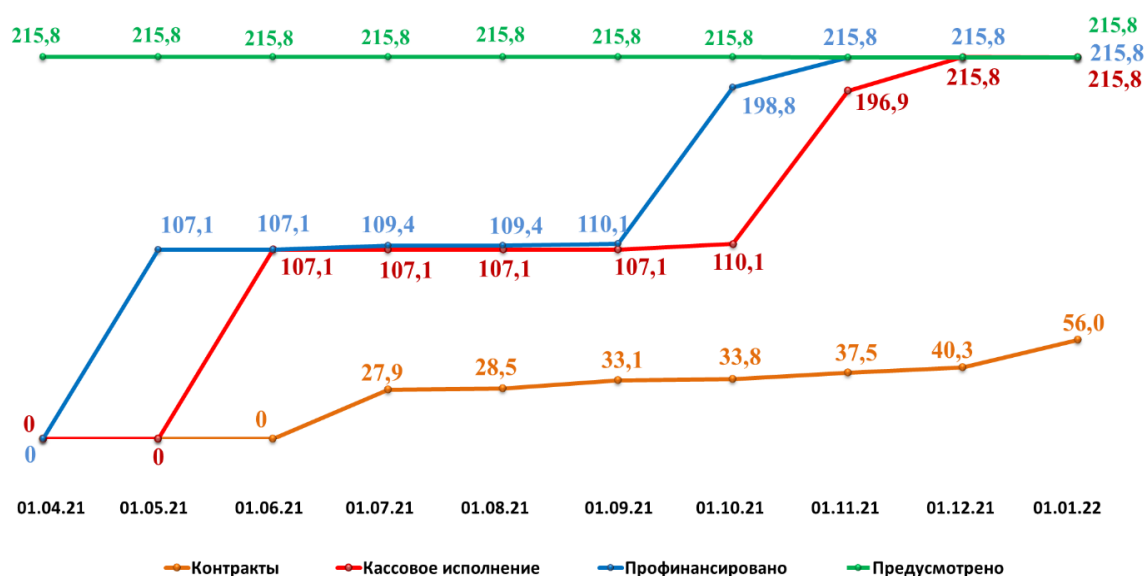

В 2021 году на реализацию национального проекта профинансированы расходы в сумме 215,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений, (в том числе: средства федерального бюджета – 213,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 2,2 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2022 года фактически освоено 215,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта в 2021 году заключены 94 контрактов или 100 % от планового объема на сумму 56,04 млн рублей.

Информация о реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Республики Дагестан за 2021 год представлена в следующей таблице.

Национальные (региональные) проекты	Профинансировано	Освоено		млн рублей Остатки средств на 1 января 2022 г.	
		Сумма	%	Сумма	%
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»	215,75	215,75	100	0	0
1. «Поддержка самозанятых»	9,58	9,58	100	0	0
2. «Предакселерация» («Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»)	24,37	24,37	100	0	0
3. «Акселерация субъектов среднего и малого предпринимательства»	181,8	181,8	100	0	0

В ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено достижение единственного целевого показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом» (региональный проект «Поддержка самозанятых»).

По данным отчетов, представленных ответственными исполнителями в 2021 году фактическое значение показателя составило 37 834 человек, или 315,6 % от планового значения (11 987 человек).

Закон Республики Дагестан «О введении на территории Республики Дагестан специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 29 мая 2020 г. № 32 начал действовать с 1 июля 2020 года. По сравнению с 2020 годом количество самозанятых граждан в Республике Дагестан увеличилось на 34 034 человек, или в 10 раз.



10.1. «Поддержка самозанятых»

В ходе реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых») предусмотрено оказание поддержки гражданам, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», введенный Законом Республики Дагестан от 30 мая 2020 года № 32 «О введении на территории Республики Дагестан специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (действует с 1 июля 2020 года).

На реализацию регионального проекта профинансированы и освоены расходы в сумме 9,58 млн рублей, или 100 % процентов от годовых назначений, (в том числе за счет средств федерального бюджета – 9,48 млн рублей и средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,1 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан указанные средства (9,58 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» согласно заключенному Соглашению от 22 апреля 2021 года № 20-2021-57100 на реализацию мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

В ходе реализации регионального проекта в 2021 году заключены 12 контрактов, или 100 % от планового объема контрактов, на общую сумму 9,26 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2022 года ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» проведены мероприятия и оказаны следующие услуги самозанятым гражданам:

- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» в средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» - 0,18 млн рублей;
- внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес» - 0,095 млн рублей;
- содействие в популяризации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства – 0,9 млн рублей;
- содействие в размещении услуг самозанятых граждан на электронных торговых площадках – 2,08 млн рублей;
- обеспечение участия в выставочном мероприятии «Ювелирные традиции 2021» – 1,46 млн рублей;
- обеспечение участия в 85 международной специализированной выставке обуви «MosShoes 2021» – 1,250 млн рублей;

- обеспечение участия в международной специализированной выставке обуви «Измайлово-шюз 2021» – 1,250 млн рублей;
- обеспечение участия в XXX Выставке - ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2021» - 1,45 млн рублей;
- проведение мастер-классов, тренингов – 0,3 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта обеспечено участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях (12 самозанятых граждан), оказаны консультации по вопросам самозанятости (300 самозанятых граждан), проведены мастер-классы (54 самозанятых граждан).

По состоянию на 1 января 2022 года Центром «Мой бизнес» зарегистрировано 282 самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - НПД).

По состоянию на 1 января 2022 года общее количество самозанятых граждан в Республике Дагестан (действующие налогоплательщики НПД) составило 37 834 человек, или 315,6 % от планового значения по данному целевому показателю (11 987 человек).

По данным информационного ресурса «Налог на профессиональный доход» на территории Республики Дагестан на 1 января 2022 года поставлено на учет 45 292 лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Дагестан, снялось с учета – 7 458 лиц. Сумма начисленного налога составила 51,1 млн рублей, поступления от налогоплательщиков – 41,5 млн рублей.

За 2021 год налогоплательщиками НПД было «выбито» 2 046,6 тыс. чеков, суммарный облагаемый доход по которым составил 1,69 млн рублей, средний доход по одному чеку – 824 рубля. При этом, поступления по налогу на профессиональный доход составили 49,2 млн рублей, или 82,0 % от суммарного облагаемого дохода.

По результату регионального проекта «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» фактическое значение за 2021 год составило 8,9 млн рублей, или 207,0 % от планового значения (4,3 млн рублей).

По результату «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) фактическое значение составило 383 человек, или 102,7 % от планового значения (373 человек).

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта не обеспечено достижение результата «В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями (нарастающим итогом)» - 581 объект, или 77,5 % от планового значения (750 объектов).

Причиной не достижения планового значения показателя является отсутствие у муниципальных образований имущества свободного от прав третьих лиц.

На сайте Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан размещено распоряжение от 24 декабря 2021 года № 510-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 26 февраля 2021 года № 45-Р», согласно которому утвержден Перечень государственного имущества¹² (далее – Перечень) включающий 78 объектов недвижимости, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД). По сравнению с 2020 годом (66 объектов) количество объектов увеличено на 12 единиц, или 17 %.

По состоянию на 1 января 2022 года утверждены 167 перечней муниципального имущества, согласно которым общее количество объектов, предоставляемых на льготных условиях субъектам МСП составляет 503 объекта.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- актуализировать плановое значение целевого показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом» с учетом достигнутых результатов за 2021 год;

- активизировать деятельность Центра «Мой бизнес» по регистрации и оказанию услуг самозанятым гражданам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- расширить и актуализировать данные реестров государственного муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП;

- контролировать учет имущества для предоставления во владение или пользования субъектам МСП и его использования;

- повысить эффективность использования помещений бизнес-инкубаторов, предоставляемых субъектам МСП.

¹² предназначенного для предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»



10.2. «Предакселерация»

В ходе реализации регионально проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса («Предакселерация») предусмотрено оказание информационной, консультационной, образовательной и финансовой форм поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (начинающие предприниматели).

На реализацию регионального проекта в 2021 году профинансированы и освоены расходы в сумме 24,37 млн рублей, или 100% от годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета – 24,12 млн рублей, средства республиканского бюджета 0,24 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» от 22 апреля 2021 года № 20-2021-57102 и перечислены средства в сумме 21,3 млн рублей на реализацию мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

В дальнейшем, 16 августа 2021 года в системе «Электронный бюджет» заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии между Агентством и ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» № 20-2021-57102/2 (в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес») на предмет увеличения финансирования с 21,33 млн рублей до 24,367 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта заключено 40 контрактов на общую сумму 23,2 млн рублей.

В 2021 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» проведены:

- обучающие мастер-классы в городах Махачкала, Каспийск и Дербент – 681 физических лиц, 68 субъектов МСП;
- обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» - Азбука предпринимательства (350 физических лиц, 50 субъектов МСП), «Школа предпринимательства» (25 субъектов МСП);
- образовательные программы и олимпиады для детей в возрасте 14-17 лет – 3 872 физических лиц;

- консультации по вопросам начала ведения бизнеса, ведению отчетности, маркетингу и продажам -736 физических лиц, 498 субъектов МСП;
- консультации по деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей – 525 субъектов МСП;
- анализ потенциала, выявление потребностей – 6 субъектов МСП;
- анализ технологической готовности предприятия – 6 субъектов МСП;
- мероприятия по тематике Центра инжиниринга – 93 субъекта МСП;
- региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров и услуг России» - 30 субъектов МСП.

Оказано содействие в составлении бизнес-планов (24 субъекта МСП), в размещении продукции в интернет (3 субъекта МСП), в получении статуса социального предприятия (9 субъектов МСП), а также предоставлены услуги по сертификации продукции и товаров – 14 субъектов МСП.

Проведены мероприятий в формате офлайн и онлайн с профильными экспертами по тематике Центра инжиниринга – 93 субъекта МСП.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2021 году выдано 26 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую сумму 41,9 млн рублей.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- в условиях распространения на территории Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) активизировать деятельность в части предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства антикризисных продуктов (кредиты, лизинговые продукты, беспроцентные займы на выдачу зарплат сотрудникам организаций, займы со сниженной процентной ставкой на оплату арендных помещений и погашение процентов по ранее взятым кредитам» и др.).

- расширить перечень специальных программ обучения, направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов МСП;

- предоставлять услуги (цифровой сервис), ориентированные на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

- осуществлять мониторинг информации о текущей выручке, налоговых платежах, количестве рабочих мест субъектов МСП, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе до и после предоставления).



10.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлен на создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты МСП) за счет оказания поддержки и увеличения:

- количества действующих микрозаймов, выданных МФО – 412 тыс. единиц;
- количества субъектов МСП, заключивших контракты при поддержке центров поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП - 19 единиц;
- количества новых субъектов МСП, и личных подсобных хозяйств, вовлеченных в сельскохозяйственные потребительские кооперативы – 100 единиц;
- количество субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку (накопленным итогом) – 30 единиц;
- количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги - 277 единиц;
- численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом – 25 единиц

Реализация регионального проекта осуществляется Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта профинансированы и освоены расходы в сумме 181,8 млн рублей, или 100% от годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета - 180 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,8 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключены 42 контракта на общую сумму 23,54 млн рублей.

Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в целях реализации регионального проекта профинансировано 76,0 млн рублей, которые доведены до подведомственных подразделений, в том числе:

1) ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» - 24,2 млн рублей на реализацию следующих мероприятий:

- «Развитие центров «Мой бизнес» - 5,4 млн рублей.

Проведена скоринговая оценка 17 субъектов МСП.

Прошли обучение по программам: «Развитие женского предпринимательства» - 100 субъектов МСП, «Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» – 56 субъектов МСП, «Управление развитием малого предприятия» - 100 субъектов МСП.

Предоставлены маркетинговые услуги 61 субъекту МСП, а также услуги по сертификации продукции 17 субъектам МСП.

- «Развитие Центра координации и поддержки экспортно-ориентированных предприятий МСП - 18,8 млн рублей.

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Центра координации и поддержки экспортно-ориентированных предприятий МСП – 9,6 млн рублей, или 113 % от планового объема (8,5 млн рублей).

Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам оказанных услуг составило 19 экспортеров, или 100 % от планового количества.

2) Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики («Гарантийный фонд») – 51,8 млн рублей на реализацию мероприятия по развитию региональных гарантийных организаций.

В 2021 году выдано 37 поручительств на общую сумму 143,2 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2022 года объем финансовой поддержки субъектам МСП, при поддержке гарантийных организаций, составил 400,7 млн рублей, или 206,8 % от планового объема (193,72 млн рублей).

В целях достижения результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций» Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2021 году выдано 113 микрозаймов на общую сумму 204,9 млн рублей. В результате, по состоянию на 1 января 2022 года количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам МСП в рамках регионального проекта составило 622 микрозаймов (нарастающим итогом), или 151 % от планового значения (412 микрозаймов).

Следует отметить, что в 2021 году финансирование Фонда микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта, не осуществлялась.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в целях реализации регионального проекта профинансированы 105,6 млн рублей. Средства освоены в полном объеме.

Профинансированные на реализацию регионального проекта бюджетные средства Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан направлены на проведение следующих мероприятий:

- предоставление грантов по программе «Агростартап» (32 заявителя из 16 муниципальных образований Республики Дагестан) – 85,6 млн рублей.

- предоставление субсидий сельскохозяйственным кооперативам (6 СПоК) - 16,97 млн рублей;

- софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 3,0 млн рублей.

По итогам 2021 года созданы 32 крестьянско-фермерских хозяйства, или 128 % от планового объема, 6 СПоК (120,0 %), а также предоставлена государственная поддержка 38 субъектам МСП, или 126,7 % от планового объема.

Достижение целевых показателей в ходе реализации регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

Согласно паспорту регионального проекта в 2021 году было предусмотрено достижение результатов в части увеличения объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП (0,01 млн рублей), а также количества субъектов МСП - резидентов созданных промышленных парков (1 единица). В связи с приостановлением мероприятия по строительству промышленного (индустриального) парка «Аврора» в 2020 году, указанные результаты не достигнуты.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**

- принять комплекс мер, направленных на анализ деятельности подведомственных учреждений с целью оперативного принятия мер по снижению рисков неосвоения выделенных бюджетных средств;

- провести инвентаризацию действующих объектов инфраструктуры для субъектов МСП с целью актуализации данных по их заполненности, специализации, территориального охвата;

- подготовить предложения по актуализации мероприятий по строительству промышленного (индустриального парка) «Аврора»;

- повышать финансовую грамотность заемщиков из числа субъектов МСП;

- усилить работу по информированию о мерах поддержки субъектов МСП и порядке предоставления микрозаймов во всех муниципальных образованиях республики;

- проводить проверки целевого использования средств, предоставленных субъектам МПС в целях оказания поддержки.



11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



Куратор национального проекта:

Омаров Н. М.

Врио Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Халилов Н. Р.

Врио министра промышленности и торговли
Республики Дагестан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» являются:

- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности;

- формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;

- достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долларов США в г. и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долларов США в год – 100 млрд долларов США в год.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта:

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан);

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);

3) «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту» (Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан).

В 2021 году на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» профинансированы расходы в сумме 32,48 млн рублей, или 100% от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 32,2 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,3 млн рублей).

На 1 января 2022 года освоение выделенных средств составило 32,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключение контрактов не предусмотрено.

Информация о реализации региональных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Дагестан представлена в следующей таблице.

Национальные (региональные) проекты	Профинансировано	Освоено		Остатки средств на 1 января 2022г.	
		Сумма	%	Сумма	%
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ», всего	32,48	32,48	100	0	0
1. «Промышленный экспорт»	0	0	0	0	0
2. «Экспорт продукции АПК»	32,48	32,48	100	0	0
3. «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту»	0	0	0	0	0

В ходе реализации национального проекта обеспечено достижение целевого показателя национального проекта (региональный проект «Экспорт продукции АПК»): «Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США» - 0,034 млрд долл (план - 0,027 млрд долл).



10.1. Региональный проект «Промышленный экспорт».

В ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» в предусмотрено достижение объема экспорта продукции машиностроения до 9 млн долларов США к 2024 году, а также объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 21,00 млн долларов США.

В 2021 году в соответствии с паспортом федерального проекта «Промышленный экспорт» отсутствует региональная составляющая, и не предусмотрено финансирование субъектов Российской Федерации.

Во исполнение мероприятий регионального проекта в течение 2021 года проделана следующая работа:

- на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан создан раздел «Международная кооперация и экспорт»;

- предприятиям Республики Дагестан направлена информация о порядке прохождения квалификационного отбора для участия в программе повышения конкурентоспособности предприятий;

- представители Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан, а также предприятия Республики Дагестан приняли участие в международных промышленных выставках («ИННОПРОМ: «Большая промышленная неделя в Узбекистане», XII Международный экономический саммит «Россия - Исламский мир», 9-е заседание Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому сотрудничеству, Белорусский промышленно-инновационный форум, Российско-Иракский бизнес форум и др);

- организованы встречи с Председателем Согдийской области Раджабоем Ахмадзода, Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина Абдельхафизом Нофалом, заместителем председателя организационного комитета Форума 2 Международного внешнеэкономического научно-практического форума Л.В. Теселкиной, торговым представителем Российской Федерации в Азербайджанской Республике Р.З. Мирсаяповым, а также с представителями Координационного Комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки, азербайджанской компанией «Material Group», Дагестанской таможни и др.

По данным Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан, объем экспорта продукции машиностроения» составил 2,6 млн долл. США¹³, или 57,7 % от планового значения (4,5 млн долл), объем конкурентоспособной промышленной продукции» - 28,6 млн долл. США, или 168,2 % от планового значения (17,0 млн долл.).

¹³ Данные Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации



11.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК».

В ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» было предусмотрено увеличение объема экспорта продукции отрасли (баранина, рис) в 2021 году до 27,3 млн долл. США.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» профинансированы расходы в сумме 32,48 млн рублей, или 100% от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 32,15 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,3 млн рублей).

На 1 января 2022 года фактически освоено 32,48 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (32,48 млн рублей).

Заключение контрактов не предусмотрено.

В рамках регионального проекта было запланировано оказание государственной поддержки мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортоориентированной продукции АПК (баранина, рис).

В 2021 году было запланировано увеличение площади мелиоративных работ на землях сельхозназначения до 1 950 га (в 2019 – 2020 годах работы проведены на землях площадью 1 704 га)

По результатам 2021 года ООО «Кизлярский мясокомбинат» завершил работы на землях общей площадью 502 га, или 100,4 % от планового объема (500 га) и получил субсидии в размере 32,48 млн рублей на возмещение части затрат на создание рисовых чеков. Таким образом, с момента реализации регионального проекта в Республике Дагестан (с 2019 года по 2021 год) проведены работы на площади 2 206 га и обеспечено выполнение (113,1 %) целевого показателя (1950 га).

Экспорт продукции АПК (письмо Минсельхоза России от 30 декабря 2021 года) по состоянию на 1 января 2022 года составил 34,1 млн дол. США, что составляет 125,0 % планового значения целевого показателя на 2021 год (27,3 млн долл. США).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает усилить взаимодействие Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан с экспортерами – производителями сельхозпродукции в целях своевременного мониторинга качества объема и ассортимента экспортируемой сельхозпродукции.



11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Региональный проект реализуется на основании заключенных в 2019 году соглашений между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории Республики Дагестан».

В 2021 году в целях приведения целей и показателей регионального проекта в соответствие с федеральным законодательством заключено дополнительное соглашение (№ 2019-Т6007-1/2 от 23 апреля 2021 года).

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Дополнительным соглашением от 18 декабря 2020 года № 2019-Т6007-1/1, заключенным между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан, основным целевым показателем проекта определен «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0»

В рамках заключенных соглашений, а также в целях досрочного внедрения на территории Республики Дагестан Регионального экспортного стандарта 2.0 в систему онлайн - мониторинг проведена следующая работа:

- разработан проект распоряжения Главы Республики Дагестан «Об утверждении Плана-графика по внедрению стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (региональный экспортный стандарт 2.0) в Республике Дагестан на 2022 год» (на согласовании);

- в целях приведения в соответствие организационно-правовой формы Постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 августа 2021 года № 201 создано АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан».

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает ускорить процедуры согласования проекта распоряжения Главы Республики Дагестан «Об утверждении Плана-графика по внедрению стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (региональный экспортный стандарт 2.0) в Республике Дагестан на 2022 год».



12. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»



Куратор: Омаров Н. М.

Врио Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Алиев Р. А.

Врио министра экономики и территориального
развития Республики Дагестан



Мугутдинова И. М.

Врио министра труда и социального развития Республики
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» являются:

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год;
- привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно;
- вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики;

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» Республика Дагестан участвует в реализации 2 федеральных проектов:

- 1) «Системные меры по повышению производительности труда»;
- 2) «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях»;

Ответственными исполнителями реализации регионального проекта являются Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по национальному проекту в 2021 году не предусмотрено.

Реализация проекта «Системные меры по повышению производительности труда» предусматривается с 2022 года. В ходе проекта предусмотрено обучение руководителей предприятий на программе «Лидеры производительности», оказание помощи в выходе на экспорт, предоставление займов по программе «Повышение производительности труда» от Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет и под 1 % годовых.

В реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» участвуют следующие предприятия республики: АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», АО «Завод Дагдизель».



12.1 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Региональный проект «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях» направлен на предоставление квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках, а также обучение сотрудников предприятий-участников методам повышения производительности труда.

Ответственными исполнителями реализации регионального проекта являются Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

В рамках мероприятий регионального проекта тренерами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» проведено обучение сотрудников АО «Завод «Дагдизель», АО «Международный аэропорт «Махачкала» и АО «Кизлярагрокомплекс»


Предприятия - участники Республики Дагестан принимают участие в образовательных мероприятиях, реализуемых Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» и АНОД ПО «Школа экспорта «АО РЭЦ» в рамках регионального проекта.

Обучение по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» прошли по одному представителю от АО «Кизлярагрокомплекс» и АО «Завод «Дагдизель», а также 3 представителя от ОАО «Концерн «КЭМЗ».

По программе «Акселератор экспортного роста» обучение прошел представитель от АО «Кизлярагрокомплекс».

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий	5	5	0
2		Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, возрастающий	40	50	125
3		Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.	5	5	100
4		Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек	40	50	125



13. Национальный проект «Наука и университеты»



Куратор:

Казиев Мурад Низамиевич
Врио заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан.



Руководитель региональных проектов:

Бучаев Яхья Гамидович
Врио министра образования и науки
Республики Дагестан

Национальный проект «Наука и университеты» включает в себя три федеральных проекта:

- «Развитие научной и научно-производственной кооперации»;
- «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации»;
- «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».

Вузы и научные учреждения республики принимают участие в двух федеральных проектах «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» и «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».

Финансирование национального проекта в 2021 году не предусматривалось.

За 2021 год учеными Республики Дагестан опубликовано около 2 тысяч научных статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в Всероссийской аттестационной комиссией (далее – ВАК).

На базе ведущих ВУЗов республики издается 9 журналов из перечня ВАК. В 2021 году 532 ученых Республики Дагестан опубликовали статьи в научных изданиях, индексируемых в международных базах.

Получены 95 патентов на изобретения по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития.

В рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» в 2021 году заключены соглашения о сотрудничестве вузов и научных организаций с крупными предприятиями с целью подготовки специалистов по отраслям экономики республики (ОАО «Корпорация развития Дагестана», АО «Завод Дагдизель» корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ОАО «Буйнакский агрегатный завод», АО «Завод Гаджиева», ООО «Проминтех», ОАО «Дагнефть-Роснефть», ООО «Домалогика», ООО «Ширококольский рыбокомбинат»).

В рамках реализации программы научно-образовательных консорциумов «Вернадский» 29 декабря 2021 года был подписан меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский—Дагестан».

В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет» заключен договор со Ставропольским государственным аграрным университетом от 1 декабря 2021 года № 12/153.

В целях выявления и поощрения молодых исследователей в ноябре 2021 года проведен Республиканский конкурс молодых ученых на звание «Лучший молодой ученый 2021 года». Определены 11 победителей.

Проблемы развития научной деятельности в Республике Дагестан носят системный характер. К ним следует отнести недофинансирование научных исследований и разработок. Финансирование за счет грантов, не позволяет создавать кадровый резерв и стабильные научные коллективы. Кроме этого, слабо развивается взаимодействие промышленности с наукой.

14. Выводы

14.1. За 2021 год на финансирование мероприятий национальных проектов, реализуемых на территории Республики Дагестан, осуществлены расходы в общей сумме 23 423,3 млн рублей, или 98,5 % от утвержденных назначений (23 787,3 млн рублей).

14.2. Из общей суммы профинансированных расходов на реализацию национальных проектов за 2021 год фактически освоено 17 079,2 млн рублей, или 73,0 % от объема финансирования (23 423,3 млн рублей) и 71,8 % от объема годовых назначений (23 787,3 млн рублей)

14.3. Проведенный мониторинг реализации национальных проектов показал, что в 2021 году темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований, как и в предыдущие два года реализации национальных проектов в Республике Дагестан, были недостаточны для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий, освоения бюджетных ассигнований, а также достижения значений целевых показателей национальных (региональных) проектов. В результате, на 1 января 2022 года, неосвоенный (не использованный) остаток бюджетных средств составил 6 708,1 млн рублей, или 28,2 % от годовых назначений (23 787,3 млн рублей), в том числе по следующим национальным проектам:

- «Демография» - 1 482,7 млн рублей, или 19 % от объема финансирования (7 812,6 млн рублей);

- «Образование» - 4 652,0 млн рублей, или 61,8 % от объема финансирования (7 521,7 млн рублей), и 59,0 % от объема годовых назначений (7 866,3 млн рублей);

- «Здравоохранение» - 337,5 млн рублей, или 12,0 % от объема финансирования (2 816,8 млн рублей);

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 147,5 млн рублей, или 5,5 % от объема финансирования (2 682,0 млн рублей);

- «Культура» - 52,7 млн рублей, или 11,2 % от объема финансирования (469,5 млн рублей);

- «Жилье и городская среда» - 34,4 млн рублей, или 1,9 % от объема финансирования (1 800,9 млн рублей).

14.4. Основными причинами неисполнения мероприятий региональных проектов и неосвоения предусмотренных бюджетных ассигнований в полном объеме в 2021 году, как и в предшествующие годы, продолжают оставаться следующие:

- низкое качество организации и планирования мероприятий региональных проектов и несоблюдение процедур планирования закупок, которые должны

быть начаты еще на стадии формирования бюджетных показателей, в результате чего риски реализации были созданы еще на стадии планирования («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика»);

- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объемы финансирования, предусматриваемые в региональных проектах, не соответствуют объемам, утвержденным в государственных программах Республики Дагестан и бюджетным ассигнованиям, утвержденным в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год («Демография», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Цифровая экономика»);

- несвоевременное заключение контрактов в виду нарушений при подготовке аукционной документации и проведении конкурсных процедур («Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика»);

- планирование основного объема кассовых расходов на III-IV кварталы, а также установление сроков выполнения работ по контрактам до конца года;

- низкие темпы финансирования и кассового освоения бюджетных ассигнований;

- ненадлежащее исполнение подрядчиками (поставщиками) условий заключенных контрактов;

- низкий уровень контроля за своевременностью выполнения обязательств по контрактам и непроведение претензионной работы с поставщиками товаров, за нарушение условий, сроков и обязательств по контрактам;

- принятие в течение года дополнительных обязательств, при наличии текущих рисков своевременного завершения мероприятий проектов, выполнение которых также было сопряжено со значительными рисками неосвоения бюджетных ассигнований («Безопасные и качественные автомобильные дороги»);

- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации по объектам строительства и реконструкции;

- неэффективная организация производительности труда, дефицит высококвалифицированных кадров строительных специальностей, отставание от графика строительно-монтажных работ;

- низкие темпы строительных работ и низкий уровень организации строительного контроля;

- низкое качество планирование целевых показателей.

14.5. Проблемы с освоением средств, профинансированных на реализацию национальных проектов в 2021 году, прежде всего, были связаны с недостатками в планировании и организации строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Общий объем неосвоенных средств по национальным проектам в виду незавершения строительных работ в установленные сроки составил 6 334,1 млн рублей.

14.6. В ходе реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» предусмотрены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию социально значимых объектов, а также капитальному ремонту дорог, которые сопровождаются постоянными рисками несвоевременного выполнения работ и неосвоения выделенных средств.

Необходимо подчеркнуть, что планирование общего количества объектов, строительство которых предусматривалось в рамках реализации национальных проектов в Республике Дагестан в 2019-2021 годах, осуществлено без оценки реальных возможностей реализации указанных мероприятий.

С учетом вышеизложенного, в 2021 году не обеспечено завершение строительства и реконструкции (капитального ремонта) объектов в рамках реализации мероприятий следующих национальных проектов: «Демография» (6 детсадов на 540 мест и 20 детсадов (ясли) на 3 790 мест), «Образование» (12 школ на 7 104 мест), «Жилье и городская среда» (4 объекта водоснабжения), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2 объекта по дорогам муниципальной и региональной значимости).

Кроме того, не начато строительство 13 школ на 6 624 мест (национальный проект «Образование»), планируемых к завершению в 2021 году, а также не выполнен плановый объем строительства по объекту «Строительство Центра культурного развития в городе Кизляре» (национальный проект «Культура»).

14.7. В целях своевременного исполнения программных мероприятий распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р, строительство объектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» было передано ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации, с которым заключены соответствующие контракты. Однако, как показала практика двух лет, уровень организации работ и темпы строительства ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» не позволяют своевременно осваивать профинансированные лимиты, в результате чего сроки завершения строительства отдельных объектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Образование», и «Демография» ежегодно переносятся на следующий год.

14.8. Организация процесса строительства объектов осуществляется ФГУП «ГВСУ № 4» путем заключения субподрядов со строительными организациями, которые ведут свою деятельность на территории Республики Дагестан. При этом ФГУП «ГВСУ № 4» не обеспечивается качественный контроль за субподрядчиками в ходе выполнения строительства. В результате наблюдаются низкие темпы выполнения строительных работ и несоблюдение установленного рабочего графика проведения работ. Тем не менее, ФГУП «ГВСУ № 4» не принимаются действенные меры по наращиванию динамики строительных работ.

14.9. С учетом практики строительства объектов образования в Республике Дагестан, сложившейся в ходе реализации национальных проектов «Демография» и «Образования» в 2019 г. – 2020 г., сроки строительства по одному объекту составляют от 6 месяцев до 1,5 года в зависимости от его мощности (количество мест).

Низкое качество проектно-сметной документации, технологическое отставание строительных работ от установленного графика, низкая производительность труда, дефицит высококвалифицированных кадров строительных специальностей, а также труднодоступность отдельных объектов, расположенных в горной местности в совокупности не позволяют реализовать начало, завершение и ввод строительного объекта в эксплуатацию в течение одного года. В результате, сроки завершения строительства объектов, реализуемых в рамках национальных проектов «Образование», и «Демография» ежегодно переносятся на следующий год.

14.10. Основная часть лимитов финансирования на строительство объектов как правило доводится во II полугодии текущего года. Однако, ответственные исполнители не готовы в сжатые сроки осваивать значительный объем бюджетных ассигнований, профинансированных на строительство объектов.

Следует отметить, что проблемы наблюдаются не только при строительстве объектов, но и в части ввода завершенных объектов в эксплуатацию.

14.11. Основной объем расходов по национальным проектам предусмотрен по мере оплаты товаров, работ, услуг в рамках заключенных контрактов за фактически выполненные объемы работ (товары, услуги). Однако, ответственными министерствами и ведомствами за реализацию национальных (региональных) проектов, в 2021 году не выполнены поручения Правительства

Республики Дагестан¹⁴ о необходимости заключении всех контрактов к установленному сроку, в том числе до: 30 апреля 2021 года, 5 сентября 2021 года, 31 октября 2021 года.

14.12. Длительные процедуры согласования с федеральными министерствами планового объема контрактов, а также необходимость утверждения нормативных документов¹⁵, привели к тому, что процедуры по заключению контрактов по отдельным национальным проектам были завершены только в декабре 2021 года («Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

14.13. По национальным проектам «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Цифровая экономика» низкое качество подготовки документов в целях проведения аукционных процедур, а также нарушения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» привели к жалобам участников торгов, отмене аукциона или определения поставщика по контракту.

Согласно жалобам, заказчиками при проведении аукциона, допущено несоответствие аукционной документации требованиям законодательства о контрактной системе, которое приводит к ограничению количества заявок на участие в конкурсе.

Поздние сроки заключения контрактов и необеспечение должного уровня контроля за их исполнением, привели к несвоевременному выполнению обязательств и неосвоению бюджетных средств. Отмечены случаи нарушений сроков исполнения контрактов, несвоевременной и некачественной поставки оборудования, а также факты расторжения контрактов («Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура»).

14.14. В 2021 году муниципальные образования Республики Дагестан принимали участие в реализации мероприятий национальных проектов «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура».

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» сроки исполнения мероприятий, предусмотренных

¹⁴ п. 9 протокола расширенного заседания Правительства Республики Дагестан от 17 февраля 2021 года, а также пункт 2.3 протокола Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан от 9 апреля 2021 года № 07-17/2.

¹⁵ «Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан (утвержден постановлением от 24 ноября 2021 года № 321)

План-графиками, систематически не соблюдались. Администрацией г. Махачкалы не на должном уровне проведена разъяснительная работа с гражданами, проживающими в аварийных многоквартирных домах, в том числе в части определения наиболее подходящего для жильцов способа расселения, что привело к затягиванию сроков заключения договоров с жильцами аварийных многоквартирных домов.

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» контракты на строительство объектов были заключены в мае месяце 2021 года, что позволяло обеспечить своевременное завершение работ по строительству и реконструкции очистных сооружений. Однако, администрации муниципальных образований систематически не соблюдали график производства работ и ежемесячный план кассового освоения средств. В результате плановый ввод 4 объектов водоснабжения в 2021 году перенесен на 2022 год.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы не обеспечило своевременное завершение работ по укладке и замене инженерных коммуникаций, что привело к срыву сроков выполнения работ по асфальтированию улиц Коркмасова, Радищева, Абубакарова, А-Х Кадырова, предусмотренных в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 64,58 млн рублей.

14.15. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» недостатки, допущенные на этапе подготовки мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть», а также длительные сроки прохождения экспертизы проектной документации привели к срыву сроков заключения контрактов. В то же время, при наличии рисков выполнения текущих обязательств по региональному проекту, дополнительно приняты обязательства в части освоения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 400,0 млн рублей, выделенных на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года №1769-р на финансовое обеспечение дорожной деятельности (капитальный ремонт 27 км объектов улично-дорожной сети г. Махачкалы) в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» с завершением мероприятий в 2021 году.

В дальнейшем, в связи с обращением Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан о наличии рисков своевременного исполнения мероприятий и необходимости переноса объемов работ на сумму 200,0 млн рублей за счет средств федерального бюджета, выделенных Правительством Российской Федерации от 30 июня 2021 года №1769-р, с 2021

года на 2022 год, указанные средства были секвестированы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 августа 2021 года № 2219-р). Тем не менее, в 2021 году по региональному проекту «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по объектам Махачкалинской агломерации остались неосвоенными 28,9 млн рублей.

14.16. В 2021 году в ходе реализации национальных (региональных) проектов было предусмотрено достижение 153 целевых показателей, что на 68 целевых показателей меньше по сравнению с 2020 годом (221 целевых показателей).

Согласно данным, Государственной информационной системы «Электронный бюджет» по состоянию на 1 января 2022 года обеспечено достижение плановых значений по 120 целевым показателям, в том числе с перевыполнением по 47 целевым показателям. Не выполнены плановые значения по 33 целевым показателям по 4 национальным проектам, в том числе:

- по национальному проекту «Демография» - 3 целевых показателя из 22 целевых показателей;
- по национальному проекту «Здравоохранение» - 28 целевых показателей из 85 целевых показателей;
- по национальному проекту «Цифровая культура» – 1 целевой показатель из 10 целевых показателей;
- по национальному проекту «Жильё и городская среда» – 1 целевой показатель из 14 целевых показателей.

Результаты проведенного анализа выполнения целевых индикаторов региональных проектов в 2021 году свидетельствуют о низком качестве планирования системы показателей региональных проектов, возможном занижении прогнозных оценок, а также о наличии целевых показателей, значения которых не имеют динамику роста по сравнению с базовыми значениями. Так, из 120 исполненных целевых показателей, уровень достижения в размере от 100 % до 110 % отмечен по 74 целевым показателям, от 110 % до 200 % по 27 целевым показателям, от 200 % и выше по 19 целевым показателям.

По национальному проекту «Здравоохранение» обеспечено достижение фактических значений, значительно превышающих плановые значения по целевым показателям на 2021 год. Указанное свидетельствует о занижении прогнозных оценок и несвоевременной корректировке плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.

Следует отметить, что обеспеченные финансированием мероприятия по отдельным региональным проектам, не всегда взаимосвязаны с целевыми показателями их реализации. При наличии неосвоенных остатков бюджетных

средств и незавершенных мероприятий, обеспечено достижение целевых показателей в полном объеме по следующим региональным проектам: «Современная школа» («Образование»), «Чистая вода» («Жилье и городская среда»), «Дорожная сеть» («Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

14.17. Счетная палата Республики Дагестан в ходе проводимого мониторинга неоднократно отмечала, что нарушения и недостатки, допущенные в ходе реализации национальных проектов значительно увеличивают риски эффективной реализации национальных проектов. Указанное следует отметить и в части нарушений и недостатков на общую сумму 2 114,13 млн рублей, выявленных в ходе проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, профинансированных на реализацию национальных проектов в 2021 году, в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 88,43 млн рублей (в том числе: нецелевое расходование средств – 1,5 млн рублей, завышение стоимости выполненных работ – 5,2 млн рублей);

- нарушение ведения бухгалтерского учета – 56,3 млн рублей;

- нарушение при осуществлении закупок – 131,2 млн рублей;

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью – 400,0 млн рублей;

- иные нарушения – 68,5 млн рублей (в том числе: неправомерные расходы – 54,8 млн рублей, прочие нарушения – 13,6 млн рублей);

- неэффективное использование бюджетных средств – 1 369,7 млн рублей.

14.18. Негативной практикой последних лет, на которую Счетная палата Республики Дагестан неоднократно обращала внимание, стали факты неэффективного использования медицинского и прочего оборудования, приобретаемого за счет бюджетных средств (дорогостоящее оборудование зачастую простаивает, не распаковано, персонал не прошел обучение для работы с современной техникой), в том числе:

- по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», закупленное для ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» дорогостоящее оборудование (линейные ускорители) на сумму 652,86 млн рублей не установлено и не функционирует, что может привести к его моральному износу. До настоящего времени не получено заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации по строительству референс-центра в ГБУ РД "Республиканский онкологический центр», подготовленной в 2020 году в целях размещения линейных ускорителей;

- Министерством труда и социального развития Республики Дагестан произведены расходы в сумме 16,85 млн рублей за счет федеральных субвенций,

предусмотренных по целевой статье 55730 (Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка), при наличии эффективно работающей автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» по техническому сопровождению осуществления ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, на приобретение идентичного программного комплекса «Катарсис: соцзащита»;

- в ГБУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева часть оборудования, приобретенного для оснащения мастерских на общую сумму 9,91 млн рублей не была смонтирована и не задействована в учебном процессе;

- в ГБУ РД «Дагестанский институт развития образования» часть оборудования, приобретенного для центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов на общую сумму 8,8 млн рублей не смонтирована и не задействована в учебном процессе.

14.19. Следует отметить, что недостатки, допущенные в ходе реализации национальных (региональных) проектов, свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны соответствующих кураторов национальных проектов по Республике Дагестан и ответственных исполнителей (руководителей министерств и ведомств Республики Дагестан) за организацией и реализацией мероприятий региональных проектов.

14.20. В ходе проводимого мониторинга, помимо оценки текущих рисков своевременного освоения финансовых средств и достижения целевых показателей, Счетная палата Республики Дагестан ориентирована на проведении комплексной оценки эффективности, достаточности и необходимости мероприятий региональных проектов, а также оценке их вклада в достижение национальных целей. Как показали результаты проведенного мониторинга, ответственным министерствам и ведомствам в 2022 году в ходе реализации национальных (региональных) проектов помимо освоения предусмотренных бюджетных ассигнований и достижения целевых показателей, необходимо обеспечить повышение качества реализации региональных проектов, достижение национальных целей, а также повышение эффективности использования бюджетных ассигнований.

15. Предложения

По результатам мониторинга реализации национальных проектов Счетная палата Республики Дагестан предлагает:

- провести детальный анализ итогов реализации национальных (региональных) проектов в целях исключения возможных рисков их выполнения в 2022 году;

- принять комплекс мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, допущенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2021 году;

- привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших принятие решений, приведших к нарушениям и недостаткам в ходе реализации национальных проектов, а также образованию значительного объема неиспользованных средств (остатков);

- подготовить предложения по корректировке показателей региональных проектов с учетом оценки результатов их реализации за 2021 год и планируемых объемов финансирования на 2022 год;

- обеспечить своевременное финансирование мероприятий и эффективное освоение средств, выделенных на реализацию национальных (региональных) проектов в 2022 году;

- принять меры по своевременному заключению контрактов и обеспечить качественное исполнение принятых обязательств;

- принять меры по своевременной подготовке и корректировке проектно-сметной документации по объектам, строительство которых планируется в 2022 году. При этом обеспечить соблюдение нормативных сроков строительства объектов;

- усилить контроль за ходом строительства объектов и вводом их в эксплуатацию;

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов и участвующих в процессе реализации национальных проектов в целях оперативного контроля за своевременным выполнением целевых показателей;

- обеспечить в ходе реализации проекта эффективное взаимодействие с муниципалитетами, участниками реализации региональных проектов с целью своевременной реализации запланированных мероприятий и достижению намеченных целевых показателей;

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить возможные риски реализации национальных проектов в 2022 году, обеспечит своевременное освоение выделяемых средств, а также достижение запланированных целевых показателей.

**Счетная палата
Республики Дагестан**
