

## **ИНФОРМАЦИЯ**

### **о реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 августа 2020 года**

Счетной палатой Республики Дагестан, в соответствии с Планом работы на 2020 год проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 августа 2020 года, по результатам которого установлено следующее.

**1.** В 2020 году Республика Дагестан участвует в реализации 12 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука».

В рамках указанных нацпроектов реализуется 54 региональных проекта (в 2019 году – 51 региональный проект) в составе мероприятий 22 государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

**2.** В 2020 году на финансовое обеспечение национальных (региональных) проектов предусмотрены средства в сумме 28 069,6 млн рублей<sup>1</sup>, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 23 975,7 млн рублей, или 85,4 % от объема утвержденных назначений;

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 4 093,9 млн рублей или 14,6 % от объема утвержденных назначений;

В общем объеме бюджетных ассигнований (28 069,6 млн рублей) наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных проектов «Демография» – 11 853,8 млн рублей, или 42,2 %, «Образование» – 7 696,6 млн рублей, или 27,4 % и «Здравоохранение» – 3 646,5 млн рублей, или 13,0 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

На реализацию национальных проектов в 2020 году запланировано также финансирование в сумме 1 742,4 млн рублей, в том числе за счет средств:

- Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 552,8 млн рублей;

- Федерального фонда социального страхования – 82,0 млн рублей;

- муниципальных образований – 50,4 млн рублей;

- иных источников – 57,23 млн рублей.

---

<sup>1</sup> Уточнено по состоянию на 1 августа 2020 года.

3. По состоянию на 1 августа 2020 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 9 897,84 млн рублей, или 35,3 % от объема утвержденных назначений в сумме 28 069,6 млн рублей (информация о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию национальных проектов приведена в приложении № 1).

Кассовое исполнение составило 5 665,6 млн рублей, что составляет 57,2 % от объема финансирования (9 897,84 млн рублей), или 20,2 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (28 069,6 млн рублей).

Указанные средства направлены на финансирование 28 региональных проектов (из 32 финансируемых) в рамках 10 национальных проектов.

### Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов по состоянию на 1 августа 2020 года

млн рублей



4. Проведенный анализ финансирования и освоения средств, выделенных на реализацию национальных (региональных) проектов показал следующее.

4.1. На 1 августа 2020 года наибольший уровень расходов к годовым назначениям освоено по национальным проектам в «Экология» – 71,4 %, «Культура» – 56,4 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 33,7 %.

Наименьший уровень освоения сложился по национальным проектам «Здравоохранение» – 3,4 % и «Образование» – 4,9 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан. При этом в текущем году не профинансированы расходы по национальному проекту «Цифровая экономика».

4.2. По национальному проекту «Демография» сложившийся уровень освоения (31,0 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям) в основном обеспечен за счет осуществления ежемесячных выплат при рождении первого ребенка по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (50,9 % от утвержденных назначений).

Однако, по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» национального проекта «Демография», в ходе которого запланировано строительство социально значимых объектов, исполнение расходов составляет всего 22 % к утвержденным назначениям на 2020 год.


4.3. По данным Счетной палаты Российской Федерации в общероссийском масштабе наибольшие объемы освоения к годовым назначениям наблюдаются по национальным проектам «Здравоохранение» – 58,7 %, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 54,9 % и «Жилье и городская среда» – 49,2 %.

4.4. На 1 августа 2020 года по сравнению с 1 июля 2020 года объем профинансированных средств увеличился на 2 521,8 млн рублей, или на 34,2 %.

Наблюдается также рост освоенных средств на 1 221,1 млн рублей, или на 27,5 %. Однако, несмотря на наметившийся рост, существующие темпы объемов финансирования и освоения средств недостаточны для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий и достижения целевых показателей на 2020 год.

Уровень финансирования расходов на национальные (региональные) проекты в общем объеме финансирования расходов республиканского бюджета Республики Дагестан (85 276,78 млн рублей) на 1 августа 2020 года составляет 11,6 %. При этом уровень кассового исполнения расходов на национальные (региональные) проекты в общем объеме исполнения расходов республиканского бюджета РД (73 353,4 млн рублей) составляет 7,7 %.

**Динамика финансирования и освоения бюджетных ассигнований,  
выделенных на реализацию национальных (региональных)  
проектов в Республике Дагестан в 2020 году**

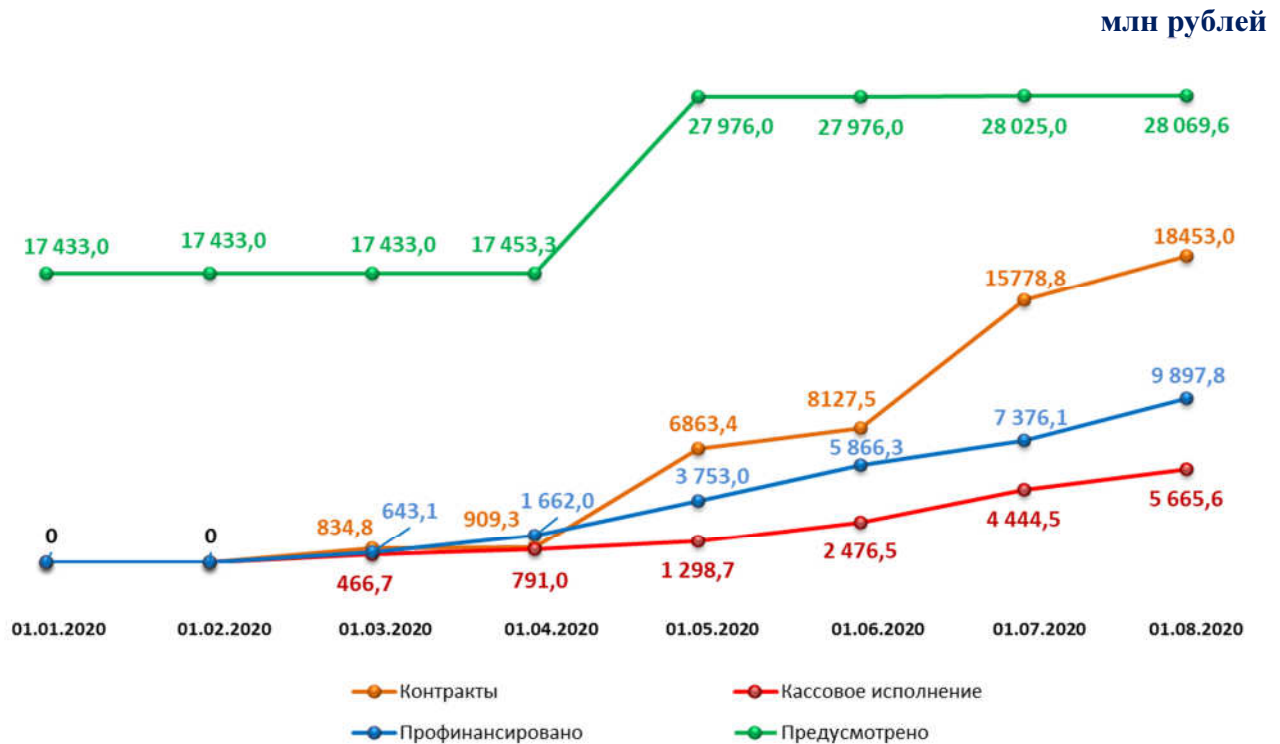

**5. Анализ финансирования и освоения средств на реализацию национальных (региональных) проектов.**

**5.1. Национальный проект «Демография».** В 2020 году на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 853,8 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 10 428,4 млн рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 425,4 млн рублей.

Согласно дополнительному финансовому соглашению от 1 июня 2020 года № 150-09-2020-184/1 (региональный проект «Старшее поколение») и дополнительному финансовому соглашению от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1 (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»), размер субсидий, предоставляемых Республике Дагестан в 2020 году на реализацию регионального проекта «Демография», уменьшен в общей сумме на 65,17 млн рублей. Уточненный размер бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта «Демография» по состоянию на 6 августа составляет 11 788,7 млн рублей в том числе за счет федерального бюджета – 10 363,9 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 424,8 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 5 334,5 млн рублей, или 45,0 % от утвержденных назначений.

Кассовое исполнение составило 3 670,5 млн рублей, или 68,8% от объема финансирования (5 334,5 млн рублей), или 31,0 % от объема утвержденных годовых назначений (11 853,8 млн рублей).

В 2020 году по нацпроекту «Демография» из 5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных проектов:

- «Финансовая поддержка женщин при рождении детей»;
- «Содействие занятости женщин – создание условий школьного образования для детей в возрасте 3-х лет»;
- «Старшее поколение»;
- «Спорт-норма жизни».

**5.1.1.** Выделенные средства направлены на финансирование мероприятий 4 региональных проектов:

**1)** Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 1 961,4 млн рублей, или 51,0 % от утвержденных назначений (3 846,1 млн рублей).

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на ежемесячные выплаты на первого ребенка (в 2020 году – 6,38 тыс. семей, с нарастающим итогом с начала реализации национального проекта – 27,4 тыс. семей или 294,6 % от планового объема на 2020 год (9,3 тыс. семей).

Кассовое исполнение составило 1 956,4 млн рублей, или 99,7 % от объема финансирования (1 961,4 млн рублей), или 50,9 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (3 846,1 млн рублей).

За счет средств Территориального фонда ОМС обеспечено проведение 502 процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, на сумму 49,7 млн рублей или 32,4 % от планового объема на 2020 год (1,55 тыс. циклов).

**2)** Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» – 3 192,0 млн рублей, или 41,3 % от утвержденных назначений (7 721,1 млн рублей), направлены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. На авансирование работ по строительству объектов направлено 1 690,6 млн рублей, что составляет 53,0 % от объема финансирования (3 192,0 млн рублей), или 21,9 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (7 721,1 млн рублей).

Кассовое исполнение по строительству объектов дошкольного образования составило 248,8 млн рублей, или 14,7 % от объемов авансирования (1 690,6 млн рублей), или 3,2 % от предусмотренного финансирования на 2020 год (7 692,3 млн рублей).

В целях переобучения и повышение квалификации в учебные центры направлены 14 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Согласно дополнительному финансовому соглашению от 1 июня 2020 года № 150-09-2020-068/1 на 24,81 млн рублей, или на 86,2 % уменьшен размер субсидии, предоставляемой Республике Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также плановое количество обучаемых до 68 человек против изначальных

497 человек. Финансирование на реализацию мероприятия на 1 августа 2020 года отсутствует.

**3)** Региональный проект «Старшее поколение» – 0,05 млн рублей, или 0,1 % от утвержденных назначений (55,0 млн рублей). Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции для вакцинации лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Кассовое исполнение составило 0,05 млн рублей, что составляет 100 % от объема финансирования, или 0,1 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (55,0 млн рублей).

На вакцинацию против пневмококковой инфекции запланировано 0,05 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Проведение вакцинации предусмотрено в августе текущего года. Следует отметить, что согласно приказу Минздрава РД от 17.12.2019 г. № 1258-Л контингент лиц, подлежащих вакцинации, составляет 127 человек. В настоящее время планируется внесение изменений в данный приказ в части снижения количества лиц старше трудоспособного возраста, подлежащих вакцинации в 2020 году до 91 человек против изначальных 127. При этом, объем предусмотренного финансирования мероприятия не пересмотрен.

В целях профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования направлены 37 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста.

Согласно дополнительному финансовому соглашению от 1 июня 2020 года № 150-09-2020-184/1 на 40,4 млн рублей, или на 73,5 % уменьшен размер субсидии, предоставляемой Республике Дагестан на обучение граждан в возрасте 50 лет и старше (14,55 млн рублей), а также плановое количество обучаемых до 180 человек против изначальных 680 человек.

**4)** Региональный проект «Спорт-норма жизни» – 181,0 млн рублей, или 78,1 % от утвержденных назначений (231,7 млн рублей). Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на реализацию мероприятий по поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, а также на строительство футбольного поля в сел. Ансалта Ботлихского района. На строительном объекте выполнены земляные работы и работы по подготовке основания для фундамента, проводятся работы по устройству опалубки и армированию фундаментов. Техническая готовность объекта составляет 3,5 %.

Кассовые расходы исполнены в сумме 23,4 млн рублей, что составляет 12,9 % от объема финансирования, или 10,1 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (231,74 млн рублей).

**5.1.2.** В рамках нацпроекта «Демография» предусмотрено заключение 78 контрактов по 3 региональным проектам. По состоянию на 1 августа 2020 года заключено 67 контрактов на сумму 7 557,1 млн рублей, или 87,2 % от планового объема на 2020 год, в том числе:

- региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 3-х лет» – 57 контрактов на сумму 7 355,0 млн рублей, или 96,6 % от запланированного объема (59 контрактов).

Контракты заключены в целях реализации мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений (55 контрактов на сумму 7 354,67 млн рублей), организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (2 контракта на обучение 8 женщин на сумму 285,0 тыс. рублей);

- региональный проект «Старшее поколение» – 5 контрактов на сумму 0,36 млн рублей, или 83,3 % от запланированного объема (6 контрактов), в том числе по мероприятию по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста – 4 контракта на сумму 309 тыс. рублей по обучению 2 лиц, а также по мероприятию по вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 1 контракт на сумму 53,5 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема;

- региональный проект «Спорт - норма жизни» – 5 контрактов на сумму 201,7 млн рублей, или 38,5 % от запланированного объема (13 контрактов), в том числе: по строительству футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в сел. Ансалта Ботлихского района – 1 контракт на сумму 144,2 млн рублей; по искусственному покрытию футбольного поля в г. Буйнакск – 1 контракт на сумму 7,45 млн рублей; по спортивной экипировке – 1 контракт на сумму 23,4 млн рублей; по поставке комплектов спортивного оборудования – 1 контракт на сумму 26,6 млн рублей.

**5.1.3.** В ходе реализации национального проекта «Демография» в 2020 году предусмотрены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, которые сопряжены со значительными рисками обеспечения своевременного выполнения строительных мероприятий и освоения выделенных средств.

По региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрены следующие мероприятия:

- *мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 20 детских садов на 1 950 мест (незавершенное строительство за 2019 год), по которым разработана проектно-сметная документация (ПСД) и получены положительные заключения по результатам ее государственной экспертизы.*

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р генеральным подрядчиком строительства объектов является ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «ГВСУ № 4»

Министерства обороны Российской Федерации), которым заключены субподряды с 7 организациями.

На реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные средства в сумме 1 769,96 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 1 130,33 млн рублей и республиканского бюджета – 639,63 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2020 года профинансировано 703,9 млн рублей, или 39,8 % от утвержденных назначений (1 769,96 млн рублей). Средства направлены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Авансирование проводимых работ ФГУП «ГВСУ № 4» Министерства обороны Российской Федерации составило 541,6 млн рублей.

По 9 объектам объем принятых работ составил 109,1 млн рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 98,2 млн рублей, или 5,5 % от утвержденных годовых назначений (1 769,96 млн рублей).

Проведенный анализ показал, что из 20 детских садов, запланированных к вводу в текущем году, уровень строительной готовности по 4 объектам составляет до 30 процентов, по 7 объектам – до 50 процентов и 7-ми объектам – более 60 процентов.

Сроки ввода по 16 объектам предусмотрены в сентябре 2020 года. По 3 объектам ввода в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года.

По 2 объектам строительство завершено и готовится их ввод (детский сад на 100 мест в г. Каспийск (МКР № 10) и детский сад на 60 мест в с. Магарамкент Магарамкентского района);

*- в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2020 году запланировано строительства и ввод эксплуатацию 35 детских садов на 6 750 мест, а также начало строительства 2 детских садов на 400 мест.*

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р генеральным подрядчиком строительства объектов является ФГУП «ГВСУ № 4» Министерства обороны Российской Федерации, которым заключены субподряды с 12 организациями.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 5 922,3 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 5 150,1 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 772,3 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2020 года профинансировано 2 488,1 млн рублей, или 42,0 % от утвержденных назначений (5 922,3 млн рублей). Средства направлены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Авансирование проводимых работ составило 1 309,0 млн рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 150,6 млн рублей, или 2,5 % от утвержденных годовых назначений (5 922,3 млн рублей).

Разработана ПСД и получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы по 33 объектам.

По 2 объектам, срок ввода которых определен на 1 декабря 2020 года, заключение экспертизы ПСД отсутствует (детсад на 120 мест (60 ясельных) в г. Хасавюрт в МКР «Олимпийский», детсад на 120 ясельных мест в с. Унцукуль



Унцукульского района), в связи с чем строительство по объектам не начато. Также не проводятся работы по строительству детсада в г. Дербент (250 ясельных мест) в связи с тем, что на участке для строительства присутствует артезианская скважина, а также детсада в Уллуая Левашинского района на (250 ясельных мест) в связи с проведением подготовительных работ.

Уровень строительной готовности 21 объекта составляет до 20 %, а 10 объектов – до 60 %.

Сроки окончания строительства объектов, запланированных к вводу в 2020 году, определены в сентябре 2020 года (5 объектов) и в декабре 2020 года. По 5 объектам, запланированным построить в сентябре 2020 года, техническая готовность составляет от 16 % до 57,4 %.

По детсадам в сел. Тарумовка Тарумовского района на 200 мест и сел. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест, запланированным к вводу в эксплуатацию в 2021 году, контракты не заключены.

**5.1.4.** С учетом неритмичного финансирования по национальному проекту «Демография» не исключены риски несвоевременного освоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей. Учитывая низкие темпы работ и не соблюдение графика строительно-монтажных работ, Счетная палата Республики Дагестан отмечает о наличии значительных рисков завершения строительства объектов и ввода в эксплуатацию в установленные сроки.

По состоянию на 1 августа 2020 года работа по формированию полного пакета документации, необходимого для строительства, по отдельным объектам не завершена.

Кроме этого, уменьшение значений целевых показателей по региональному проекту «Старшее поколение» (снижение количества лиц старше трудоспособного возраста, подлежащих вакцинации в 2020 году с 127 до 91 человек, количества граждан в возрасте 50-ти лет и старше с 680 человек до 180 человек), региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (снижение количества обучаемых женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 497 человек до 68 человек) отрицательно отражается на достижении национальных целей по национальному проекту «Демография» («Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации», «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», «Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года»).

**5.2. Национальный проект «Здравоохранение».** В 2020 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 3 646,5 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 3 430,3 млн рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 216,2 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 199,7 млн рублей, что составляет 5,5 % от утвержденных назначений.

Кассовые расходы исполнены в сумме 123,2 млн рублей, что составляет 61,7 % от объема финансирования (199,7 млн рублей), или 3,4 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (3 646,5 млн рублей).

В 2020 году финансирование по нацпроекту предусмотрено на реализацию 6 региональных проектов:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

**5.2.1.** В рамках нацпроекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 5 региональных проектов:

**1)** Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – 50 млн рублей, или 7,2 % от утвержденных назначений (696,6 млн рублей). Выделенные средства направлены на реализацию мероприятий по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

Кассовое исполнение составило 50 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 7,2 % от объема утвержденных назначений (696,6 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2020 года осуществлено 147 вылетов вертолетом санитарной авиации, обслужено 198 пациентов, или 132 % от планового объема. В том числе 19 детей, доставлены в медицинские организации.

**2)** Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 58,0 млн рублей, или 16,3 % от предусмотренного финансирования (355,45 млн рублей). Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Городская клиническая больница» и ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации.

Кассовые расходы исполнены в сумме 58,0 млн рублей, что составляет 100 % от объема финансирования, или 16,3 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (355,45 млн рублей). Средства направлены в ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» на финансирование заключенного контракта по поставке компьютерного томографа.

3) Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – 73,2 млн рублей, или 22,2 % от утвержденных назначений (329,3 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует.

4) Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – 13,52 млн рублей, или 5,9 % от утвержденных назначений (229,49 млн рублей). Бюджетные средства перечислены ГБУ ДПО РД «Дагестанское медицинское училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» на реализацию мероприятий по подготовке специалистов по основным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.

Кассовые расходы исполнены в сумме 13,52 млн рублей, что составляет 100 % от объема финансирования, или 5,9 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (229,49 млн рублей).

На 1 августа 2020 года число специалистов, прошедших профобучение составило 2 037 человек.

5) Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 5,1 млн рублей, или 0,4 % от утвержденных назначений (1 249,5 млн рублей). Бюджетные средства перечислены ГБУ РД «ДЦМК» на реализацию мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности (установка серверного оборудования и программного обеспечения).

Кассовые расходы исполнены в сумме 1,72 млн рублей, что составляет 34,1 % от объема финансирования, или 0,1 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (1 249,5 млн рублей).

4.2.2. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено заключение 80 контрактов по 5 региональным проектам. На 1 августа 2020 года заключено 45 контрактов на сумму 969,1 млн рублей, или 56,3 % от планового объема на 2020 год (80 контрактов), в том числе:

- региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – 9 контрактов или 64,3 % от планового объема (14 контрактов) на общую сумму 395,9 млн рублей, в том числе: 2 контракта по 20 ФАП на сумму 80,5 млн рублей, по санитарной авиации контракт на сумму 48,45 млн рублей, по оснащению ФАП 2020 года контракт на сумму 26,0 млн рублей; по передвижным мобильным комплексам (ПМК) 5 контрактов на общую сумму 241,0 млн рублей;

- региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 27 контрактов на сумму 195,8 млн рублей по мероприятию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в рамках лекарственного обеспечения

пациентов высокого риска, или 58,7 % от запланированного объема (46 контрактов);

- региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 3 контракта на сумму 22,9 млн рублей на поставку медицинского оборудования для оснащения ЦАОП г. Буйнакск, или 37,5 % от планового объема (8 контрактов);

- региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – 4 контракта на сумму 302,68 млн рублей на поставку 2 магнитно-резонансных томографов и 2 компьютерных томографов в ГБУ РД «ДРКБ им. Кураева», или 80 % от планового объема (5 контрактов);

- региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 2 контракта на сумму 51,8 млн рублей по оснащению ГБУ РД «ДЦМК» автоматизированными рабочими местами для медицинских работников, или 28,6 % от запланированного объема (7 контрактов);

**5.2.3.** В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году предусмотрены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, которые сопряжены со значительными рисками обеспечения своевременного выполнения строительных мероприятий и освоения выделенных средств. По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» запланировано строительство референс-центра в Республиканском онкологическом центре для размещения медицинского оборудования (линейных ускорителей), с объемом финансирования в сумме 80 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. Однако, по состоянию на текущую дату финансирование по региональному проекту отсутствует, проектно-сметная документация по строительству объекта не утверждена в установленном порядке, заключение государственной экспертизы отсутствует. Строительство объекта не начато, что может привести к риску своевременной сдачи объекта и выполнения утвержденных целевых показателей.

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году запланирована поставка двух линейных ускорителей для проведения лучевой терапии. Использование указанного оборудования позволит оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь порядка 1500 онкобольным в год. Мероприятия по закупке линейных ускорителей находятся на стадии подачи заявок до 17 августа 2020 года, что увеличивает риски своевременного заключения контрактов и поставки оборудования.

**5.2.4.** По результатам проведенного мониторинга следует отметить, что основными проблемами реализации нацпроекта «Здравоохранение» являются несвоевременное финансирование и низкий уровень кассового освоения. На 1 августа 2020 года по национальному проекту «Здравоохранение» сохраняются риски своевременного финансирования и эффективного освоения средств.

Результаты реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году показали, что поздние сроки заключения контрактов, некачественная подготовка аукционной документации и низкий уровень организации процесса закупок привели к значительному увеличению срока реализации мероприятий по строительству фельдшерско-акушерских пунктов и к нарушению сроков выполнения обязательств по контрактам.

В текущем году Счетная палата Республики Дагестан также отмечает о наличии рисков завершения строительства и ввода в эксплуатацию ФАП и референс-центра в установленные сроки. Контракты на строительство 20 ФАП заключены только в июле текущего года, чем обусловлено низкое финансирование и освоение средств. По состоянию 1 августа 2020 года строительство ФАП не начато.

Также не реализуются мероприятия регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами» по обеспечению единовременными компенсационными выплатами медицинских работников (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

**5.3. Национальный проект «Образование».** В 2020 году на реализацию национального проекта «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 696,57 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 6 551,9 млн рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 144,69 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 1 890,45 млн рублей, или 24,6 % от утвержденных назначений.

Кассовые расходы исполнены в сумме 378,1 млн рублей, что составляет 20,0 % от объема финансирования (1 890,45 млн рублей), или 5 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (7 696,57 млн рублей).

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Образование» предусмотрено на реализацию 6 региональных проектов:

- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности российского высшего образования)»;
- «Социальная активность».

**5.3.1.** В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование 4 региональных проектов:

1) Региональный проект «Современная школа» – 1 817,35 млн рублей, или 25,4 % от утвержденных назначений (7 156,9 млн рублей), в том числе: на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3 смены обучения – 1 614,71 млн рублей, создание новых мест в

общеобразовательных организациях – 120,7 млн рублей, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности – 78,1 млн рублей, а также создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и общеобразовательных программ – 3,87 млн рублей.

Средства, профинансированные на строительство объектов образования – 1 813,5 млн рублей, или 25,6 % от утвержденных назначений (7 079,2 млн рублей) направлены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Кассовое расходы по строительству объектов образования исполнены в сумме 243,7 млн рублей, что составляет 13,4 % от объема финансирования (1 813,5 млн рублей), или 3,4 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (7 079,2 млн рублей по строительству школ).

Кассовое исполнение по мероприятиям по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и общеобразовательных программ отсутствует.

**2)** Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности российского высшего образования)» – 20,2 млн рублей, или 38,8 % от утвержденных назначений (52,12 млн рублей) на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки. Средства направлены ГБПОУ РД «Технический колледж имени А.Р. Ашуралиева» на создание центра опережающей профессиональной подготовки и оснащение 5 мастерских по направлению «Информационные технологии».

Кассовое расходы исполнены в сумме 20,2 млн рублей, что составляет 100 % от объема финансирования, или 38,8 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (52,1 млн рублей).

**3)** Региональный проект «Социальная активность» – 2,5 млн рублей, или 89,7 % от утвержденных назначений (2,81 млн рублей) на поддержку и развитие волонтерства. Кассовое исполнение отсутствует;

**4)** Региональный проект «Успех каждого ребенка» – 50,4 млн рублей, или 37,2 % от утвержденных назначений (135,5 млн рублей) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 33,4 млн рублей, создание мобильного технопарка «Кванториум» при ГБУ ДО РД «МАН» – 16,9 млн рублей.

Кассовое расходы исполнены в сумме 50,4 млн рублей, что составляет 100 % от объема финансирования (50,4 млн рублей), или 37,2 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (135,5 млн рублей).

**5.3.2.** В рамках реализации нацпроекта «Образование» в 2020 году запланировано заключить 88 контрактов по шести региональным проектам. На 1 августа 2020 года заключено 70 контрактов на сумму 6 214,65 млн рублей, или 80 % от планового объема на 2020 год (88 контрактов), в том числе:

- региональный проект «Современная школа» – 20 контрактов на сумму 5 812,1 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ, или 76,9 % от запланированного объема (26 контрактов);

- региональный проект «Успех каждого ребенка» – 17 контрактов на сумму 73,63 млн рублей (на приобретение передвижного автомобиля (мобильного технопарка) – 3 контракта и прямые договоры на 16,93 млн рублей, 14 контрактов на приобретение спортивных площадок для 110 школ и на проведение капитального ремонта в 10 школах на 56,7 млн рублей), или 94,4 % от запланированного объема (18 контрактов);

- региональный проект «Молодые профессионалы» – 24 контракта на сумму 67,6 млн рублей на поставку оборудования для Центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, или 80 % от запланированного объема (30 контрактов);

- региональный проект «Социальная активность» – 6 контрактов на сумму 2,16 млн рублей на оснащение регионального ресурсного центра развития добровольчества (волонтерства) на базе ГКУ РД «Республиканский молодежный центр», или 75 % от запланированного объема (8 контрактов);

- региональный проект «Цифровая образовательная среда» – 3 контракта на сумму 259,2 млн рублей на оснащение Центра цифрового образования IT-куб в г. Каспийске – 16,2 млн рублей и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 102 общеобразовательных организациях, или 100 % от запланированного объема (3 контракта);

**5.3.3.** По региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 году предусмотрены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию строительных объектов, которые сопряжены со значительными рисками своевременного обеспечения выполнения строительных мероприятий и освоения выделенных средств.

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено строительство 22 общеобразовательных учреждений (школ) на 10 454 мест, в том числе с вводом в эксплуатацию в 2020 году – 17 школ на 6 400 мест, а также 5 школ на 4 054 мест с началом строительства в текущем году и завершением в 2021 году.

Проведенный анализ реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» на 1 августа 2020 года показал следующее.

На строительство школ предусмотрены средства в сумме 7 079,2 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 5 974,4 млн рублей и республиканского бюджета – 1 104,9 млн рублей).

На 1 августа 2020 года профинансировано 1 813,5 млн рублей, или 25,6 % от утвержденных назначений (7 079,24 млн рублей). Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан на авансирование работ по строительству объектов образования направлено 307,5 млн рублей, что составляет 17,0 % от объема финансирования (1 813,5 млн рублей), или 4,3 % от объема утвержденных назначений на строительство объектов образования (7 079,2 млн рублей).

Кассовые расходы исполнены в сумме 243,7 млн рублей, что составляет 13,4 % от объема финансирования (1 813,5 млн рублей), или 3,4 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (7 079,2 млн рублей по строительству школ).

Из 22 школ, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р генеральным подрядчиком строительства 16 школ является ФГУП «ГВСУ № 4» Министерства обороны Российской Федерации, которым заключены субподряды с 6 организациями. Кассовое освоение расходов по указанным школам на 1 августа 2020 года составляет 43 млн рублей.

Строительно-монтажные работы ведутся только на 9 объектах, из них уровень строительной готовности на 7-ми объектах составляет от 1,5 % до 20 процентов и на 2-х объектах – от 30 до 65 процентов. По 3 объектам объем принятых строительно-монтажных работ составил 47,8 млн рублей (блок-пристройка на 300 мест МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» – 24,1 млн рублей, школа на 120 мест в с.Гигатли Цумадинского района – 16,1 млн рублей, школа на 120 мест в с.Кванада Цумадинского района – 7,6 млн рублей).

Отставание от графика строительных работ наблюдается при строительстве 5 школ на 4 032 ученических мест (школа на 1 224 места в г. Махачкала, п. Семендер, школа на 502 места в г. Махачкала, п. Загородный, школа на 400 мест в с. Новокостек Хасавюртовского района, школа на 400 мест в с. Авадан Докузпаринского района (в фундаменте выявлены трещины), школа на 502 места в с. Эндирей Хасавюртовского района).

Не начато строительство 6 школ, в том числе:

- по 5 школам, запланированным к вводу в 2021 году отсутствует проектно-сметная документация, государственные контракты не заключены, в том числе в связи отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок для строительства школы в микрорайоне «Ипподром» г. Махачкалы (на 1 224 мест);

- по 2 школам из-за отсутствия заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство (блок-пристройка к СОШ № 27 на 604 мест в г. Махачкала), акта передачи строительной площадки по 1 школе (школа в с.Луткун Ахтынского района на 400 мест).

Следует отметить, что проводятся земляные и строительные работы при отсутствии заключения экспертизы проектной документации по 2 школам (школа в пос. Семендер г. Махачкалы на 1 224 мест (СОШ № 58), школа в сел. Эндирей Хасавюртовского района на 502 мест).

Сроки окончания строительства объектов, запланированных построить в 2020 году, определены в декабре 2020 года (блок-пристройка на 300 мест МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» в сентябре 2020 года). По 4 объектам, по которым отсутствует заключение экспертизы ПСД и разрешение на строительство (блок-пристройка к МБОУ «СОШ № 27» в г. Махачкале на 604 мест, СОШ № 58 в пос. Семендер г. Махачкалы на 1 224 мест, школа в сел. Эндирей Хасавюртовского района на 502 мест, школа в сел. Луткун



Ахтынского района на 400 мест), срок ввода в эксплуатацию определен на 1 декабря 2020 года.

**5.3.4.** В связи с низкими темпами работ и отставанием от графика строительно-монтажных работ, Счетная палата Республики Дагестан отмечает о наличии значительных рисков завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

На 1 августа 2020 года отсутствует финансирование 2 региональным проектам национального проекта «Образование», в том числе: региональный проект «Цифровая образовательная среда» с утвержденным объемом расходов в сумме 262,8 млн рублей, региональный проект «Учитель будущего» с утвержденным объемом расходов в сумме 86,4 млн рублей.

При наличии финансирования отсутствует кассовое исполнение по региональному проекту «Социальная активность».

**5.4. Национальный проект «Жилье и городская среда».** В 2020 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 092,7 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 2 028,43 млн рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 64,26 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 1 348,74 млн рублей, или 64,5 % от утвержденных назначений (2 092,7 млн рублей).

Кассовые расходы исполнены в сумме 571,3 млн рублей, что составляет 42,4 % от объема финансирования (1 348,74 млн рублей), или 27,3 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (2 092,7 млн рублей).

**5.4.1.** В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 3 региональных проектов:

1) Региональный проект «Жилье» – 483,2 млн рублей, или 44,0 % от утвержденных назначений (1 098,16 млн рублей). Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан бюджетные средства перечислены подрядной организации ООО «Стройинвест» на реализацию мероприятий по строительству 2 школ на 1 000 ученических мест в г. Каспийске (МБОУ «СОШ № 12» на 500 мест в МКР 10 и МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11).

Кассовое исполнение составило 242,1 млн рублей, или 50,1 % от объема финансирования (483,2 млн рублей), или 22,0 % от утвержденных назначений (1 098,16 млн рублей).

По МБОУ «СОШ № 12» на 500 мест в МКР 10 г. Каспийска заключен контракт на сумму 436,3 млн рублей, кассовое исполнение – 113,5 млн рублей. Строительная готовность объекта составляет 26 %.

По МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11 г. Каспийска заключен контракт на сумму 431,5 млн рублей, кассовое исполнение – 128,6 млн рублей. Строительная готовность объекта составляет 33 %.

Строительство ведется в соответствии с графиком производства работ.

2) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – 850,4 млн рублей, или 86,8 % от утвержденных назначений (979,4 млн рублей). Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по благоустройству 241 территорий, в том числе: дворовых территорий – 94, общественных территорий – 805,9 млн рублей, а также на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г. Дербент (Ворота Магалов) – 44,5 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2020 года работы завершены на 16 территориях (Хасавюртовский район – 4, г. Хасавюрт – 2, г. Южно-Сухокумск – 3, Тарумовский район – 4, Рутульский район – 2, Хунзахский район – 1).

Уровень технической готовности остальных объектов составляет от 5 % до 98 %. На объектах размещены 186 видеокамер и 213 информационных щитов-паспорта объекта.

Кассовое расходы на реализацию мероприятий по благоустройству 241 территорий исполнены в сумме 316,3 млн рублей, что составляет 37,2 % от объема финансирования (850,4 млн рублей), или 32,3 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (979,4 млн рублей).

Кассовое исполнение отсутствует в 11 муниципальных образованиях («Ахвахский район», «Гунибский район», «Кумторкалинский район», «Курахский район», «Левашинский район», «Новолакский район», «Ногайский район», «Тляртинский район», «Цунтинский район», «Чародинский район»).

Планируемая дата начала работ по реализации проекта по созданию комфортной городской среды в г. Дербент – 10 августа 2020 года.

3) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 15,14 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (15,14 млн рублей).

Согласно республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» бюджет проекта на 2020 год составляет 22,5 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 3,8 млн рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 18,6 млн рублей; средства местного бюджета – 0,1 млн рублей.

В то же время Законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год на реализацию регионального проекта предусмотрены только средства из федерального бюджета в виде имущественного взноса в государственную корпорацию – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда) в сумме 15,14 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2020 года бюджетные средства в сумме 15,14 млн рублей перечислены Администрации г. Махачкалы на реализацию республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» по этапу

реализации 2020-2021 годов. Кассовое исполнение составило 15,14 млн рублей, или 100 % от объема утвержденных назначений (15,14 млн рублей).

За первое полугодие 2020 года по этапу 2019-2020 годов 18 семьям (54 человека) перечислена выкупная стоимость жилых помещений по заключенным договорам в сумме 30,53 млн рублей. Мероприятия по этапу 2019-2020 годов реализованы на 95,8 % за счет расселения 766,7 кв. метров аварийного жилья. Риски невыполнения этапа 2019-2020 годов отсутствуют.

**5.4.2.** В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году запланировано заключить 199 контракта по 3 региональным проектам. По состоянию на 1 августа 2020 года заключено 170 контракта на сумму 1 813,0 млн рублей, или 85 % от планового объема на 2020 год (199 контрактов), в том числе:

- региональный проект «Жилье» – 2 контракта, или 14,3 % от запланированного объема (14 контрактов), на сумму 861,93 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ (МБОУ «СОШ № 12» – 436,0 млн рублей, МБОУ «СОШ № 13» – 425,93 млн рублей). Экономия за счет торгов составила 5,95 млн рублей;

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 15 контрактов (договоров), или 100 % от запланированного объема, на сумму 21,52 млн рублей в целях реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» (по этапу 2020-2021 годов планируется расселить 669,8 кв. м (19 жилых помещений, 53 человека);

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – 153 контрактов, или 90,0 % от запланированного объема (170 контрактов), на сумму 929,5 млн рублей на выполнение работ по благоустройству 241 территорий (94 дворовых и 147 общественных территорий в 10 городах и в 42 муниципальных районах).

**5.4.3.** По результатам проведенного мониторинга следует отметить, что основными проблемами реализации национального проекта «Жилье и городская среда» является низкий уровень кассового освоения по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (32,3 % от утвержденных годовых назначений – 979,4 млн рублей).

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» сроки выполнения работ по контрактам установлены до конца года. Кассовые расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года по мере фактического исполнения работ в соответствии с актами принятых работ по формам КС-2 и КС-3. В результате на 1 августа 2020 года кассовое исполнение отсутствует в 11 муниципальных образованиях.

Кроме этого, установлены поздние сроки начала работ по реализации проекта по созданию комфортной городской среды в г. Дербент – 10 августа 2020 года.

С учетом оставшегося срока до окончания 2020 года, имеются риски несвоевременного завершения строительства и ремонта объектов и эффективного освоения средств.

**5.5. Национальный проект «Экология».** В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 52,94 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 52,34 млн рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,61 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 50,2 млн рублей, или 94,8 % от утвержденных назначений (52,94 млн рублей).

Кассовые расходы исполнены в сумме 37,8 млн рублей, что составляет 75,3 % от объема финансирования (50,2 млн рублей), или 71,4 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (52,94 млн рублей).

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Экология» предусмотрено на реализацию 2 региональных проектов: «Чистая вода», «Сохранение лесов».

**5.5.1.** В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 2 региональных проектов:

**1)** Региональный проект «Сохранение лесов» – 39,4 млн рублей, или 93,4 % от утвержденных назначений (42,12 млн рублей).

Средства, выделенные по региональному проекту, Комитетом по лесному хозяйству Республики Дагестан перечислены:

- ГБУ РД «Республиканские леса» – 19,6 млн рублей, в том числе на лесовосстановление 514 га – 12,0 млн рублей, на заготовку семян – 2,5 млн рублей, на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования – 5,1 млн рублей.

В целях реализации мероприятий ГБУ «Республиканские леса» заготовлено 295 килограмм семян из 5,5 тонн, обработано 277 га. почвы, проведены лесовосстановительные работы на 132 га. Площадь лесоразведения составила 50 га.

Кассовые расходы исполнены в сумме 18,1 млн рублей, что составляет 92,3 % от объема финансирования (19,6 млн рублей), или 82,6 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (21,9 млн рублей).

- ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» – 19,7 млн рублей на закупку лесопожарной техники и лесопожарного оборудования.

На 1 августа 2020 года закуплена и оплачена техника на общую сумму 19,7 млн рублей (пожарные автоцистерны АЦ 1,6-40 (33088) ВЛ на базе ГАЗ 33088 (4 шт.), гусеничный трактор ДТ-75, автомобиль Нива Шевроле, воздуходувки (7 шт.), противопожарная установка высокого давления «Ермак»).

Кассовое исполнение составило 19,7 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений.

**2)** Региональный проект «Чистая вода» – 10,8 млн рублей. Бюджетные средства перечислены Министерству строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан на реализацию мероприятий по строительству объекта «Водопровод в сел. Гочоб Чародинского района». Кассовое исполнение отсутствует.

**5.5.2.** В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 году запланировано заключить 9 контрактов по двум региональным проектам. На 1 августа 2020 года заключено 8 контрактов на сумму 31,8 млн рублей, или 89 % от планового объема на 2020 год (9 контрактов), в том числе:

- региональный проект «Сохранение лесов» – 7 контрактов на сумму 21,0 млн рублей, или 87,5 % от планового объема на 2020 год (8 контрактов);

- региональный проект «Чистая вода» – 1 контракт на сумму 10,8 млн рублей, или 100 % от планового объема на 2020 год, на проведение работ по объекту «Водопровод в с. Гочоб Чародинского района».

**5.5.3** По результатам мониторинга на 1 августа 2020 года проблем и рисков по мероприятиям, обеспеченным финансированием, в ходе реализации национального проекта «Экология» не выявлено.

**5.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».** В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 833,4 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 680,0 млн рублей;

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 153,4 млн рублей;

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 732,78 млн рублей, или 39,97 % от утвержденных назначений (1 833,4 млн рублей).

Кассовые расходы исполнены в сумме 617,89 млн рублей, что составляет 84,32 % от объема финансирования (732,78 млн рублей), или 33,7 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (1 833,4 млн рублей).

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено на реализацию 2 региональных проектов: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

**5.6.1.** В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 2 региональных проектов:

**1)** Региональный проект «Дорожная сеть» – 683,8 млн рублей, или 42,6 % от утвержденных назначений (1 603,9 млн рублей) по ремонту, капремонту, реконструкции автодорог, научно-исследовательские работы, а также на мероприятия по организации дорожного движения на 153 объектах регионального значения и улично-дорожной сети, протяженностью 84,8 км.

Кассовые расходы по региональному проекту исполнены в сумме 568,9 млн рублей, что составляет 83,2 % от объема финансирования (683,8 млн рублей), или 35,5 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (1 603,9 млн рублей).

Бюджетные средства перечислены на выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе:

- реконструкция автомобильной дороги Манас - Зеленоморск - Аэропорт на участке км 0 - км 13,7 – 213,1 млн рублей, или 55,5 % от утвержденных назначений (383,7 млн рублей). Кассовое исполнение составило 157,9 млн рублей, или 74,1 % от объема финансирования (213,1 млн рублей), или 41,2 % от утвержденных назначений (383,7 млн рублей);

- ремонт автомобильной дороги объезд г. Махачкалы через пос. Талги на участке км 12 - км 21 + 700 – 61,2 млн рублей, или 91,5 % от утвержденных назначений (66,9 млн рублей). Кассовое исполнение составило 43,5 млн рублей, или 71,1 % от объема финансирования (61,2 млн рублей), или 65,0 % от утвержденных назначений (66,9 млн рублей);

- ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на участке км 0 - км 4 – 44,0 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений. Кассовое исполнение составило 42,7 млн рублей, или 97,0 % от объема финансирования (44,0 млн рублей);

- капитальный ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на участке км 4 - км 10 – 61,1 млн рублей, или 50,2 % от утвержденных назначений (121,6 млн рублей). Кассовые расходы исполнены в сумме 41,2 млн рублей, что составляет 67,4 % от объема финансирования (61,1 млн рублей), или 44,0 % от утвержденных назначений (121,6 млн рублей);

- ремонт автомобильной дороги Махачкала - Буйнакск – Леваши – В. Гуниб на участке км 0 - км 3 – 20,4 млн рублей, или 10,2 % от утвержденных назначений (199,3 млн рублей). Кассовые расходы исполнены в сумме 10,0 млн рублей, что составляет 49,0 % от объема финансирования (20,4 млн рублей), или 5,0 % от утвержденных назначений (199,3 млн рублей);

- научно-исследовательские работы по разработке документов транспортного планирования Республики Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 59,4 млн рублей, или 99,0 % от утвержденных назначений (60,0 млн рублей). Кассовые расходы исполнены в сумме 35,0 млн рублей, что составляет 58,9 % от объема финансирования (59,4 млн рублей), или 58,3 % от утвержденных назначений (60,0 млн рублей);

- ремонт покрытия проезжей части на 54 объектах и организацию дорожного движения на 41 объекте улично-дорожной сети г. Махачкалы – 353,0 млн рублей, или 51,9 % от утвержденных назначений (680,0 млн рублей). Кассовые расходы исполнены в сумме 281,7 млн рублей, что составляет 79,8 % от объема финансирования (353,0 млн рублей), или 41,4 % от утвержденных назначений (680,0 млн рублей);

2) Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – 49,0 млн рублей, или 21,35 % от утвержденных назначений (229,5 млн рублей). Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятий по

установке 15 шт. стационарных камер фотовидеофиксации на автомобильных дорогах (15 шт.).

Кассовые расходы исполнены в сумме 49,0 млн рублей, что составляет 100 % от объема финансирования, или 21,4% от объема утвержденных назначений на 2020 год (229,5 млн рублей). Работы по установке камер завершены, освоено 99 % от объема средств, предусмотренного на реализацию мероприятия (49,6 млн рублей).

**5.6.2.** В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано заключить 20 контрактов по 2 региональным проектам.

По состоянию на 1 августа 2020 года заключено 15 контрактов на сумму 1 651,3 млн рублей, или 75 % от планового объема контрактов на 2020 год (20 контрактов).

По региональному проекту «Дорожная сеть» заключены 11 контрактов, или 91,7 % от запланированного объема (12 контрактов) на сумму 1 549,6 млн рублей (бюджет – 1 555,5 млн рублей, экономия – 54,3 млн рублей (в том числе по объектам улично-дорожной сети г. Махачкалы – 6,0 млн рублей, по региональным и межмуниципальным дорогам – 48,3 млн рублей).

По объектам улично-дорожной сети г. Махачкалы по организации дорожного движения на 41 объекте – 1 контракт на сумму 62,5 млн рублей, по ремонту покрытия проезжей части на 54 объектах – 4 контракта на сумму 617,5 млн рублей.

По 5 объектам регионального и межмуниципального значения контракты заключены в 2019 году, в том числе:

- автодорога регионального значения «Мамраш - Ташкапур - Араканский мост» – контракт на ремонт и содержание участка км 0 - км 4 на сумму 44,0 млн рублей, контракт на капремонт участка км 4 - км 10 на сумму 121,6 млн рублей;
- автодорога «Объезд г.Махачкалы через пос. Талги» на участке км 12+000 - км 21+700 - контракт на ремонт на сумму 66,9 млн рублей;
- автодорога «Манас – Зеленоморск – Аэропорт», км 0 – км 13,7 (переходящий объект) – контракт на реконструкцию (в 2020 году предусмотрен ввод 7,9 км) на сумму 383,7 млн рублей;
- автодорога «Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб», км 0 – км 3 (переходящий объект) – контракт на реконструкцию (на 2020 год) на сумму 199,3 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта заключен контракт на научно-исследовательские работы по разработке документов транспортного планирования Республики Дагестан на сумму 60,0 млн рублей.

На сумму экономии 54,3 млн рублей запланировано заключение контракта на ремонт автомобильной дороги ФАД «Кавказ» - Шамхал-Красноармейское на участке км 0 – км.

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» заключены 4 контракта, или 50 % от запланированного объема

(8 контракта) на сумму 101,7 млн рублей по установке камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах.

**5.6.3.** По результатам проведенного мониторинга следует отметить о наличии рисков несоблюдения установленных сроков реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (31 декабря 2020 года). Планирование основного объема кассовых расходов на III-IV кварталы 2020 года, а также установление сроков выполнения работ по контрактам до конца года не позволяют создавать резерв для снижения возможных рисков реализации национального проекта.

Основной проблемой, препятствующей производству работ по ремонту дорог, остается несоблюдение план-графика производства работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающей организацией ОАО «Махачкалаводоканал».

Одновременно следует отметить неритмичное финансирование мероприятий нацпроекта. Так, при уровне кассового освоения на 1 августа 2020 года в размере 84,32 % (617,9 млн рублей) от объема финансирования (732,8 млн рублей), уровень финансирования национального проекта составляет 40,0 % от утвержденных назначений (1 833,4 млн рублей) и оценивается как низкий.

По региональному проекту «Общесистемные меры дорожного хозяйства» по мероприятию «Внедрение интеллектуальных транспортных систем» вместо предусмотренных ранее 120,0 млн рублей объем утвержденных бюджетных назначений уменьшен на 80,0 млн рублей и составил 40 млн рублей (средства федерального бюджета). По состоянию на 1 августа 2020 года дополнительное соглашение с Росавтодором не заключено.

**5.6.4.** Результаты выборочной проверки Счетной палаты Республика Дагестан исполнения регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году также свидетельствуют о возможных рисках неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть», финансируемого в составе национального проекта, запланировано произвести ремонт на 85 улицах Махачкалинской городской агломерации, из которых право собственности оформлено только на 8 улиц, технические паспорта имеются на 9 улиц, при этом на балансе города Махачкалы состоят всего 20 улиц.

В нарушение статьи 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения не по всем дорогам внесены в единый государственный реестр автомобильных дорог (ЕГРАД).

Администрацией городского округа г. Махачкала по автомобильным дорогам входящим городскую агломерацию не проведена инструментальная диагностика. Проведено только визуальное обследование состояния автодорог и улично-дорожной сети, что не соответствует Порядку проведения оценки от 27 августа 2009 года № 150. В случае проведения инструментальной диагностики, базовое значение транспортно-эксплуатационного состояния



дорожной сети может не подтвердиться.

Кроме этого, не обеспечена синхронизация работ на объектах, с мероприятиями по ремонту инженерной инфраструктуры (на улицах Магидова, Лизы Чайкиной и др.). В результате, на дорогах, отремонтированных в 2019 году, в текущем году осуществляется прокладка инженерных коммуникаций с одновременным вскрытием дорожного полотна.

Отдельные автомобильные дороги (улицы), требующие проведения ремонтных работ, в том числе с песчано-гравийным покрытием, не включены в перечень улиц, подлежащих ремонту в 2020 году. В тоже время, улицы, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям, включены в мероприятия регионального проекта. Например, ул. имени Тахо-Годи, ул. Циолковского, ул. Ш. Руставели и ул. Э. Капиева.

Также установлено, что вместо проведения запланированного ремонта дорог, финансирование расходов фактически осуществляется на проведение капитального ремонта и реконструкции, что приводит к неправомерному использованию бюджетных средств.

МКУ «Управление ЖКХ г. Махачкалы», в нарушение пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная максимальная цена контракта (НМЦК) по всем контрактам в рамках реализации регионального проекта определена согласно локальным сметным расчетам, при отсутствии разработанной проектно-сметной документации и обязательного проведения государственной экспертизы проектной документации, а также достоверности сметной стоимости.

В нарушение части 1 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации работы по капитальному ремонту автомобильных дорог осуществлялись в отсутствие проектной документации и, как следствие, в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы.

Согласно ведомости объемов работ (приложение № 1 к документации об электронном аукционе) на ул. Мраморная (дорога к школе №61) предусмотрены работы по устройству светофора Т7 с декоративными пластиковыми модулями (кубиками) на сумму 3961,0 тыс. рублей. Однако, в нарушение части 12.2 статьи 48 и частей 1, 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация на устройство указанного светофора МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» не разрабатывалась, государственная экспертиза не проводилась.

В ходе визуального осмотра ряда объектов ремонта автомобильных дорог Махачкалинской агломерации, работы по которым проводились в 2019 году, были выявлено наличие просадок дорожных плит, разрушения дорожного покрытия, колейность, повреждения бетонных бортовых камней, отсутствие бетонирования швов на стыках бортовых камней и др. Кроме того, на отдельных улицах отсутствуют тротуары, освещение, дорожная разметка, дорожные знаки, пешеходные переходы и т.д. Существует реальная опасность наезда на пешеходов и особенно в темное время суток.

**5.7. Национальный проект «Культура».** На реализацию национального проекта в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 199,16 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 132,49 млн рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 66,7 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 182,5 млн рублей, или 91,6 % от утвержденных назначений.

Кассовые расходы исполнены в сумме 112,4 млн рублей, что составляет 61,6 % от объема финансирования, или 56,4 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (199,16 млн рублей).

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Культура» предусмотрено на реализацию 3 региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

**5.7.1.** В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 3 региональных проектов:

**1)** Региональный проект «Культурная среда» – 171,78 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (171,78 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 110,6 млн рублей, или 64,4 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (171,78 млн рублей).

Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по:

- обеспечению детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами – 23,9 млн рублей или 100 % от утвержденных назначений. Кассовое исполнение – 20,4 млн рублей, или 85,4 % от утвержденных назначений (23,9 млн рублей) (ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А. Гасанова» – 4,7 млн рублей, ГБПОУ РД «Дербентское музыкальное училище» – 5,23 млн рублей, ГБУДО РД «Республиканская школа искусств им. Барият Мурадовой» – 1,82 млн рублей. ГБУДО РД «Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей» - 8,6 млн рублей);

- капитальному ремонту домов культуры – 7,9 млн рублей или 86,3% от утвержденных назначений (65,9 млн рублей). Кассовое исполнение – 21,25 млн рублей, или 13,9 % от объема финансирования, 12 % от утвержденных назначений (Дом культуры сел. Хучада Шамильского района – 2,64 млн рублей, Дом культуры сел. Унцукуль Унцукульского района – 5,27 млн рублей);

- строительству Дома танца ансамбля «Лезгинка» – 85,3 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений на 2020 год (85,3 млн рублей). Кассовое исполнение – 82,3 млн рублей, или 96,5% от утвержденных назначений (85,3 млн рублей).

**2)** Региональный проект «Творческие люди» – 8,7 млн рублей, или 34,4 % от утвержденных назначений (25,38 млн рублей).

Кассовые расходы исполнены в сумме 0,79 млн рублей, что составляет 9,1 % от объема финансирования (8,7 млн рублей), или 3,1 % от объема утвержденных назначений (25,38 млн рублей).

Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятия

«Реализация выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев», в том числе на организацию выставки «Дагестанская вышивка» в Богородицком дворце-музее города Богородицк и в Тульском областном музее города Тула.

**3)** Региональный проект «Цифровая культура» – 2 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений.

Бюджетные средства перечислены на мероприятия по созданию мультимедийного гида по экспозициям с использованием технологии виртуальной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» в Дербентском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

Кассовое исполнение составило 1,0 млн рублей, или 50 % от утвержденных назначений (2,0 млн рублей).

**5.7.2.** В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году запланировано заключить 50 контрактов по трем региональным проектам. По состоянию на 1 августа 2020 года заключено 37 контракта на сумму 172,1 млн рублей, или 74 % от планового объема на 2020 год (50 контрактов), в том числе:

- региональный проект «Культурная среда» – 20 контрактов на сумму 162,29 млн рублей, или 100 % от запланированного объема (на капитальный ремонт 6 объектов культуры – 6 контрактов на сумму 53,13 млн рублей, на переоснащение образовательных учреждений в сфере культуры – 4 контрактов на сумму 23,89 млн рублей, по строительству Дома танца ансамбля «Лезгинка» – 2 контракта на сумму 474,9 млн рублей на период строительства 2020-2022 гг. (бюджет 2020 года – 85,3 млн рублей)). По результатам торгов образовалась экономия (12,78 млн рублей), на сумму которой будут заключены дополнительные соглашения;

- региональный проект «Творческие люди» – 13 контрактов на сумму 8,45 млн рублей, или 50,0 % от запланированного объема (26 контрактов), (на реализацию культурно-познавательных программ для школьников – 1 контракт на сумму 0,25 млн рублей, организацию и проведение фестиваля любительских творческих коллективов – 1 контракт на сумму 0,35 млн рублей, поддержку добровольческих движений – 1 контракт на сумму 0,23 млн рублей, организацию и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи – 1 контракт на сумму 0,35 млн рублей, реализацию выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев – 7 контрактов на сумму 0,73 млн рублей, реализацию творческих проектов по укреплению гражданской идентичности – 2 контракта на сумму 6,55 млн рублей);

- региональный проект «Цифровая культура» – 4 контракта на сумму 2,0 млн рублей, или 100 % от запланированного объема, на создание мультимедийного гида по экспозициям в Дербентском государственном

**5.7.3.** В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта, в 2020 году запланированы строительство и реконструкция 6 объектов культуры.

По состоянию на 1 августа 2020 года уровень строительной готовности по

2 объектам составляет до 7 % (Дом культуры в сел. Какашура и Дома культуры в сел. Доргели Карабудахкентского района), 3 объектам до 40 процентов (Дом культуры в сел. Хучада Шамильского района, Дом культуры в сел. Верхний Арши Левашинского района, Дома культуры в сел. Унчукатль Лакского района), по одному объекту – 60 процентов (Дом культуры сел. Унцукуль Унцукульского района).

В рамках реализации мероприятий по реновации региональных и муниципальных учреждений культуры в ходе регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка», в г. Махачкала Республики Дагестан (период строительства 2020-2022 гг.). Общий объем средств, выделенных на реализацию проекта, составляет 778,5 млн рублей (средства федерального проекта – 500,0 млн рублей, средства республиканского проекта – 278,5 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2020 года уровень строительной готовности по строительству объекта составляет 2 %. В то же время по итогам заседания Правительства Республики Дагестан от 22 июля 2020 года № 7 было дано поручение проработать возможность досрочного (в 2021 году) окончания строительства Дома танца ансамбля «Лезгинка», что значительно увеличивает риски своевременной сдачи объекта.

**5.7.4.** По результатам проведенного мониторинга следует отметить, что ключевыми рисками реализации нацпроекта «Культура» являются соблюдение установленных сроков реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов культуры.

Одновременно следует отметить, о наличии рисков по региональному проекту «Творческие люди» в связи с проведением мероприятий в целях недопущения распространения на территории Республики Дагестан коронавирусной инфекции (в связи с запретом на проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с очным присутствием граждан).

**5.8. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».** В 2020 году на реализацию нацпроекта предусмотрены ассигнования в сумме 647,38 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 625,2 млн рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 22,2 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 141,3 млн рублей, или 21,83 % от утвержденных назначений.

Кассовые расходы исполнены в сумме 141,3 млн рублей, что составляет 100,0 % от объема финансирования (141,3 млн рублей), или 21,8 % от объема утвержденных назначений (647,38 млн рублей).

В 2020 году финансирование по нацпроекту предусмотрено на реализацию 4 региональных проектов:

- «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- «Популяризация предпринимательства»;
- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

**5.8.1.** По состоянию на 1 августа 2020 году бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий 3 региональных проектов:

**1)** Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» – 16,88 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (16,88 млн рублей). Бюджетные средства направлены на увеличение объема выдаваемых микрозаймов и на создание и развитие региональных гарантийных организаций. Кассовое исполнение составило 16,88 млн рублей, или 100 % от финансирования. По состоянию на 1 августа 2020 года:

- количество выданных микрозаймов МФО субъектам МСП составило 534 единиц (план – 532 единицы);

- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации составил 18,932 млн рублей.

**2)** Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 101,21 млн рублей, или 20,5 % от утвержденных назначений (493,7 млн рублей).

Кассовые расходы исполнены в сумме 101,2 млн рублей, что составляет 100 % от объема финансирования (101,2 млн рублей), или 20,5 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (493,73 млн рублей).

В рамках заключенного соглашения от 23 апреля 2020 года с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» профинансировано на реализацию мероприятий:

- «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» – 65,38 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений на 2020 год. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» – 5,2%;

- «Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке» (Центр координации и поддержки экспортно-ориентированных предприятий МСП (ЦКПЭД) – 27,3 млн рублей. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт (нарастающим итогом) по состоянию на 1 августа 2020 года составило 19 единиц (план – 20 единиц);

- «Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах» – 8,5 млн рублей. По состоянию на 1 августа 2020 года микрозаймы субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность в моногородах не предоставлены (план – 5

единиц). Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, несмотря на поступление денежных средств по состоянию на 1 июля 2020 года, денежные средства в размере 8,5 млн рублей перечислены в «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан только 29 июля 2020 года.

Также не реализованы мероприятия по инвестированию в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков.

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта» (нарастающим итогом) по состоянию на 1 августа 2020 года составило 1,8 тыс. единиц (план – 0,99 тыс. единиц);

3) Региональный проект «Популяризация предпринимательства» – 23,21 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (23,21 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 23,21 млн рублей, или 100 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (23,21 млн рублей).

В рамках заключенного соглашения от 23 апреля 2020 года № 06-Г-2020 Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» на реализацию программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса. По состоянию на 1 августа 2020 года:

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта составляет 174 субъектов (план – 425 ед.);

- количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составляет 693 человек (план – 2 302 чел.);

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составляет 2 676 человек (план – 3 530 чел.);

- количество физических лиц – участников регионального проекта составляет 12 416 человек (план – 19 438 чел.).

Следует отметить, что значение показателей «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального проекта» и «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности» за июль месяц 2020 года не изменилось. Остальные показатели имеют динамику роста.

По региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» финансирование отсутствует. Всего на реализацию регионального проекта предусмотрено 113,56 млн рублей (средства федерального бюджета – 112,4 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,14 млн рублей), которые предоставляются после

прохождения конкурсных процедур по предоставлению грантов «Агростартап», а также предоставления сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (СПоК) документов на возмещение части понесенных затрат. С учетом сезонного характера работ финансирование запланировано в III-IV кварталах 2020 года.

**5.8.2.** В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запланировано заключение 143 контрактов по двум региональным проектам. По состоянию на 1 августа 2020 года заключено 75 контрактов на сумму 43,3 млн рублей, или 52,4 % от планового объема контрактов на 2020 год (143 контрактов), в том числе:

- региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 66 контрактов на сумму 40,6 млн рублей, или 55 % от планового объема на 2020 год (120 контрактов);

- региональный проект «Популяризация предпринимательства» – 9 контрактов на сумму 2,78 млн рублей, или 39,1 % от планового объема на 2020 год (23 контракта);

С учетом низких темпов контрактации по региональному проекту, возрастают риски их несвоевременного заключения и, соответственно, несвоевременного исполнения обязательств. В то же время, обеспечено финансирование в полном объеме, а также полное освоение, или 100 % от утвержденных назначений на 2020 год по двум региональным проектам.

Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан следует усилить контроль за подведомственными организациями, так как перечисление бюджетных средств на счета подведомственных организаций не обеспечивает полное освоение профинансированных средств, а также достижение целевых показателей.

**5.8.3.** В рамках мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено завершение строительства промышленного (индустриального) парка «Аврора» с объемом финансирования в сумме 392,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 372,9 млн рублей.

Общая уточненная стоимость объекта по состоянию на 1 августа 2020 года составляет 710,8 млн рублей.

В период с 2016 года по 2018 год по объекту освоено 310,4 млн рублей. В 2019 году выделенные средства не были освоены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации в виду несоответствия проектных решений участку проведения строительства индустриального парка (проектная документация индустриального парка, изначально разработанная под участок строительства в сел. Гурбуки, не была в полной мере адаптирована под новый участок строительства в местности «Уйташ»).

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 2 июня 2020 года № 119-р Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год, за счет средств Республиканской инвестиционной программы (за счет средств резерва на обеспечение участия в мероприятиях федеральных программ) выделены 19,45 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации по объекту «Создание и развитие технопарка, промышленного (индустриального парка) «Аврора» в Карабудахкентском районе (местность «Уйташ») Республики Дагестан с отнесением их к расходам государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Стоимость работ по разработке указанной проектной документации, по результатам аукциона, прошедшего 18 июня 2020 года, определена в сумме 5,7 млн рублей (победитель аукциона ООО «Проекстархстрой»). Объявление торгов и заключение контрактов на проведение строительно-монтажных работ планируется после внесения изменений в проектно-сметную документацию.

По итогам заседания Правительства Республики Дагестан от 22 июля 2020 года № 7 было дано поручение о необходимости заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству промышленного (индустриального парка) «Аврора» до 1 октября 2020 года.

С учетом сроков разработки и утверждения проектной документации, а также проведения конкурса по отбору порядной организации для осуществления строительно-монтажных работ и необходимости соблюдения процедур по организации строительства, существуют значительные риски завершения запланированных мероприятий в 2020 году.

**5.8.4.** Проведенный анализ показал, что ключевой проблемой реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является своевременное завершение мероприятий по созданию промышленного (индустриального парка) «Аврора». Средства на строительство запланировано освоить по мере заключения контрактов в течение IV квартала 2020 года, что увеличивает риски своевременного строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Также в ходе реализации национального проекта имеются риски недостижения плановых целевых показателей, в связи с введенными ограничениями на осуществление деятельности субъектов МСП и проведение массовых мероприятий (региональный проект «Популяризация предпринимательства»).

**5.9. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».** В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 42,4 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 42,0 млн рублей;



- республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,4 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 13,0 млн рублей, или 30,7 % от утвержденных назначений.

По состоянию на 1 августа 2020 года кассовые расходы исполнены в сумме 13,0 млн рублей, что составляет 100 % от объема финансирования, или 30,7 % от объема утвержденных назначений (42,0 млн рублей).

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено только на реализацию регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», в рамках которого средства направлены на финансирование мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Средства господдержки предоставляются сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий после завершения ими мелиоративных работ и последующего представления соответствующих документов в Минсельхозпрод РД. Завершение работ сельхозпроизводителями запланировано на октябрь 2020 года.

На 1 августа 2020 года экспорт продукции АПК республики (по данным ФТС) составил 15,722 млн долл. США (65,0 % целевого индикатора на 2020 год). Объем завершенных мелиоративных работ (реконструкция рисовых чеков) ООО «Кизлярагрокомплекс» составил 84,2 % от планового объема на 2020 год на площади 590 га.

**5.9.3** По результатам мониторинга на 1 августа 2020 года проблем и рисков по мероприятиям, обеспеченным финансированием в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не выявлено.

**5.10. Национальный проект «Цифровая экономика».** В 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 4,64 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 4,59 млн рублей;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,05 млн рублей.

На 1 августа 2020 года расходы профинансированы в сумме 4,63 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений.

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Цифровая экономика» предусмотрено на реализацию 1 регионального проекта («Цифровое государственное управление»). Средства профинансированы на реализацию мероприятий по обновлению 27 региональных сервисов межведомственного электронного взаимодействия в Республике Дагестан. На 1 августа 2020 года Кассовое исполнение отсутствует.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» предусмотрено заключение в III квартале 2020 года одного контракта. Контракт не заключен.

Для того, чтобы освоить федеральную субсидию на разработку новых видов сведений Системы межведомственного электронного взаимодействия

СМЭВ необходимо внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1557 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Информационное общество», так как установлено, что федеральные средства можно расходовать на сервисы общим объемом вызовов более 100. В связи с тем, что указанный сервис в республике представлен только в единственном экземпляре, необходимо внесение изменений в указанное постановление Правительства Российской Федерации.

По региональному проекту «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году предусмотрены мероприятия по подключению 268 объектов к сети «Интернет». По состоянию на 1 августа 2020 года фактически подключено 173, или 65 % от планового объема, в том числе:

- фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения – 49 (факт – 17);
- государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования - 63 (факт – 31);
- органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов – 54 (факт – 24).


Следует отметить, что уровень реализации мероприятий недостаточен, так как перечисленные объекты относятся к категории социально значимых объектов. С учетом мероприятий, реализуемых в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, подключение к скоростному интернету позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи, а также уровень образования в отдаленных населенных пунктах республики.

По результатам мониторинга на 1 августа 2020 года проблем и рисков по мероприятиям, обеспеченным финансированием, в ходе реализации национального проекта не выявлено. Однако, планирование кассовых расходов на III-IV кварталы, а также позднее заключение контрактов увеличивают риски своевременной реализации мероприятий и достижения целевых показателей.

**6.** В рамках реализации национальных проектов в 2020 году запланировано заключение 668 контрактов. По состоянию на 1 августа 2020 года заключено 487 контрактов на сумму 18 453,0 млн рублей, или 73,0 % от планового показателя. При доведенных лимитах бюджетных обязательств, проведение значительного объема закупок запланировано на II полугодие 2020 года.

Следует отметить, что в большей части заключенных контрактов, особенно в целях строительства или капитального ремонта объектов сроки исполнения контрактов определены до 31 декабря 2020 года, что не позволяет обеспечить резерв времени, для проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию построенных объектов.

### Количество контрактов, заключённых в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2020 году

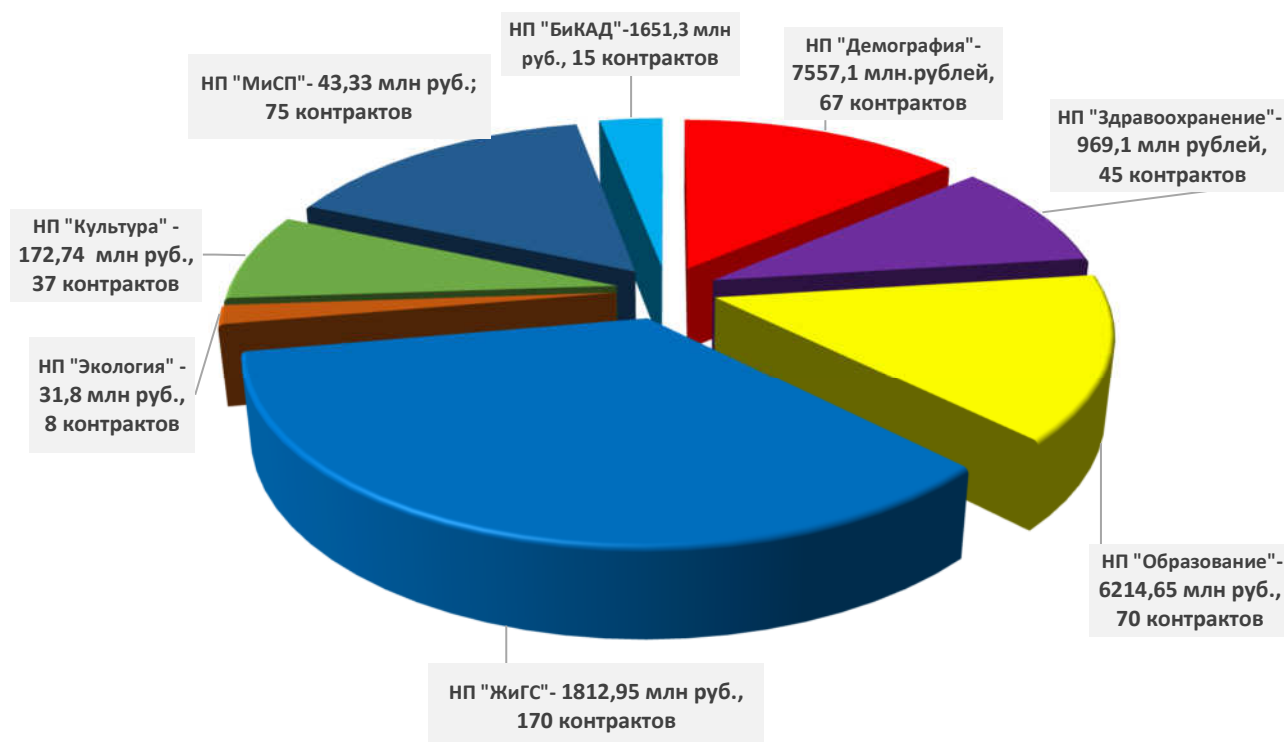

Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за реализацию национальных (региональных) проектов, не исполнено поручение Председателя Правительства Республики Дагестан А.А. Здунова в части принятия мер по заключению всех контрактов на выполнение мероприятий региональных проектов до 15 марта 2020 года. В этой связи по итогам заседания Правительства Республики Дагестан от 22 июля 2020 года № 7 окончательные сроки заключения всех контрактов по поставке оборудования установлены до 31 августа 2020 года.

**7.** Проведенный анализ показал, что по истечении семи месяцев 2020 года, по-прежнему наблюдается крайне неравномерное финансирование мероприятий национальных (региональных) проектов и низкие темпы освоения бюджетных средств.

Существенные риски несвоевременного освоения бюджетных средств и выполнения плановых целевых показателей сохраняются по следующим национальным проектам: «Демография» (31,0 % от утвержденных назначений), «Образование» (4,8 % от утвержденных назначений), «Здравоохранение» (3,4 % от утвержденных назначений), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (21,8 % от утвержденных назначений), по которым предусмотрены мероприятия по строительству объектов.

**8.** По результатам проведенного мониторинга реализации национальных проектов Правительству Республики Дагестан предлагается:

- в соответствии с поручением Президента Российской Федерации о продлении сроков реализации национальных проектов до 2030 года, провести анализ исполнения региональных проектов с подготовкой предложений по корректировке мероприятий и целевых показателей;

- принять меры, направленные на повышение качества планирования мероприятий региональных проектов, и обеспечить взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями;

- во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти обеспечить ритмичное финансирование мероприятий национальных проектов, а также своевременное и эффективное освоение выделяемых средств;

- в связи с необеспечением своевременного ввода в эксплуатацию объектов дошкольного и общего образования в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» подготовить обращение в федеральные органы исполнительной власти по внесению изменений в соглашения по выделению субсидий в части необходимости увеличению сроков их строительства;

- усилить контроль за освоением бюджетных средств, выполнением мероприятий и достижением показателей региональных проектов;

- завершить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации национальных (региональных) проектов;

- принять меры по обеспечению своевременного исполнения обязательств поставщиками товаров (работ, услуг) в рамках реализации мероприятий национальных (региональных) проектов;

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов и участвующих в процессе реализации национальных проектов в целях оперативного контроля за своевременным выполнением целевых показателей;

- закрепить персональную ответственность должностных лиц органов исполнительной власти Республики Дагестан, в том числе глав муниципальных образований, за достижение целевых показателей национальных (региональных) проектов).

- принять меры по информированию населения о реализации национальных (региональных) проектов в средствах массовой информации, используя возможности социальных сетей и телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит обеспечить своевременное и эффективное освоение выделяемых средств, а также достижение запланированных индикативных показателей в установленные сроки.

Приложение: на 5 листах.

**Счетная палата  
Республики Дагестан**
