



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(за 2022 год)**

**МАХАЧКАЛА
2023**

Содержание

1.	Общие положения.....	4
2.	Национальный проект «Демография»	9
2.1	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	12
2.2	Региональный проект «Содействие занятости»	13
2.3	Региональный проект «Старшее поколение»	22
2.4	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья».....	23
2.5	Региональный проект «Спорт – норма жизни»	24
3.	Национальный проект «Здравоохранение»	26
3.1	Региональный проект «Первично медико-санитарная помощь»	29
3.2	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	31
3.3	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	33
3.4	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	35
3.5	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	37
3.6	Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения»	39
3.7	Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»	46
3.8	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	47
4.	Национальный проект «Образование»	52
4.1	Региональный проект «Современная школа»	55
4.2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	69
4.3	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	71
4.4	Региональный проект «Молодые профессионалы».....	72
4.5	Региональный проект «Социальная активность»	74
4.6	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан России»	75
4.7	Региональный проект «Молодежь России»	76
5.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	77
5.1	Региональный проект «Жилье»	80
5.2	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан».....	81
5.3	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	84
5.4	Региональный проект «Чистая вода»	86
6.	Национальный проект «Экология»	91
6.1	Региональный проект «Чистая страна»	93
6.2	Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО»	94
6.3	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».....	96
6.4	Региональный проект «Сохранение лесов»	97

7.	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	98
7.1	Региональный проект «Дорожная сеть»	101
7.2	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	106
7.3	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	108
8.	Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	110
8.1	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»	113
8.2	Региональный проект «Информационная инфраструктура»	114
8.3	Региональный проект «Информационная безопасность»	116
8.4	Региональный проект «Цифровые технологии»	118
8.5	Региональный проект «Цифровое государственное управление»	119
9.	Национальный проект «Культура»	120
9.1	Региональный проект «Культурная среда»	123
9.2	Региональный проект «Творческие люди»	125
9.3	Региональный проект «Цифровая культура»	127
10.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»....	128
10.1	Региональный проект «Поддержка самозанятых»	130
10.2	Региональный проект «Предакселерация»	132
10.3	Региональный проект «Акселерации субъектов МСП».....	134
11.	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт.....	138
11.1	Региональный проект «Промышленный экспорт».....	140
11.2	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	142
11.3.	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».....	143
12.	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»	144
12.1	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	146
12.2	Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»	149
13.	Национальный проект «Наука»	151
14.	Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».....	152
15.	Выводы	157
16.	Предложения.....	169
	Приложения.....	170

1. Общие положения

1. Счетной палатой Республики Дагестан (далее – Счетная палата) в целях выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации перед контрольно-счетными органами, и в соответствии с поручением Главы Республики Дагестан проводится мониторинг реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан.

В соответствии с постановлением Коллегии Счетной палаты от 10 апреля 2019 года № 17 проведение мониторинга национальных (региональных) проектов закреплено за аудиторами Счетной палаты и установлена персональная ответственность за качество, полноту и своевременность представления информации о достижении целевых индикаторов и национальных целей.

2. Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов осуществляется по двум направлениям: текущий контроль и проведение контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных (региональных) проектов.

3. Счетной палатой в адрес Главы Республики Дагестан, Народного Собрания Республики Дагестан, Правительства Республики Дагестан, Счетной палаты Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан, Прокуратуры Республики Дагестан, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу, Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, Отделение - Национальный банк по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Совета Безопасности Республики Дагестан, Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан ежемесячно (ежеквартально) направлялась информация о результатах мониторинга реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан.

Материалы о ходе мониторинга национальных (региональных) проектов размещаются на официальном сайте Счетной палаты.

4. Республика Дагестан участвует в реализации 13 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт».

В рамках указанных национальных проектов реализуются 48 региональных проектов в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

В реализации национальных проектов задействовано 17 министерств и ведомств Республики Дагестан.

5. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов были предусмотрены средства в сумме 36 203,8 млн рублей¹, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 30 349,9 млн рублей, или 83,8 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 510,6 млн рублей, или 9,7 %;
- внебюджетных источников – 2 343,3 млн рублей, или 6,5 % (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 611,8 млн рублей, Федерального фонда социального страхования – 84,0 млн рублей, муниципальных образований – 226,1 млн рублей, медицинских организаций – 233,8 млн рублей, средства «Даглес» – 5,6 млн рублей, средства юридических лиц – 182,5 млн рублей).

Финансирование национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Наука и университеты» в 2022 году не предусматривалось.

В общем объеме бюджетных ассигнований (36 203,8 млн рублей) наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных проектов: «Образование» – 12 284,4 млн рублей, или 33,9 %, «Демография» – 8 118,8 млн рублей, или 22,4 %, «Здравоохранение» – 4 884,3 млн рублей, или 13,5 %, «Экология» – 4 315,4 млн рублей, или 11,9 %, «Жилье и городская среда» – 2 732,0 млн рублей, или 7,5 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 322,0 млн рублей, или 6,5 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.


В 2022 году на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 35 888,9 млн рублей, или 99,1 % от объема годовых назначений (36 203,8 млн рублей) (приложение № 1).

Данные средства направлены на финансирование 34 региональных проектов, по которым было предусмотрено финансирование в 2022 году.

Из общей суммы бюджетных ассигнований, профинансированных на реализацию национальных проектов (35 888,9 млн рублей), освоено 33 014,1 млн рублей, или 92,0 % от объема финансирования.

¹ В ходе мониторинга использована информация, предоставленная Министерством финансов Республики Дагестан, а также министерствами и ведомствами (ответственными исполнителями).

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2022 году

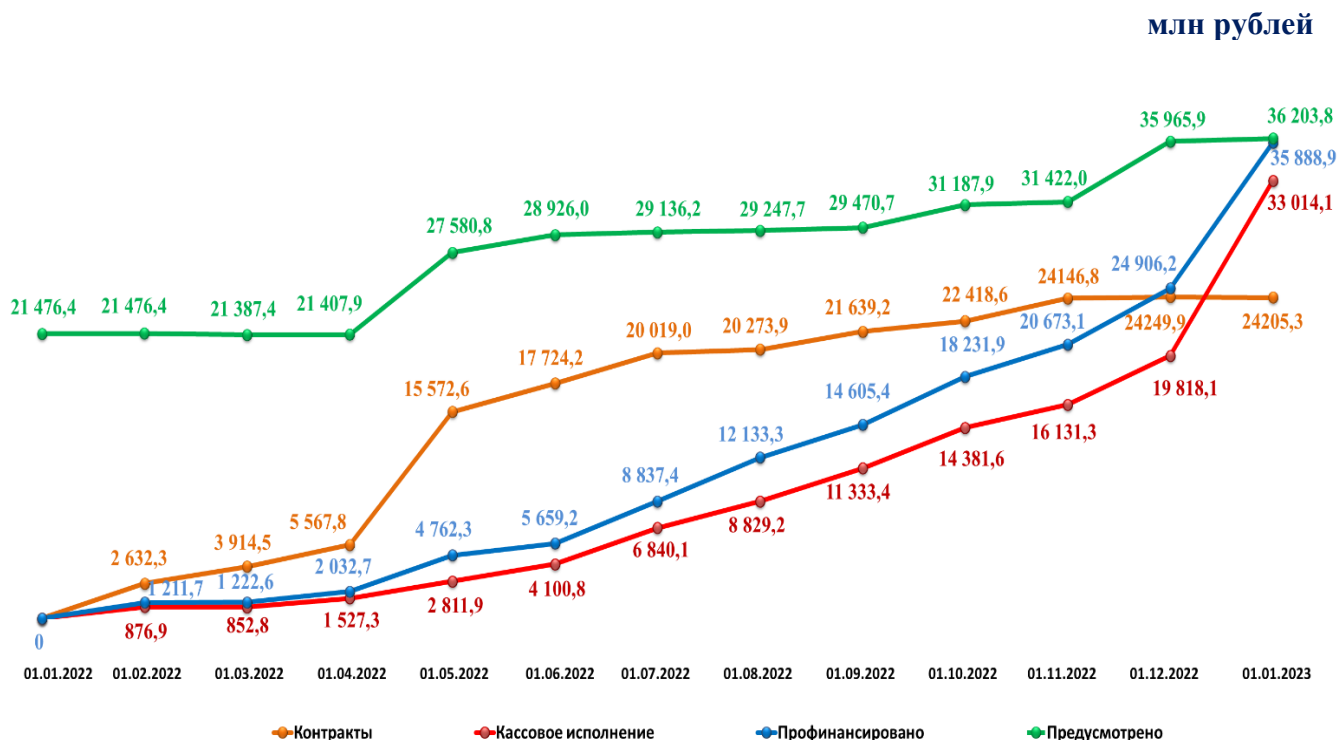


По 7 национальным проектам («Экология» – 4 315,4 млн рублей, «Жилье и городская среда» – 2 732,0 млн рублей, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 322,0 млн рублей, «Туризм и индустрия гостеприимства» – 334,1 млн рублей, «Цифровая экономика» – 201,3 млн рублей, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 176,4 млн рублей), «Производительность труда» – 6,5 млн рублей) освоение составляет 100 % от годовых назначений.

По национальному проекту «Культура» освоение составляет 98,5 % (855,3 млн рублей), национальному проекту «Демография» – 92,5 % (7 508,8 млн рублей);

Низкий уровень освоения сложился по национальным проектам «Здравоохранение» - 87,0 % (4 207,6 млн рублей) и «Образование» – 84,3 % (10 354,7 млн рублей), которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

Кассовое исполнение реализации мероприятий национальных проектов в 2022 году

млн рублей

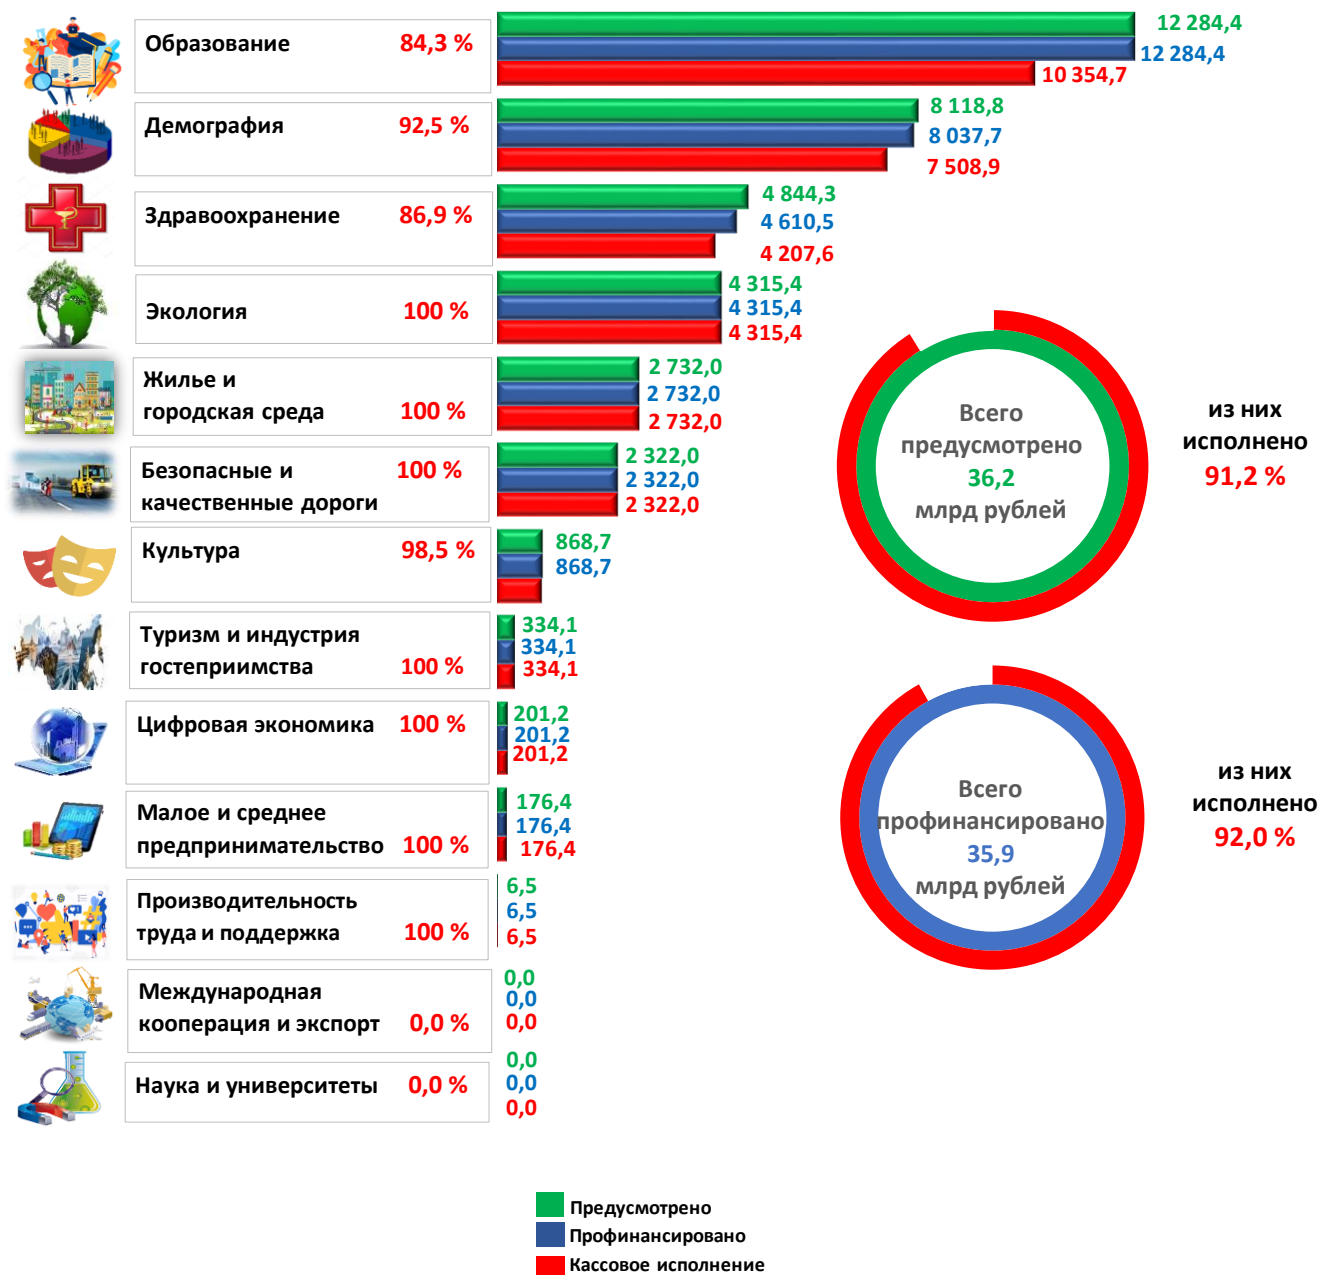

Не все министерства, ответственные за реализацию национальных проектов, смогли принять исчерпывающие меры по своевременному и эффективному освоению профинансированных бюджетных ассигнований. В результате, в 2022 году в ходе реализации национальных проектов в Республике Дагестан остались неосвоенными 3 189,7 млн рублей или 8,8 % от годовых назначений 36 203,8 млн рублей), выделенные на реализацию 4 национальных проектов:

– «Демография» - 609,9 млн рублей, или 7,5 % от объема годовых назначений (8 118,8 млн рублей), и 7,6 % от объема финансирования (8 037,7 млн рублей);

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– «Образование» – 1 929,6 млн рублей, или 15,7 % от объемов финансирования и годовых назначений (12 284,4 млн рублей);


– «Здравоохранение» – 636,7 млн рублей, или 8,7 % от объема финансирования (4 610,5 млн рублей) и 13,1 % от годовых назначений;

– «Культура» - 13,4 млн рублей, или 1,5 % от объема финансирования (868,7 млн рублей).

В целях реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году заключены 1 240 контрактов (договоров) на общую сумму 24 205,3 млн рублей, или 99,9 % от планового объема (1 241 контракт (договор)).

Не заключен 1 контракт по национальному проекту «Жилье и городская среда» (региональный проект «Чистая вода»), по строительству объекта водоснабжения в городе Южно-Сухокумск, (ранее заключенный контракт расторгнут в связи с неисполнением обязательств подрядчиком).

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году

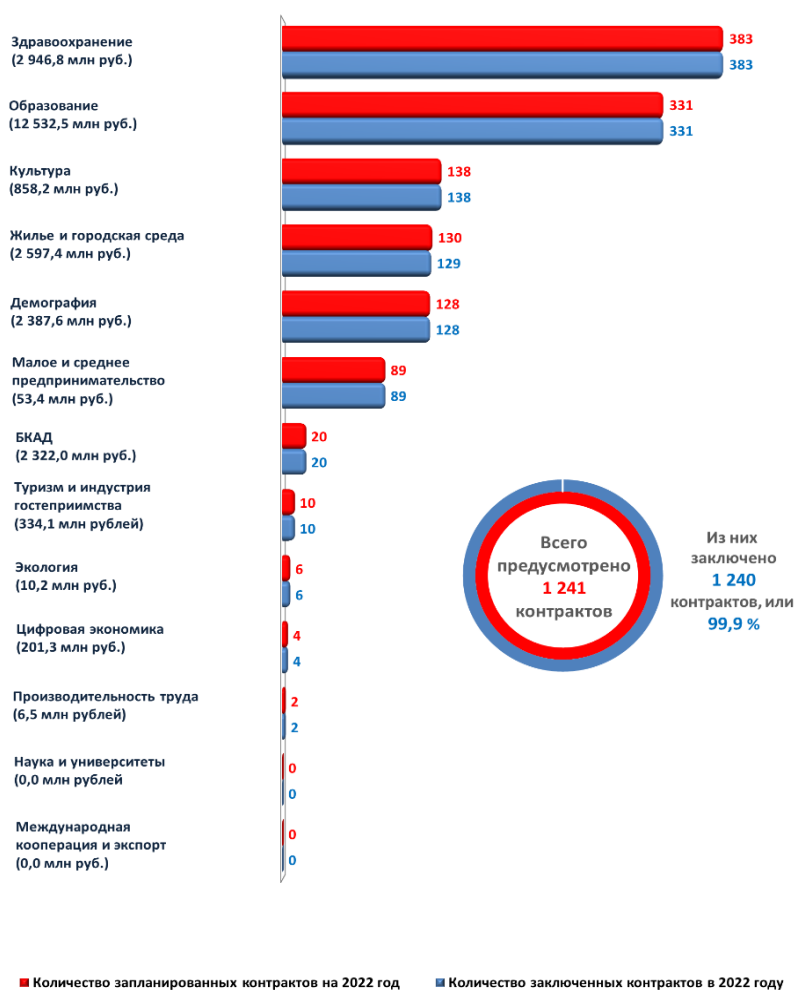

Информация о финансировании и исполнении целевых показателей национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан за 2022 год приведена в приложениях 1 и 2.



2. Национальный проект «Демография»

Кураторы национального проекта:



Махмудов А.М.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан



Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Казиев М.Н.
Министр труда и
социального развития
Республики Дагестан



Беляева Т. В.
Министр
здравоохранения
Республики Дагестан



Сажидов С. Х.
Министр по физической
культуре и спорту
Республики Дагестан



Сулейманов А.А.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики Дагестан



Бучаев Я. Г.
Министр образования и
науки Республики
Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Демография» в Российской Федерации являются:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- финансовая поддержка семей при рождении детей;
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей;
- повышение качества жизни граждан старшего поколения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- 2) «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»);
- 3) «Содействие занятости»;
- 4) «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»);
- 5) «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт-норма жизни»).

В реализации указанных региональных проектов в 2022 году были задействованы:

- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан – 5 440,45 млн рублей;
- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 1 973,8 млн рублей;
- Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 153,0 млн рублей (средства ТФОМС РД);
- Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан – 551,6 млн рублей.
- Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Из 5 региональных проектов в 2022 году по национальному проекту «Демография» финансирование осуществлялось по 4 региональным проектам.


МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2022 году на реализацию национального проекта были предусмотрены средства в сумме 8 118,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 7 449,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 516,1 млн рублей, внебюджетные средства (ТФОМС РД) – 153,0 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 8 037,7 млн рублей, или 99,0 % от годовых назначений (8 118,8 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоены средства в сумме 7 508,8 млн рублей, или 93,4 % от объема финансирования и 92,5 % от годовых назначений (8 118,8 млн рублей). Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 609,9 млн рублей, или 7,6 % от объема финансирования (8 037,7 млн рублей) и 7,5 % от объема годовых назначений (8 118,8 млн рублей).

Финансирование национального проекта «Демография» в 2022 году

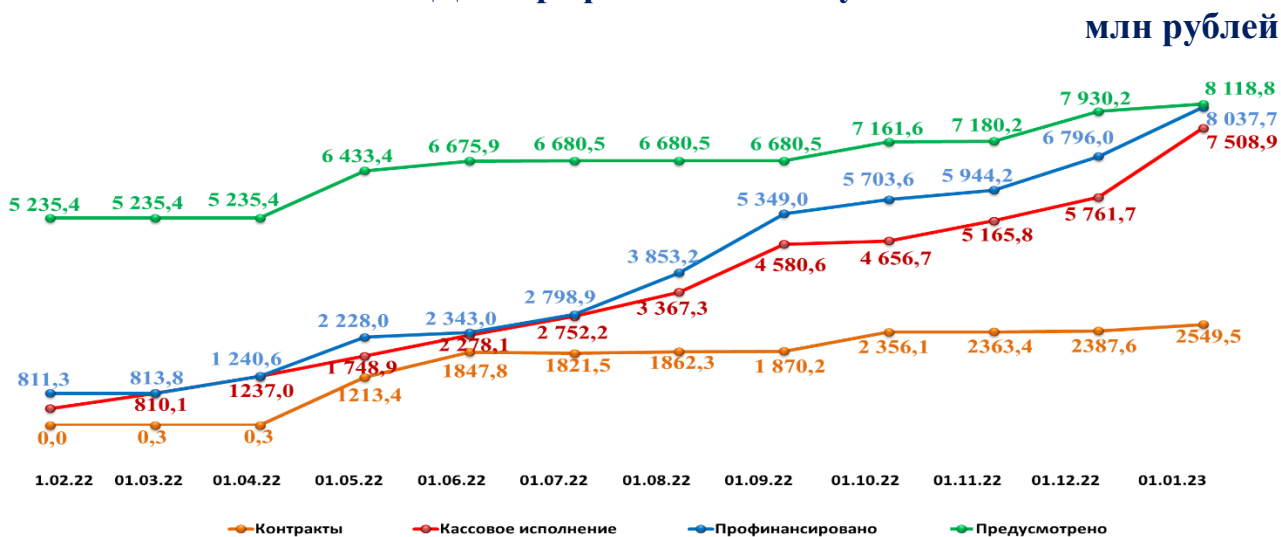

Информация об освоении средств, выделенных на реализацию региональных проектов национального проекта «Демография» на территории Республики Дагестан представлена в следующей таблице.

Региональные проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено		Остаток средств на 1.01.23 г.	
			Сумма	%	Сумма	%
«ДЕМОГРАФИЯ», всего	8 118,8	8 037,7	7 508,8	92,5	609,9	7,5
1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	5568,4	5534,8	5534,5	99,4	33,88	0,6
2. «Содействие занятости»	1998,8	1951,3	1423,2	71,2	575,6	28,8
3. «Старшее поколение»	0,029	0,029	0,029	99,7	0	0,0
4. «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»	0	0	0	0	0	0
5. «Спорт – норма жизни»	551,6	551,6	551,1	99,9	0,5	0,1

В рамках национального проекта «Демография» заключено 128 контрактов на сумму 2 549,5 млн рублей, или 100 % от планового объема.



2.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году было предусмотрено проведение следующих мероприятий:

– предоставление ежемесячных выплат 44,3 тыс. семей в связи с рождением первого ребенка – 5 415,1 млн рублей;

– проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО) (1,3 тыс. циклов) семьям, страдающим бесплодием, – 153,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию регионального проекта было предусмотрено финансирование в сумме 5 568,41 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 415,5 млн рублей, средства Территориального фонда ОМС РД (на проведение процедур ЭКО) – 153,0 млн рублей). Профинансированы расходы на сумму 5 534,8 млн рублей, или 99,4 % от годовых назначений (5 568,41 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоено 5 534,52 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 99,4 % от годовых назначений (по ежемесячным выплатам – 5 415,5 млн рублей, по процедурам ЭКО – 119,3 млн рублей).

Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 49 096 семей, или 105,8 % от планового количества на 2022 г. (46,4 тыс. семей).

Целевой показатель регионального проекта «Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» выполнен на 105,8 % (план – 46,4 тыс. семей, факт – 49,1 тыс. семей). Следует отметить об устойчивой динамике роста показателя с момента начала реализации регионального проекта, в том числе: в 2019 году указанную выплату получили 21 020 семей, в 2020 году – 36 137 семей, в 2021 году – 48 529 семей, в 2022 году – 49 096 семей.

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования обеспечено выполнение 1 393 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, или 107,2 % от плана (1 300 процедур).

Несмотря на перевыполнение по итогам 2022 года количественных показателей результата по выполнению циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием, по данному мероприятию фактически освоено 119,4 млн рублей, или 78,1 % от годовых назначений (153,0 млн рублей). Не освоено 33,57 млн рублей, в виду того, что в 2022 году выполнение процедуры ЭКО осуществлялось с использованием метода «криоперенос», который является менее затратным и более эффективным по сравнению с полным циклом ЭКО.



2.2. Региональный проект «Содействие занятости»

По региональному проекту «Содействие занятости» в 2022 году было предусмотрено обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на уровне 66,4 % за счет дополнительно созданных 9,1 тыс. мест в дошкольных организациях в ходе проведения следующих мероприятий:

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (20 садов на 1 950 мест) – 230,7 млн рублей;
- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет (38 садов (яслей) на 7 210 мест) – 1 743,0 млн рублей;
- повышение эффективности службы занятости (создание центра занятости населения) – 25,0 млн рублей;
- создание не менее 15 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования;
- повышение квалификации 1,5 тыс. специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми в частном секторе.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (25,0 млн рублей) и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (1 973,8 млн рублей), Министерство образования и науки Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта в 2022 году было предусмотрено финансирование в сумме 1 998,8 млн рублей² (средства федерального бюджета – 1 510,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 488,5 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 профинансировано 1 951,3 млн рублей, или 99,4 % от годовых назначений (1 998,8 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 423,2 млн рублей, или 73,0 от объема финансирования, или 71,2 % от годовых назначений (1 998,8 млн рублей).

В целях реализации регионального проекта заключено 109 контрактов (договоров), или 100 % от планового объема, в том числе:

- 1 контракт на сумму 99,8 млн рублей (бюджет 2022 года – 47,5 млн рублей) на строительство детсада (яслей) в селе Верхний Дженгутай Буйнакского района;
- 48 контрактов на сумму 24,6 млн рублей в рамках мероприятия по повышению эффективности службы занятости (391,2 тыс. рублей – экономия по результатам торгов),

В общий объем контрактов по региональному проекту в рамках строительства объектов дошкольного образования дополнительно включены

²С учетом неиспользованных в рамках строительства 57 объектов дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет остатков бюджетных средств 2021 года и дополнительно предусмотренных средств республиканского бюджета РД согласно Закону РД от 29.12.2021 г. № 91 (в редакции от 30.04.2022 г. № 32)

60 контрактов, заключенных в 2019 – 2021 годах в целях освоения остатков бюджетных средств, неиспользованных в 2021 году.

В рамках реализации регионального проекта по 2 мероприятиям предусмотрено строительство 59 объектов дошкольного образования на 9 410 мест (с нарастающим итогом с 2019 года).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 2247-р, строительство объектов дошкольного образования осуществляет ФГУП «Главное управление специального строительства» (далее – ФГУП «ГУСС»), с которым заключены 57 контрактов на сумму 8 316 млн рублей.

1) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (20 детских садов на 1 950 мест).

В целях завершения строительства объектов по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет согласно дополнительному соглашению от 27 апреля 2022 года № 073-17-2019-015/9 в 2022 году было предусмотрено финансирование в сумме 207,13 млн рублей (средства федерального бюджета – 123,67 млн рублей, республиканского бюджета – 83,46 млн рублей).

В соответствии с Законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год было запланировано финансирование в сумме 230,76 млн рублей (средства федерального бюджета – 123,67 млн рублей (в том числе из средств резервного фонда Правительства РФ – 52,64 млн рублей), республиканского бюджета – 107,09 млн рублей), в том числе в рамках Соглашения – 207,13 млн рублей.

Согласно дополнительному соглашению от 18.12.2022 г. № 073-17-2019-0150/13, заключенному между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, объем средств, предусмотренных из федерального бюджета в 2022 году на реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (123,7 млн рублей) был уменьшен на 21,5 млн рублей, что составило 102,2 млн рублей.

В тоже время, в связи с поздним доведением расходных расписаний до Республики Дагестан (18.12.2022 г.) соответствующие операции по уменьшению лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования Министерством финансов Республики Дагестан не были произведены. В результате, по состоянию на 1 января 2023 года лимиты бюджетных обязательств в сводной бюджетной росписи не изменились и не соответствует Дополнительному соглашению от 18.12.2022 № 073-17-2019-015/13.

На реализацию мероприятия в 2022 году профинансированы средства в сумме 230,76 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 184,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 90,4 млн рублей), или 79,7 % от годовых назначений (230,76 млн рублей).

**Перечень детских садов по региональному проекту
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

млн рублей

№	Детские сады	Кол-во мест	Стоимость контракта	Профинансировано	Кассовое исполнение	Уровень готовности
1	Детсад в г. Каспийске МКР «№ 10»	100	73,26	9,05	0,0	Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад в г. Буйнакске (ул. Али-Клыча, 86)	60	62,93	0,001	0,0	Получена лицензия
3	Детсад в г. Хасавюрте (ул. 40 лет Октября)	120	101,08	3,53	0,06	Получена лицензия
4	Детсад в с. Кульзёб Кизилюртовский район	60	75,08	0,32	0,0	Получена лицензия
5	Детсад в с. Араблинское Дербентский район	100	94,86	3,33	3,33	Получена лицензия
6	Детсад в пос. Ленинаул Казбековский район	100	94,12	4,79	0,14	Получена лицензия
7	Детсад в с. Магарамкент Магарамкентский район	60	66,05	3,57	0,05	Получена лицензия
8	Детсад в г. Махачкале МКР «Ак-Гель»	250	195,33	2,66	0,04	Получена лицензия
9	Детсад в г. Дербенте	60	63,07	3,33	0,14	Получена лицензия
10	Детсад в г. Кизляре (ул. Кочубея, 28)	100	98,83	0,003	0,00	Получена лицензия
11	Детсад в с. Учкент Кумторкалинский район	100	95,70	1,83	0,03	Получена лицензия
12	Детсад в с. Новые Викри Каякентский р-н	120	125,04	0,06	0,05	Получена лицензия
13	Детсад в с. Эндирей Хасавюртовский район	120	107,95	0,57	0,14	Получена лицензия
14	Детсад в г. Махачкале (ул. Азиза Алиева, 32)	60	63,3	3,29	1,83	Получена лицензия
15	Детсад в г. Махачкале (ул. Фонвизина, 6)	60	75,37	17,89	6,01	Получено заключение о соответствии
16	Детсад в г. Избербаш	100	116,33	19,68	19,08	Получено заключение о соответствии
17	Детсад в с. Хамаматюрт Бабаюртовский района	100	103,89	32,27	32,10	Получено заключение о соответствии
18	Детсад в с. Тинди Цумадинский район	60	75,56	20,44	19,36	Получено заключение о соответствии
19	Детсад в с. Миарсо Ботлихский район	100	103,79	38,82	37,97	Получено заключение о соответствии
	Итого по завершенным	1 830	1 791,54	165,4	120,3	
20	Детсад в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	107,66	65,34	63,94	67,8
	Итого по незавершенным	120	107,66	65,34	63,94	
	Итого	1 950	1 899,2	230,77	184,27	

По состоянию на 1 января 2023 года из 20 детских садов на 1 950 мест, запланированных к завершению и вводу в эксплуатацию в период с 2019 по 2022 годам, завершено строительство 19 детсадов на 1 830 мест, по которым получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них по 14 детсадам получена лицензия на ведение образовательной деятельности.

В виду низких темпов ведения строительных работ, связанных с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, не завершено строительство детского сада на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы (незавершенное строительство 2021 года). Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта неоднократно переносились на более поздний период. Уровень готовности на 1 января 2023 года составил 67,8 %. На 1 января 2023 года освоено 63,9 млн рублей, или 59 % от стоимости контракта (107,7 млн рублей).

Согласно протоколу совещания у Директора Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 24.10.2022 г. № П8–76457 плановый срок ввода в эксплуатацию объекта перенесен на 23.08.2023 г.

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (38 детских садов (яслей) на 7 210 мест).

В целях завершения строительства объектов на реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет согласно Дополнительному соглашению от 31 октября 2022 года № 073-09-2022-905/5 в 2022 году было предусмотрено финансирование в сумме 1 497,0 млн рублей, в том числе средства резервного фонда Правительства Республики Дагестан – 481,1 млн рублей.

В соответствии с Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 1 743,0 млн рублей (федеральный бюджет – 1 361,9 млн рублей (в том числе из средств резервного фонда Правительства РФ – 55,4 млн рублей), республиканский бюджет – 381,1 млн рублей).

Согласно дополнительному соглашению от 17.12.2022 № 073-09-2022-905/6, заключенному между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, объем средств, предусмотренных из федерального бюджета в 2022 году (1 361,9 млн рублей) был уменьшен на 128,1 млн рублей, что составило 1 233,8 млн рублей.

В тоже время, в связи с поздним доведением расходных расписаний до Республики Дагестан (17.12.2022 г.) соответствующие операции по уменьшению лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования не были произведены Министерством финансов Республики Дагестан.

В результате, по состоянию на 1 января 2023 года лимиты бюджетных обязательств в сводной бюджетной росписи не изменились и не соответствует дополнительному соглашению от 17.12.2022 № 073-09-2022-905/6.

На реализацию мероприятия в 2022 году профинансированы средства в сумме 1 682,4 млн рублей, или 96,5 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 1 309,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 373,2 млн рублей). Кассовое исполнение составило 1 214,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 962,6 млн рублей и республиканского бюджета – 252,0 млн рублей), или 69,7 % от годовых назначений (1 743,0 млн рублей).

Не использованный (не освоенный) остаток составил 528,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 399,4 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 129,1 млн рублей), или 30,3 % от объема финансирования.

По состоянию на 1 января 2023 года из 38 детсадов (яслей) на 7 210 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию и началу строительства в 2020-2022 годах, завершено строительство 32 объектов на 6 210 мест с получением разрешения на ввод в эксплуатацию (по 17 объектам на 3 310 мест получена лицензия на образовательную деятельность).

Не завершено строительство 6 объектов на 1 000 мест, в том числе:

– по 5 объектам с уровнем строительной готовности от 46 % до 63 %, (в с. Тагиркент, Левашинский район на 250 мест (63 %), с. Унцукуль, Унцукульский район на 120 мест (57,3 %), с. Куруш, Хасавюртовский район по 200 мест (55 %), г. Дербенте на 250 мест (46,5 %) и в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский» на 120 мест (48,0 %));

– по 1 объекту (детсад (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района распоряжением Правительства РД от 31 мая 2022 г. № 206-р подрядчиком на строительство определена ООО СМК «Жилье» (заказчик – ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»). Заключен контракт на подготовку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ на сумму 99,82 млн рублей. Начало строительство было предусмотрено в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году. Строительные работы в 2022 году не начаты в связи с корректировкой проектно-сметной документации.

По объекту «Детский сад на 250 мест в МКР «Тарки-Тау» г. Махачкала», начало строительства которого было запланировано на 2023 год, произведена замена на детский сад на 250 мест в пос. Красноармейск г. Махачкалы и заключен государственный контракт от 30.12.2022 года на проектирование и строительство.

**Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

млн рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Профинансировано в 2022 году	Кассовое исполнение 2022 года	Уровень готовности
1	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»)	200	167,33	0,06	0,06	Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Сулак)	200	164,75	2,70	0,04	Получена лицензия
3	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 11)	250	205,0	0,17	0,98	Получена лицензия
4	Детсад (ясли) в г. Кизляре	250	211,75	0,20	0,00	Получена лицензия
5	Детсад (ясли) в с. Буртунай (Казбековский район)	60	69,74	0,19	0,19	Получена лицензия
6	Детсад (ясли) в с. Сиртыч (Табасаранский район)	60	66,90	0,56	0,56	Получена лицензия
7	Детсад (ясли) в с. Доргели (Карабудахкентский район)	200	173,22	2,66	2,01	Получена лицензия
8	Детсад (ясли) в г. Кизилюрте (МКР №3)	250	191,99	3,02	0,00	Получена лицензия
9	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Богатыревка)	200	166,59	9,34	1,01	Получена лицензия
10	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР «Кемпинг»)	250	202,97	0,34	0,31	Получена лицензия
11	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 10)	250	211,67	2,01	0,78	Получена лицензия
12	Детсад (ясли) в с.Карабудахкент (Карабудахкентский район)	250	190,64	0,31	0,28	Получена лицензия
13	Детсад (ясли) в с. Баршамай (Кайтагский район)	120	112,36	0,35	0,34	Получена лицензия
14	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук (Каякентский район)	120	112,17	0,15	0,00	Получена лицензия
15	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	176,74	1,19	0,56	Получена лицензия
16	Детсад (ясли) в с. Нечаевка (Кизилюртовский район)	200	171,85	29,18	20,13	Получена лицензия
17	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Н.Хушет, МКР № 3)	250	200,3	33,12	19,37	Получена лицензия
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (ул. Шихова, 120б)	250	228,13	35,36	31,03	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
19	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Мичурино»)	200	173,98	30,61	20,73	Получено разрешение на ввод
20	Детсад (ясли) в с. Джанга (Карабудахкентский район)	120	136,05	54,72	47,65	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
21	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Морская)	250	212,98	108,62	91,81	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
22	Детсад (ясли) в с. Каякент (Каякентский район)	250	239,43	82,08	76,09	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Профинансировано в 2022 году	Кассовое исполнение 2022 года	Уровень готовности
23	Детсад (ясли) в с. Эрпели (Буйнакский район)	120	112,18	36,38	25,22	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
24	Детсад (ясли) в с. Мюрего (Сергокалинский район)	120	129,1	29,33	25,21	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
25	Детсад (ясли) в с. Тарумовка (Тарумовский район)	200	173,42	183,13	137,57	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
26	Детсад (ясли) в г. Дербенте	200	186,04	104,79	14,02	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
27	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Российская)	250	260,91	140,04	119,99	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
28	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР «Новый»)	250	214,99	22,32	19,37	Извещение об окончании работ
29	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «Ипподром»)	200	174,71	41,91	33,01	Извещение об окончании работ
30	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (МКР «Молодежный»)	250	219,32	84,27	81,01	Извещение об окончании работ
31	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух (Буйнакский район)	120	112,42	36,02	35,91	Извещение об окончании работ
32	Детсад (ясли) в с. Ботаюрт (Хасавюртовский район)	120	133,95	75,54	71,73	Извещение об окончании работ
	Итого по завершённым объектам	6 210	5 503,58	1 150,67	876,97	
33	Детсад (ясли) в с. Тагиркент (Левашинский район)	250	242,61	156,01	137,92	62,9
34	Детсад (ясли) в с. Унцукуль (Унцукульский район)	120	125,12	58,25	36,71	57,2
35	Детсад (ясли) в с. Куруш (Хасавюртовский район)	200	204,18	191,03	125,34	55,0
36	Детсад (ясли) в г. Дербенте	250	222,22	73,02	0,01	46,5
37	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»)	120	119,77	72,82	55,29	48,0
	Итого по строящимся объектам	940	913,9	551,13	355,27	
	Итого по ФГУП «ГУСС»	7 150	6 417,48	1 701,8	1 232,2	
38	Детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай (Буйнакский район)	60	99,82	40,82	0,00	0
	Итого 2022 год	7 210	6 517,3	1 742,62	1 232,2	
	2023 год					
39	Детсад (ясли) в п. Красноармейск г. Махачкале, начало строительства – 2023 год	250	0	0	0	Заключен контракт на ПСД и СМР
	Всего	7 460	6 517,1	1 742,6	1 232,2	

Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» из **58 объектов на 9 160 мест** (строительство 2022 года):

– **завершено строительство 51 объекта на 8 040 мест** (19 детсадов на 1 830 мест и 32 детсада (ясли) на 6 210 мест). По 51 объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в том числе по 31 объекту на 4 720 мест получена лицензия на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

– **не завершено строительство 6 объектов на 1 060 мест**, в том числе 1 детсад на 120 мест, 5 детсадов (яслей) на 940 мест, с уровнем строительной готовности от 46 % до 63 % (подрядчик – ФГУП «ГУСС»);

– **не начато строительство детсада (ясли) на 60 мест** (детсад в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района), разработка проектно-сметной документации не завершена.

По объекту «Детский сад на 250 мест в пос. Красноармейск г. Махачкала» заключен государственный контракт с единственным исполнителем по проектированию и строительству (срок начала строительства – 2023 год).

По результатам проведенного мониторинга следует отметить, что в 2022 году темпы строительства и освоения средств по объектам, которые должны были быть завершены в 2022 году, были недостаточны для своевременного завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

3) Повышение эффективности службы занятости.

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году было запланировано осуществить модернизацию ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Махачкала» (г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117, 1 этаж).

В целях реализации мероприятия заключены 48 контрактов (договоров) на сумму 24,5 млн рублей на ремонт помещения, закупку офисной техники (оргтехники), мебели, систем видеонаблюдения и кондиционирования, подключение к сети Internet.

В целях освоения в полном объеме предусмотренных средств в сумме 25,0 млн рублей и в связи с образованием экономии, возникшей, за счет понижения начальной максимальной цены контрактов, заключены контракты на поставку канцелярских принадлежностей для центров занятости населения в муниципальных образованиях «Дербентский район», «Кизилюртовский район», «город Дербент», «город Каспийск» и «город Хасавюрт».

По состоянию на 1 января 2023 года на реализацию мероприятия профинансировано 25,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Фактически освоено 24,6 млн рублей, или 98, 4% от объема финансирования.

4) В ходе реализации регионального проекта создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, что в 2 раза превышает плановое значение (15 групп).

5) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования прошли курсы повышения квалификации 130 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций, или 8,7 % от плана (1 500 специалистов).

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %.	57,78	60,59	105
	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, возрастающий, тысяча мест	8,16	8,04	99

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году принятые меры оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач. Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, не выполнены в полном объеме. Из 2 целевых показателей регионального проекта не выполнен целевой показатель «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет» – 8,04 тыс. мест, или 99 % плана (8,16 тыс. мест). Показатель недостигнут в связи низкой строительной готовностью объекта в п. Шамхал-Термен г. Махачкалы на 120 мест.

Приведенные данные о реализации регионального проекта «Содействие занятости» свидетельствуют о повторении в 2022 году ситуации предыдущих двух лет, связанной со срывом сроков окончания строительства объектов образования и неосвоением профинансированных бюджетных средств.

**По результатам мониторинга реализации регионального проекта
Счетная палата предлагает:**


- с целью завершения строительства объектов в установленные сроки, заказчику совместно с подрядчиком актуализировать график производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с учетом сроков сдачи объекта, согласовать график с заказчиком и ускорить темпы строительства;

- заказчику обеспечить контроль за своевременностью выполнения строительных работ в соответствии с утвержденным графиком;

- заказчику совместно с подрядчиком установить оборудование и камеры видео-фото фиксации на объектах строительства, с целью мониторинга строительства объекта в режиме реального времени.

- подрядчику обеспечить качественное выполнение всего цикла строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

- органам исполнительной власти и муниципальных образований Республики Дагестан, уполномоченных по надзору за ходом строительства и вводу в эксплуатацию объектов строительства, обеспечить контроль за ходом строительства и приемки в эксплуатацию законченных объектов строительства.



2.3. Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий:

- вакцинация против пневмококковой инфекции 95 % лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания - 0,03 млн рублей;

- оказание помощи гражданам старше трудоспособного возраста на геронторолических койках – 900 человек;

- предоставление социальных услуг в организациях социального обслуживания - 11 % от числа граждан старше трудоспособного возраста.

Ответственным за реализацию регионального проекта является Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

За счет средств федерального бюджета профинансировано и освоено 0,03 млн рублей или 100 % от годовых назначений.

Заключен договор от 17 февраля 2022 года на закупку вакцины «Превенар 13» на сумму 28,9 тыс. рублей. Поставка вакцины обеспечена.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 24 декабря 2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания» в 2022 году вакцинации подлежали 94 человека. Вакцинацию прошли 94 человека старше трудоспособного возраста или 100 % от плана.

Оказание помощи гражданам старше трудоспособного возраста осуществляют 16 гериатрических кабинетов, в том числе в 2022 году открыты и лицензированы 2 гериатрических кабинета в ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» и ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ».

В 2022 году на 100 гериатрических койках пролечено 2 080 человек, или 231 % от плана на 2022 год (900 человек)

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан данной группы – 10,9 %, или 102 % от плана (10,7 %).

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены.

По 5 целевым показателям регионального проекта обеспечено достижение плановых значений в размере от 102 % до 229 %.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает провести работу по привлечению негосударственных организаций социального обслуживания в реестр поставщиков социальных услуг Республики Дагестан.



2.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет внедрения муниципальными образованиями программ общественного здоровья.

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения Республики Дагестан. В 2022 году региональный проект не финансировался.

В рамках государственной программы Республики Дагестан «Укрепление общественного здоровья» (утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 286) в 2020-2021 годах разработана и внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья.

В 2022 году разработаны и внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья в 11 муниципальных образованиях республики: «Ахтынский район», «Акушинский район», «Буйнакский район», «Ботлихский район», «Докузпаринский район», «Кизлярский район», «Казбековский район», «Хасавюртовский район», «город Хасавюрт», «город Махачкала» и «город Дербент».

Таким образом, по состоянию на 1 января 2023 года в республике реализованы 32 муниципальные программы общественного здоровья. Достижение результата составило 61,5 % или 102,5 % от плана (60 %).

В целях достижения результата проекта «Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников» продолжено внедрение модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 118 медицинских организациях Республики Дагестан. С 2022 года данные программы реализуются во всех медицинских организациях республики. Кроме того, между Министерством здравоохранения Республики Дагестан и Министерством образования и науки Республики Дагестан, Дагестанстат, ООО «Киргу», ООО «Газпром трансгаз Махачкала» подписаны соглашения о внедрении модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте.

В 2022 году значения по целевым показателям достигнуты в полном объеме. При этом, фактическое достижение по целевому показателю «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) составило 0,26 литров этанола, или 379 % от плана на 2022 год (1 литр этанола).

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации розничные продажи алкогольной продукции по Республике Дагестан на 1 января 2023 года составили 141 859 литров, или 0,4 % в общем объеме продаж по Российской Федерации.

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением – 5,9 %, или 100 % от плана (54,9 %).



2.5. Региональный проект «Спорт – норма жизни».

В ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году было предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями до 57,8 %, а также доли населения, систематически занимающегося спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 56 % за счет проведения следующих мероприятий:

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Эндирей Хасавюртовского района и в г. Дербент – 367,5 млн рублей;
- закупка спортивной экипировки для 10 спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 14,5 млн рублей;
- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малых спортивных площадок (ГТО) – 20,2 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта профинансировано 551,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 523,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 27,6 млн рублей). Фактически освоено 551,1 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений.

Заключены 18 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 551,1 млн рублей, в том числе:

– 1 контракт от 05.05.2022 г. № 2056204588122000003 на сумму 15,4 млн рублей (экономия на сумму 77,5 тыс. рублей) на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Завершен монтаж оборудования на 9 спортивных площадках в муниципальных образованиях: «Бабаюртовский район», «Казбековский район», «Карабудахкентский район», «Левашинский район», «Магарамкентский район», «Тарумовский район», «Цумадинский район», «Чародинский район». Контракт исполнен;

– 1 договор № 2056204588122000032 от 26.09.2022 на сумму 4,7 млн рублей по закупке спортивно-технологического оборудования, исполнен;

– 1 контракт от 27 июня 2022 г. № 0103200008422001689 на поставку спортивной экипировки на сумму 14,5 млн рублей. Контракт исполнен;

– 1 контракт от 22 апреля 2022 г. № 2057103586522000002 на сумму 252,0 млн рублей (лимит 2022 года – 196,0 млн рублей) на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г. Дербенте Республики Дагестан» (экономия 2,0 млн рублей). В связи с удорожанием объекта, дополнительным соглашением от 24 декабря 2022 года № 777-09-2020-126/6 предусмотрены дополнительные средства в объеме 58,2 млн рублей (средства федерального бюджета 57,6 млн рублей, республиканского бюджета – 0,6 млн рублей). Общий объем

финансирования на 2022 год составил 254,2 млн рублей. Освоено 253,8 млн рублей, или 99,8 % от годовых назначений. Экономия составила 460,0 тыс. рублей. Строительство объекта завершено;

– 13 договоров в целях оборудования в ФОК в г. Дербенте на сумму 7,2 млн рублей. Фактически освоено 7,12 млн рублей, или 100 % от суммы контракта (экономия – 0,8 млн рублей);

– 1 контракт от 18 апреля 2022 г. № 544-ОК/2022 на сумму 392,5 млн рублей (бюджет 2022 года – 164,3 млн рублей) на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с универсальным игровым залом в с. Эндирей Хасавюртовского района. Объект переходящий, срок исполнения контракта – 15 октября 2023 года. В 2022 году было предусмотрено освоение 164,3 млн рублей (54 % от стоимости контракта). В связи с удорожанием объекта, дополнительным соглашением от 24 декабря 2022 года № 777-09-2020-126/6 предусмотрены дополнительные средства в сумме 91,2 млн рублей (средства федерального бюджета 90,3 млн рублей, республиканского бюджета – 0,9 млн рублей). Общий объем финансирования на 2022 год составил 255,5 млн рублей. Освоено 255,5 млн рублей, или 100 % от назначений. Строительная готовность объекта – 59 %.

В ходе проводимого Счетной палатой аудита эффективности реализации национальных проектов, было установлено, что по состоянию на 1 января 2023 года не введен в эксплуатацию строительный объект 2020 года – футбольное поле с беговыми дорожками и секторами в с. Ансалта Ботлихского района (срок ввода в эксплуатацию – 31 октября 2021 года).

В связи с низким качеством проектно-сметной документации и технологического процесса строительных работ на объекте, а также в связи с природно-климатическими условиями, футбольное поле получило частичную просадку. В связи с отказом подрядчика от устранения недостатков, решение вопроса рассматривается в судебном порядке.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, возрастающий, процент	56	56	100
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	57,8	57,8	100

В 2022 году мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, целевые показатели регионального проекта, исполнены.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата Республики Дагестан предлагает:

– усилить контроль за качеством строительства объектов массового спорта и соблюдением сроков ввода их в эксплуатацию;

– включить в план реализации регионального проекта мероприятие по подготовке кадрового обеспечения физкультурно-оздоровительных комплексов и центров тестирования.



3. Национальный проект «Здравоохранение»



Куратор национального проекта:

Махмудов А. М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Беляева Т. В.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ


В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 8 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Первичная медико-санитарная помощь»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- 5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
- 6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
- 7) «Развитие экспорта медицинских услуг»;
- 8) «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Финансирование национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году

млн рублей

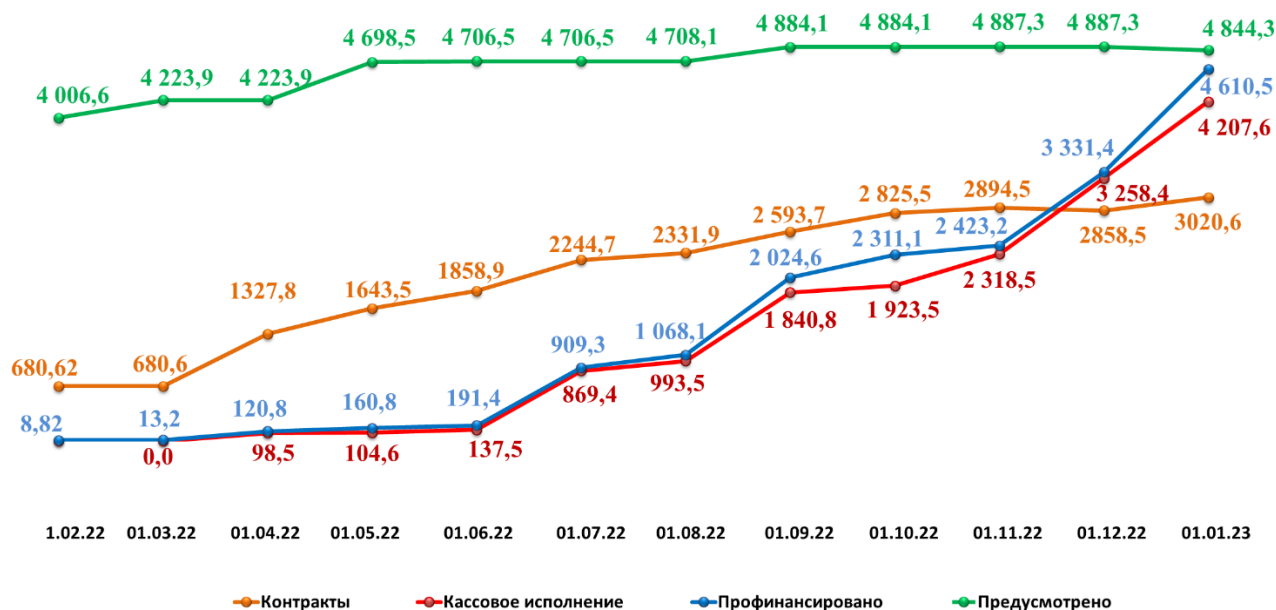

В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» было предусмотрено финансирование в размере 4 884,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 719,2 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 348,5 млн рублей, внебюджетные источники – 1 776,6 млн рублей).

Профинансировано 4 610,5 млн рублей, или 95,2 % от годовых назначений (4 884,3 млн рублей).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

На 1 января 2023 года освоено 4 207,6 млн рублей, или 91,3 % от объема финансирования и 87,0 % от годовых назначений (4 884,3 млн рублей). Неиспользованный остаток составил 636,7 млн рублей, или 13,0 % от годовых назначений (4 884,3 млн рублей), в том числе по региональным проектам:

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 15,8 млн рублей, или 4,0 % от объема годовых назначений (403,97 млн рублей);
- «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 124,5 млн рублей, или 6,6 % от объема годовых назначений (1 899,8 млн рублей);
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 328,8 млн рублей или 61,4 % от объема годовых назначений (535,3 млн рублей);
- «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» – 167,7 млн рублей, или 10,7 % от годовых назначений (1 565,9 млн рублей).

В рамках национального проекта «Здравоохранение» заключены 383 контракта (договора) по 6 региональным проектам, или 100 % планового объема на общую сумму 3 020,6 млн рублей (из них 10 контрактов 2021 года на сумму 456,29 млн рублей и 1 контракт 2020 года на сумму 3,0 млн рублей).

Из 8 региональных проектов в 2022 году было предусмотрено финансирование 7 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» не предусматривалось.

Информация о реализации в 2022 году региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» представлена в следующей таблице.

млн рублей

Региональные проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено на 1.01.2023 г.		Остатки средств на 1 января 2023, %	
			Сумма	%	Сумма	%
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»	4 844,33	4 610,53	4 207,62	91,3	636,7	13,1
1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	137,03	137,03	137,03	100	0	0
2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	403,97	403,97	388,16	96,1	15,8	
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»	1 899,84	1899,84	1775,36	93,4	124,5	
4. «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	84,0	84,0	84,0	100	0	0
5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	218,32	218,32	218,32	100	0	0
6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	535,32	301,52	206,55	38,6	328,8	
7. «Развитие экспорта медицинских услуг»	0	0	0	0	0	0
8. «Модернизация первичного здравоохранения в Республике Дагестан»	1 565,86	1565,86	1398,20	89,3	167,7	



3.1. Региональный проект «Первичная медико-санитарной помощи».

Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» направлен на формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В рамках реализации регионального проекта в 2022 году были запланированы мероприятия по развитию санитарной авиации за счет обеспечения 187 вылетов в целях оказания экстренной медицинской помощи.

В 2022 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 137,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 81,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 55,7 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоено 137,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений

Министерством здравоохранения Республики Дагестан 137,0 млн рублей перечислены ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. По данным ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» фактически освоено 134,7 млн рублей, или 98,3 % от объема финансирования.

Согласно данным ЕИС «Закупки», ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» с АО «Национальная служба санитарной авиации» заключен контракт № 2057201092021000052 от 21 октября 2021 года на сумму 126,5 млн рублей на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Стоимость выполненных обязательств по контракту составила 126,2 млн рублей, оплачено 125,0 млн рублей. Согласно дополнительному соглашению к контракту от 22.12.2022 г контракт расторгнут по причине отсутствия необходимости.

В связи с плановыми ремонтными работами санитарного вертолета в период с 15 по 22 декабря 2022 г. в 2022 году выполнено 176 вылетов, или 94,1 % от планового количества (187 вылетов). Вместе с тем, в 2022 году число лиц (пациентов) эвакуированных с использованием санитарной авиации» составило 206 человек, или 105,8 % от плана (187 человек), из них 36 детей.

Согласно приказу МЗ РД № 531-Л от 23.05.2022 года «О реализации проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в 2022 г. согласно региональному паспорту реализации проекта Республике Дагестан, приняли участие в реализации проектов 48 медицинских организаций с 73 структурными подразделениями, что составляет – 71,6% (37 детских структурных подразделений, 36 взрослых структурных подразделений).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, тыс. посещений	5,2	5,2	100
2	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, посещение	3,07	3,07	100
3	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, процент	100	100	100
4	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг в отчетном году, процент	15	75,8	505,3
5	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, процент	97,5	99	101,5
6	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий, млн чел.	35,2	59,4	169
7	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий, процент	71,4	72,2	101
8	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент	90	90	100
9	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)	187	206	110,1
10	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий, тыс. посещений	9 433,7	10 544	112

Мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты.

Согласно данным отчета за 2022 год «Об организации работы регионального центра оказания первичной медико-санитарной помощи по внедрению бережливых технологий на территории республики», показатель «Количество визитов пациента в поликлинику для прохождения профилактического медицинского осмотра (не более 3 единиц) составил 44 визита, или 92 % от плана (48 визитов).

По целевому показателю «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами на 1 мобильную медицинскую бригаду» (5,2 тыс. посещений), плановое значение совпадает с базовым значением, и не имеет динамики роста до 2024 года.



3.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предусмотрено расширение объемов и видов оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», снижение смертности от болезней системы кровообращения за счет проведения следующих мероприятий:

- оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 344,3 млн рублей;

- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 59,7 млн рублей;

В 2022 году на реализацию регионального проекта профинансировано 404,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 403,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоено 388,2 млн рублей, или 96,1 % от объема годовых назначений (404,0 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключено 38 контрактов, или 100 % от плана на сумму 404,0 млн рублей (25 контрактов по 54 единицам оборудования на общую сумму 344,3 млн рублей, и 13 контрактов по кардиопрепаратам на сумму 59,7 млн рублей).

Поставлено в медицинские организации 49 единиц медицинского оборудования (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» (36 единиц), ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» (5 единиц), ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» (7 единиц), ГБУ РД «Городская клиническая больница» (1) единица).

Проведены работы по оснащению 2 региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и 2 первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Городская клиническая больница», ГБУ «Буйнакская центральная городская больница»).

При этом, в ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» и ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» поставленное оборудование не в полном объеме введено в эксплуатацию. Причина неполного оснащения 1 РСЦ это задержка

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

комплектующих по законтрактованному оборудованию из заграницы. Полная поставка ожидается в феврале 2023 года

В целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений проведена работа по лекарственному обеспечению пациентов высокого риска.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	60	68,9	114,8
2	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечнососудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях,	85	89,2	105
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, убывающий	6,8	6,4	106,0
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий, %	14,6	8,2	178
5	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	1,95	0,8	243,7
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед	3,928	3,272	83,3

Принятые в 2022 году меры по реализации регионального проекта оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач. Запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в не полном объеме (освоено 96,1 % (388,2 млн рублей) от годовых назначений (404,0 млн рублей). Кроме этого, из 6 целевых показателей не обеспечено достижение планового значения по 1 целевому показателю: «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» – 3,272 тыс. единиц, или 83,3 % от плана (3,928 тыс. единиц). Следует отметить, что в 2021 году также не обеспечено планового значения данного целевого показателя – 2,07 тыс. единиц, или 64 % от плана (3,24 тыс. единиц)



3.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2022 году предусмотрено обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году за счет проведения следующих мероприятий:

- открытие Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» – 52,9 млн рублей (средства республиканского бюджета);
- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала – 227,3 млн рублей (средства федерального бюджета);
- строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя - 157,6 млн рублей (средства республиканского бюджета);
- оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения – 1 458,8 млн рублей (средства ТФОМС РД).

В 2022 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в размере 1 899,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 227,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 213,7 млн рублей, средства ТФОМС РД – 1 458,8 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоено 1 775,4 млн рублей, или 93,4 % от годовых назначений. Неосвоенный остаток средств составил 124,4 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта заключено 35 контрактов, или 100 % от плана на сумму 439,2 млн рублей, в том числе:

- 18 контрактов по 27 единицам оборудования в целях переоснащения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» на сумму 227,0 млн рублей. Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию в ГБУ РД «РОЦ» 23 единиц медицинского оборудования. Поставка 3 единиц оборудования задерживается по причине проблем с поставкой и сборкой частей (микрочипов и схем), а также задержкой на таможне в городе Хабаровск. Поставщики, у которых проблемы с доставкой: ООО «Медсервис», ООО «Эра», ООО «Альфа» Полная поставка ожидается в январе – феврале 2023 года;
- 1 контракт в целях переоснащения ГБУ РОЦ «Республиканский онкологический центр» на сумму 3,0 млн рублей (контракт 2020 года);
- 3 контракта по строительству помещения для линейных ускорителей на сумму 144,1 млн рублей.

– 13 контрактов по закупке 13 единиц оборудования на сумму 52,92 млн рублей в целях оснащения ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ». Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию оборудования.

На базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» 30 ноября 2022 года открыт Центр амбулаторной онкологической помощи на 6 коек (освоено 52,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений).

Предусмотренная на 2022 год сумма на лечение больных с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения (1,485 млн рублей, ТФОМС РД) освоена в полном объеме.

В 2022 году Министерством здравоохранения Республики Дагестан с ООО «Спецстроймонтаж» заключен контракт от 29.09.2022г. 2056204455022000801 на сумму 145,98 млн рублей на «Строительство каньонов для лучевой терапии в ГБУ РД «Республиканский онкологический центр». Завершение строительства – 30.03.2023 г. Бюджет 2022 года – 133,89 млн рублей. Информация об исполнении контракта на сайте zakupki.gov.ru не размещена.

В целях проведения строительного контроля по строительству объекта «Строительство каньонов для лучевой терапии в ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» Министерством здравоохранения Республики Дагестан также заключен контракт от 12 декабря 2022 года № 0103200008422003690, с ООО «Даггеомониторинг» на сумму 1,72 млн рублей. Окончание срока оказания услуг по строительному контролю предусмотрено на 30 июня 2023 года.

В целях реализации мероприятия в 2022 году профинансировано 157,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Освоено 68,9 млн рублей, или 43,5 % от годовых назначений.

Закупленный в 2020 году линейный ускоритель на сумму 373,9 млн рублей, не используется.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % убывающий	21,2	19,7	108
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	53,3	53,3	100
3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, %	52,8	53,1	101
4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %	70	70,8	101

В ходе реализации регионального проекта принятые меры оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач. Не реализованы в полном объеме мероприятия, обеспеченные финансированием. Однако по данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан выполнены плановые значения по всем 4 целевым показателям.



3.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году были запланированы мероприятия по развитию профилактического направления в педиатрии, внедрению современных профилактических технологий, улучшению материально-технической базы детских поликлиник и отделений медицинских организаций, повышению квалификации кадров, совершенствованию ранней диагностики заболеваний.

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 84,0 млн рублей за счет средств Федерального фонда социального страхования (родовые сертификаты).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоено 84,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключение контрактов в рамках регионального проекта не предусматривалось.

На 1 января 2023 года оказана медицинская помощь 166,3 тысяч женщинам в период беременности, родов в послеродовой период за счет средств родовых сертификатов, или 100 % от плана.

В симуляционных центрах обучено 332 специалиста, или нарастающим итогом 1 051 человек, или 118,0 % от плана (891 человек).

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, возрастающий	95	100	105,3
2	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	75	75,2	100
3	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	58,2	60,1	103,3
4	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, убывающий	10	8,7	114,9
5	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, убывающий	81	56,3	143,9
6	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	55	55,3	100,5

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
7	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	80	83,1	103,8
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	70	73,9	105,6
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	70	74,4	106,3
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения	75	76,9	102,5
11	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%), возрастающий	70	80,1	114,4
12	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, возрастающий	91,8	92,6	100,9
13	Младенческая смертность, убывающий	7,3	7,1	102,8

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году мероприятия, обеспеченные финансированием выполнены в полном объеме. Плановые значения по 13 целевым показателям достигнуты.

По показателю «Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)» (убывающий) выполнение составило 7,1 промилле³ или 102,8 % от планового значения на 2022 год.

По данным Дагестанстата в январе-ноябре 2022 года число зарегистрированных детей, умерших в возрасте до 1 года, составило 279 детей против 332 детей за соответствующий период 2021 года, или на 19 % меньше.

Коэффициент младенческой смертности за январь – ноябрь составил 7,0 промилле против 7,8 за январь - ноябрь 2021 года.

³ здесь и далее измеряется в промилле $\frac{1}{10}$ процента



3.5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

В ходе реализации регионального проекта предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, а также увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему образования, в том числе за счет единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников.

Финансирование регионального проекта предусмотрено в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» (вне регионального проекта) – 218,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 178,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 40,2 млн рублей), в том числе по программе, в том числе:

– **«Земский доктор»** – 187,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 178,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,4 млн рублей. (план 167 врачей и 23 фельдшеров)

– **«Развитие кадрового обеспечения»** – 30,8 млн рублей (средства республиканского бюджета).

По состоянию на 1 января 2023 года освоены средства в сумме 218,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 190 контрактов на общую сумму 187,5 млн рублей, в том числе: по программе «Земский доктор» – 167 договоров, «Земский фельдшер» – 23 договора, а также 1 соглашение на сумму 30,82 млн рублей по программе повышения квалификации.

Прошли обучение 5 673 средних медицинских работников.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, %	100	97,8	97,8
2	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества в медицинских учреждениях, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях), %, нарастающим итогом	92,4	93	100
3	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	28,22	22,4	79

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

4	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	33,6	34,5	102,7
5	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)	82,2	83,1	101,2
6	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, %	5,1	5,9	115,7
7	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, медицинскими работниками, возрастающий	100	97,8	97,8
8	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	21,2	21,1	100
9	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	13	13	100

Принятые в 2022 году меры не позволили обеспечить достижение всех целевых показателей реализации регионального проекта.

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» из 9 целевых показателей регионального проекта на 1 января 2023 года не обеспечено достижение 5 показателей, в том числе:

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средними медицинскими работниками – 97,8 % (план – 100 %);

- число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 22,4 тыс. чел. (план – 28,2 тыс. чел.);

- укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, медицинскими работниками – 97,8 % (план – 100 %);

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- провести мероприятия (командировочные расходы, оплата учебы) по организации повышения квалификации медицинских работников за пределами региона в целях изучения новых методов диагностики и лечения;

- при формировании кадрового состава медицинских организаций обеспечить комплектацию штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов;

- совместно с муниципальными районами принять меры по созданию необходимых условий для прибытия медицинских работников на село, в том числе за счет дополнительного стимулирования в виде предоставления земельных участков, служебного жилья и других мер.



3.6. Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения (ЕГИСЗ)» продолжалась реализация мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности, а также мероприятий по оказанию электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан Республики Дагестан к 2024 году.

На реализацию регионального проекта было предусмотрено финансирование в размере 535,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 298,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,0 млн рублей, средства медицинских организаций – 233,8 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года профинансированы расходы в сумме 301,5 млн рублей. Кассовое исполнение составило 206,6 млн рублей, или 68,5 % от объема финансирования и 38,6 % от годовых назначений (535,3 млн рублей).

Заключены 7 контрактов, или 100 % от плана на сумму 301,5 млн рублей (из них 1 контракт в 2021 году на сумму 124,67 млн рублей и 6 контрактов в 2022 году на сумму 176,8 млн рублей), в том числе:

- контракт на поставку коммутатора на сумму 2,3 млн рублей;
- контракт от 15.08.2022 г. № [2056204455022000637](#) на оказание услуг по передаче прав на специализированное программное обеспечение и выполнение работ по его внедрению в целях модернизации Регионального фрагмента ЕГИСЗ Республики Дагестан на 2022 г. на сумму 131,2 млн рублей;
- контракт от 29.09.2022 г. № [2056204455022000773](#) на оказание услуг по приведению информационных систем в соответствие требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты информации для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан – 3,9 млн рублей;
- контракт от 14.07.2022 г. № [0103200008422001863](#) на поставку модуля для расширения системы хранения данных (Аэродиск Восток Э12) на сумму 15,0 млн рублей, исполнен.

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 124,6 млн рублей (за счет федерального бюджета, законтрактованы), образовавшиеся в связи с необеспечением своевременного выполнения по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» в рамках государственного контракта [№ 0103200008421002253](#) от 30 сентября 2021 года, заключенного между ООО «Национальный центр информатизации» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

С целью приемки работ в рамках указанного государственного контракта в период с 9 по 10 декабря 2021 года, с 7 по 8 февраля 2022 года, 1 апреля 2022 года и 3 августа 2022 года проводились совместные демонстрационные испытания выполненных работ представителями исполнителя государственного контракта и приемочной комиссии Министерства здравоохранения Республики Дагестан. По итогам проведения испытаний, работы по 9 этапам из запланированных 13 этапов признаны выполненными в полном объеме в соответствии с техническим заданием и программами и методиками испытаний. По выполненным 9 этапам произведена оплата на сумму 86,8 млн рублей, или 69,6 % от объема неосвоенных остатков 2021 года (124,67 млн рублей). Общая сумма не выполненных работ составляет 37,8 млн рублей.

Средства медицинских организаций в сумме 233,8 млн рублей, предусмотренные на финансирование услуг по комплексному техническому сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД», не освоены.

В 2022 году на территории Республики Дагестан внедрены и функционируют услуги по дистанционной записи к врачу, в том числе: портал Госуслуг, портал Медуслуг, мобильное приложение «К врачу», колл-центры поликлиник. Всего за 2022 года осуществлено 4 278 169 записей к врачу, из них 3 039 873 дистанционным способом (наиболее популярны колл-центр и инфомат).

Медицинскими организациями Республики Дагестан с целью развития электронного медицинского документооборота, а также для предоставления доступа к электронным медицинским документам в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» сформировано 18 623 тыс. структурированных электронных медицинских документов из них 8 748 тыс. протоколов осмотра, 5 010 тыс. амбулаторных эпикризов, 327 тыс. стационарных эпикризов, 2 млн 403 тыс. протоколов по параклиническим услугам и 684 тыс. направлений на консультацию, госпитализацию и обследование.

В централизованных подсистемах по профилям оказания медицинской помощи «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», «Профилактическая медицина» для передачи медицинской информации и сведений в вертикально-интегрированные медицинские информационные системы Минздрава России сформировано 1 494 189 записей по профилю «Акушерство и гинекология, неонатология»,

3 423 650 записей по профилю «Онкология», 925 052 записей по профилю «Сердечно-сосудистые заболевания» и 715 692 записей по профилю «Профилактическая медицина».

По данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан, все медицинские организации Республики Дагестан обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Кроме этого, обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены все территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)

В Республике Дагестан функционирует централизованная подсистема «Телемедицинские консультации» ГИС в сфере здравоохранения, к которой подключены все медицинские организации Республики Дагестан 2-го и 3-го уровней.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тысяч человек	159	414	260
2	Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Дагестан, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ (ТВСП)	474	662	140
3	Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде (ТВСП)	343	343	100
4	Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде (ФАП и ФП)	380	986	259
5	Доля государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу	67	79	118
6	Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской	50	50	100

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
	помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации			
7	Доля отделений государственных медицинских организаций Республики Дагестан, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Республики Дагестан	4	4	100
8	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	359	454	126
9	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	1005	1005	100
10	Доля аптечных организаций Республики Дагестан, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключённых к централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Дагестан	85	85	100
11	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, возрастающий	402	402	100
12	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Дагестан	438	483	110,3
13	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, подключённые к сети Интернет, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Дагестан	1005	1005	100
14	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Дагестан	370	641	173
15	Доля ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Дагестан	1005	1005	100

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
16	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Дагестан	474	660	139
17	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Дагестан	1005	1005	100
18	Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования»	134	349	260
19	Доля государственных медицинских организаций Республики Дагестан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Республики Дагестан	154	641	416
20	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Республики Дагестан	79	265	335
21	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, возрастающий	200	603	302
22	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Республики Дагестан, возрастающий	401	494	123
23	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Республики Дагестан	69	599	868
24	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме)	1005	1005	100

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
	«Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Республики Дагестан, возрастающий			
25	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Республики Дагестан	69	429	622
26	Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, возрастающий	986	986	100
27	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключённых к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС	1005	1005	100
28	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»	474	662	140
29	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта»	380	986	259
30	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Дагестан, соответствующим требованиям Минздрава России	474	662	140
31	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Дагестан, соответствующим требованиям Минздрава России	1005	1005	100
32	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	100	100	100
33	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастающий	48	60	124
34	Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ	380	326	86

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
35	Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Республики Дагестан	34 937	36 195	103,6
36	Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Республики Дагестан	16632	16633	100
37	Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан (ТВСП)	15 627	15 647	100,1
38	Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан (ФАП и ФП)	986	986	100
39	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, возрастающий	36	83	230
40	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, возрастающий	66	79,9	121
41	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, возрастающий, процент	100	100	100

По состоянию на 1 января 2023 года из 42 целевых показателей регионального проекта обеспечено достижение плановых значений по 40 показателям. По 2 целевым показателям плановые значения на 2022 год не определены, однако приведены фактические значения по достижению показателей.

В 2022 году принятые меры не позволили обеспечить завершение плановых мероприятий, обеспеченных финансированием, однако выполнены плановые значения по всем 40 целевым показателям регионального проекта.

Указанное свидетельствует о том, что мероприятия регионального проекта не увязаны с достижением плановых значений по целевым показателям.



3.7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (в 2022 году – до 630 тыс. долларов США).

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

Заключение контрактов не предусмотрено.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

В 2022 году фактический объем экспорта медицинских услуг составил 2,06 млн долларов США в год, или 326,5 % от планового значения (0,63 млн долларов США).

Количество пролеченных иностранных граждан составило 32,0 тыс. человек, или 251,0 % от планового значения на 2022 год (12,75 тыс. человек).

С учетом фактических значений целевых показателей следует отметить, о занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.

За оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе за 2022 год поступление средств составило 132,4 млн рублей.

Выполнение целевого показателя (индикатора) мероприятия регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1.	Экспорт медицинских услуг	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	12,75	32,03	251,5
2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	0,63	2,06	326,5



3.8. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан»

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» было предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

– приобретение 91 единицы автотранспорта для медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек – 87,0 млн рублей;

– оснащение и переоснащение медицинским оборудованием (379 единиц) – 203,6 млн рублей;

– капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) – 157,2 млн рублей;

– приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (8 объектов) – 709,6 млн рублей;

– реконструкция 5 объектов здравоохранения (участковые больницы (УБ), внутренние амбулатории (ВА), фельдшерские пункты – 50,5 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 1 565,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 1 530,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 35,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 398,2 млн рублей, или 89,3 % от объема финансирования (1 565,9 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта заключено 111 контрактов, или 100 % от годового объема на сумму 1 520,6 млн рублей (из них 5 контрактов 2021 года на сумму 336,1 млн рублей, 102 контракта 2022 года на сумму 1 185 млн рублей), в том числе:

1) По оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 30 контрактов на сумму 205,24 млн рублей на приобретение 379 единиц оборудования (в том числе: 2 контракта 2021 года на сумму 2,35 млн рублей и 28 контрактов на поставку 379 единиц оборудования на общую сумму 201,7 млн рублей). Поставлено и введено в эксплуатацию 379 единиц медицинского оборудования.

2) В целях приобретения автотранспорта для медицинских организаций в количестве 91 единицы («Лада Нива» – 30 ед, «Лада Гранта» – 51 ед, «УАЗ» –

10 ед.) заключен 1 контракт на сумму 87,03 млн рублей. Поставлена 91 единица автотранспорта.

3) По капитальному ремонту 60 зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на общую сумму 152,0 млн рублей. Экономия по результатам торгов составила 3,8 млн рублей.

Уровень готовности 60 объектов представлен следующим образом: по 56 объектам – работы завершены; по 4 объектам уровень строительной готовности составляет от 40 до 95 %.

4) По реконструкции (ее завершению) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 5 контрактов на общую сумму 49,9 млн рублей.

По 5 объектам быстровозводимых модульных конструкций работы завершены, уровень готовности составляет 100 %: врачебная амбулатория ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с. Верхний Дженгутай; врачебная амбулатория ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», с. Калининаул; врачебная амбулатория ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», с. Харбук; ГБУ РД «Поликлиника №7» г. Махачкала; ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», ФАП в с. Чиркей.

5) По строительству и монтажу быстровозводимых модульных конструкций заключено 15 контрактов на общую сумму 1 027,6 млн рублей (из них 7 контрактов 2021 года на сумму 333,7 млн рублей и 8 контрактов 2022 года на общую сумму 694,0 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года из 8 запланированных объектов по 4 объектам работы завершены (3 ФАП и 1 ВА).

По поликлинике ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ», ул. Буйнакского (60 %), ФАП ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», в с. Гоор-Хиндах (20 %) работы не завершены в связи с поздним доведением лимитов и заключением контрактов.

По ГБУ РД «Поликлиника № 3» г. Махачкала (95 %), ГБУ РД «Поликлиника № 8» г. Махачкала (75 %) в связи выделением меньшей площади земельного участка, проводилась корректировка ПСД и скорректирована этажность здания. Кроме того, производителем блочно-модульной конструкций, работы не завершены в установленные сроки.

Мероприятия, обеспеченные финансированием по региональному проекту не выполнены в полном объеме (89,3 %). Однако, согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» на 1 января 2023 года обеспечено достижение плановых значений по всем 4 целевым показателям регионального проекта. Указанное свидетельствует о том, что мероприятия регионального проекта не взаимосвязаны с целевыми показателями реализации регионального проекта.

**Перечень объектов здравоохранения по региональному проекту
«Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».**

№	Медицинские организации	Объект ⁴	Стоимость контракта	Профинансировано	Освоено	Строит. готовность	План ввода
1	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», в с. Верхний Дженгутай	ВА	2,76	2,68	2,39	100 %	2022
2	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», в с. Чиркей	УБ	40,0	40,0	40,0	100 %	2022
3	ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», в с. Харбук	ВА	3,8	3,8	3,8	100 %	2022
4	ГБУ РД «Поликлиника № 7», по ул. Нефтекачка	ФАП	0,67	0,58	0,58	100 %	2022
5	ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», в с. Калининаул,	ВА	3,25	3,08	3,08	100 %	2022
6	ГБУ РД «Дербентская ЦГБ», г. Дербент, ул. Цветочная, д. 6	УБ	2,85	2,85	2,85	100 %	2022
7	ГБУ РД «Дербентская ЦГБ», г. Дербент, ул. Ц. Агасиева, 12	УБ	1,08	1,08	1,08	100 %	2022
8	ГБУ РД «Поликлиника № 9», г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 6	УБ	8,19	6,55	6,55	100 %	2022
9	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», в с. Акуша	УБ	16,41	15,89	15,89	100 %	2022
10	ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ», в с. Фий	ВА	3,09	2,55	2,55	100 %	2022
11	ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ», в с. Кака	ВА	5,18	5,18	2,57	100 %	2022
12	ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ», в с. Гдынк	ФП	0,86	0,82	0,82	100 %	2022
13	ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ, им. З.Ш. Магомаевой», в с. Тасута	ФП	3,82	2,33	2,33	100 %	2022
14	ГБУ РД «Гергебильская ЦРБ», в с. Дарада	ФП	1,67	1,67	1,67	100 %	2022
15	ГБУ РД «Гунибская ЦРБ», в с. Тлогоб	ФП	1,87	1,80	1,80	100 %	2022
16	ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», в с. Дибгаши	ВА	4,97	4,82	4,82	100 %	2022
17	ГБУ РД «Каякентская ЦРБ», в с. Башлыкент	ВА	5,0	4,90	4,90	100 %	2022
18	ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ», в с. Учкент	ВА	3,83	3,83	3,83	100 %	2022
19	ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ», в с. Темиргое	ФАП	4,97	4,87	4,87	100 %	2022
20	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», в с. Кувказ	ФП	1,18	0,74	0,74	100 %	2022
21	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», в с. Квардал	ФП	0,21	0,21	0,21	100 %	2022
22	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», в с. Хюре-хюр	ФП	0,59	0,59	0,59	100 %	2022
23	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», в с. Арабляр	ФП	0,26	0,26	0,26	100 %	2022
24	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», в с. Хпедж	ФП	0,27	0,27	0,27	100 %	2022

⁴ Условные обозначений: ВА – внутренняя амбулатория, УБ – участковая больница, ФАП – фельдшерско-акушерский пункт, ФП – фельдшерский пункт,

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Медицинские организации	Объект ⁴	Стоимость контракта	Профинансировано	Освоено	Строит. готовность	План ввода
25	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», в с. Укуз	ФП	0,16	0,16	0,16	100 %	2022
26	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», в с. Ашакент	ФП	0,21	0,21	0,21	100 %	2022
27	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», в с. Гельхен	ФП	7,65	6,14	6,14	100 %	2022
28	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», в с. Мусультемахи	ФАП	1,49	1,49	1,49	100 %	2022
29	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», в с. Охли	ФАП	2,20	2,1	2,1	100 %	2022
30	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», в с. Кутиша	ФАП	2,50	2,50	2,24	100 %	2022
31	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», в с. Магарамкент, ул. Пролетарская, 19	УБ	1,93	1,93	1,93	100 %	2022
32	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», с. Магарамкент, ул. Буйнакского, 1	УБ	2,55	2,55	2,55	100 %	2022
33	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Н.М. Мирзоева», в с. Чаравали	ФАП	0,66	0,66	0,66	100 %	2022
34	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», в с. Цудик	ФАП	1,91	1,91	1,91	100 %	2022
35	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», в с. Амсар	ФП	0,8	0,8	0,8	100 %	2022
36	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», в с. Куфа	ФП	1,6	1,6	0,79	100 %	2022
37	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», в с. Курдул	ФП	1,78	1,78	0,66	100 %	2022
38	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», в с. Кала	ФП	2,65	2,64	2,50	100 %	2022
39	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», в с. Миглакасиахи	ФАП	4,89	4,89	4,89	100 %	2022
40	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», в с. Хабкаймахи	ФАП	2,07	2,07	2,07	100 %	2022
41	ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», в с. Вышеталовский	ФП	3,43	3,43	3,43	100 %	2022
42	ГБУ РД «Тляртинская ЦРБ», с. Тлянада	ВА	0,69	0,69	0,65	100 %	2022
43	ГБУ РД «Тляртинская ЦРБ», в с. Чорода	ФАП	2,27	2,05	2,05	100 %	2022
44	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Темираул, ул. Победы	ВА	1,86	1,86	1,86	100 %	2022
45	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Кемсиюрт, ул. Главная 1	ФАП	1,1	1,1	1,1	100 %	2022
46	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», в с. Умашаул	ФАП	2,65	1,82	1,82	100 %	2022
47	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», в с. Эндирей	ФАП	0,99	0,99	0,99	100 %	2022
48	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», в с. Чагаротар	ФАП	1,53	1,53	1,53	100 %	2022
49	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», в с. Малый Гоцатль	ФП	1,07	1,02	1,02	100 %	2022
50	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», в с. Хунзах	ФАП	1,69	1,69	1,69	100 %	2022

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Медицинские организации	Объект ⁴	Стоимость контракта	Профинансировано	Освоено	Строит. готовность	План ввода
51	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», в с. Тадколо	ФП	0,78	0,78	0,78	100 %	2022
52	ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», в с. Сантлада	ФП	2,8	2,8	2,8	100 %	2022
53	ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», в с. Нижнее Гаквари	ФП	1,46	1,46	1,46	100 %	2022
54	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ», в с. Тлярощ,	ФАП	3,97	3,58	3,58	100 %	2022
55	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ», в с. Гунух	ФП	1,1	0,77	0,77	100 %	2022
56	ГБУ РД «Поликлиника № 6»	УБ	1,42	1,35	1,35	100 %	2022
57	ГБУ РД «ЦРБ Бежтинского участка Цунтинского района», с. Тлядал	ФАП	2,27	2,27	2,13	100 %	2022
58	ГБУ РД «Дербентская ЦГБ», г. Дербент, ул. Цветочная, д. 6	П	1,82	1,82	1,82	100 %	2022
59	ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», в с. Китлярта	УБ	4,64	4,64	4,64	100 %	2022
60	ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», в с. Хупри	ФП	1,38	1,38	1,38	100 %	2022
61	ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», в с. Хутрах	ФП	1,31	1,31	1,31	100 %	2022
62	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», в с. Кавкамахи	ФАП	9,04	8,14	8,14	100 %	2022
63	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», в с. Гумра	ФАП	9,04	8,18	8,18	100 %	2022
64	ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ», в с. Карчаг	ВА	16,34	15,46	15,46	100 %	2022
65	ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», в с. Кузнецовская	ФАП	9,04	7,66	7,66	100 %	2022
67	ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», в с. Иммунный	ФП	3,63	3,63	2,43	97 %	2022
66	ГБУ РД «Детская поликлиника №3», г. Махачкала, пр. Шамиля, д. 8 (филиал поликлиники пос. Сепараторов)	УБ	320,04	320,04	282,71	95 %	2022
68	ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» с. Терекли-Мектеб, ул. Станкевич,	УБ	6,04	6,04	4,46	80 %	2022
69	ГБУ РД ГБУ РД «Поликлиника № 8», г. Махачкала, ул. А. Юсупова, д. 14	УБ	320,04	312,58	275,99	75 %	2022
70	ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», в с. Александро-Невское	ФАП	3,97	3,97	2,86	90 %	2022
71	ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ», г. Южно-Сухокумск ул. Буйнакского, д. 10	УБ	16,34	15,11	12,85	60 %	2022
72	ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», в с. Цумада-Урух	ФП	1,86	1,82	0,0	60 %	2022
73	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», в с. Гоор-Хиндах	ФАП	9,04	6,8	1,36	20 %	2022
	Всего	73	916,5	892,55	799,81		



4. Национальный проект «Образование»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.

Министр образования
и науки Республики
Дагестан



Сулейманов А.А.

Министр строительства,
архитектуры и ЖКХ
Республики Дагестан



Саидов К. Р.

Министр по делам
молодежи Республики
Дагестан



Султанов Г.Р.

Министр экономики и
территориального
развития Республики
Дагестан


Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основными целями реализации национального проекта «Образование» являются:

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования (2030 год);
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью до 15 процентов.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» реализуются 7 региональных проектов.

- 1) «Современная школа»;
- 2) «Успех каждого ребенка»;
- 3) «Цифровая образовательная среда»;
- 4) «Молодые профессионалы»;
- 5) «Социальная активность»;
- 6) «Патриотическое воспитание граждан»;
- 7) «Молодежь России».

Финансирование национального проекта «Образование» в 2022 году

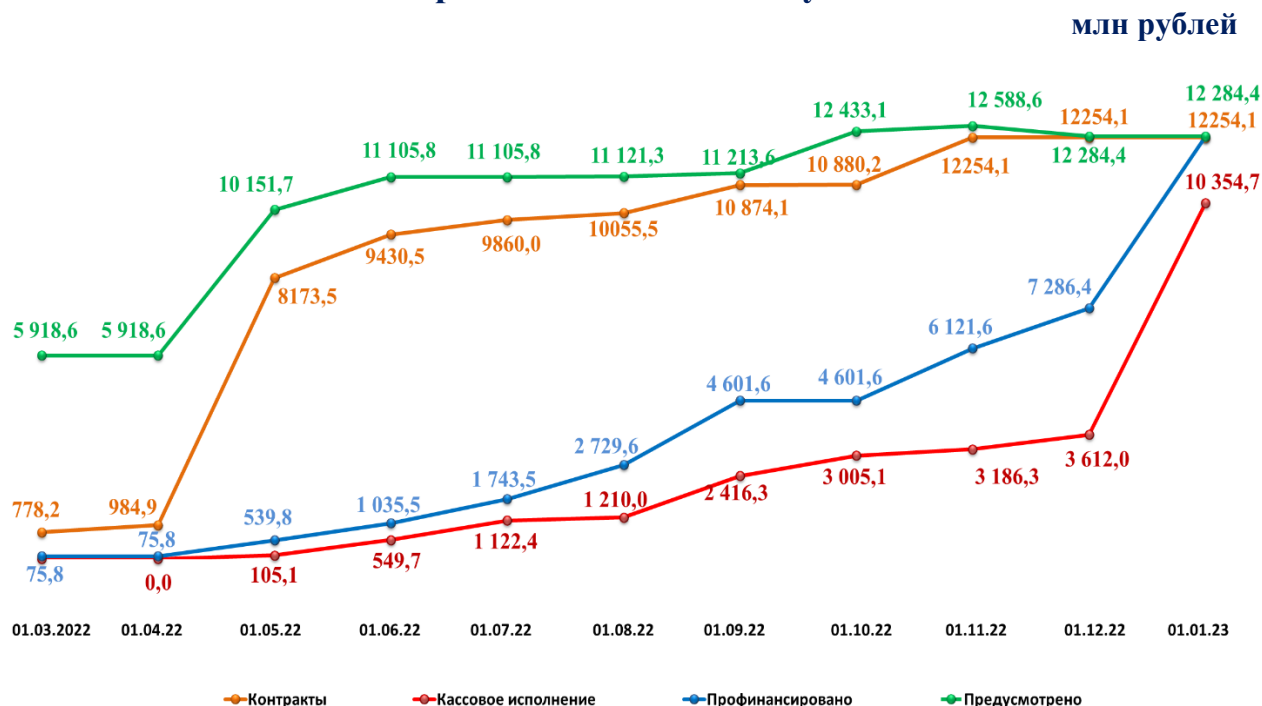

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено 12 284,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 11 366,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 918,1 млн рублей).

В 2022 году профинансировано 12 284,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 10 354,7 млн рублей, или 84,3 % от годовых назначений.

Заключено 331 контракт, или 100 % от плана (331 контракт) на общую сумму 12 254,06 млн рублей.

Исполнителями региональных проектов нацпроекта являются:

– Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный исполнитель) – 1 091,0 млн рублей. Кассовое освоение составляет 1 088,4 млн руб. или 99,8 % от годовых назначений.

– Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 10 012,88 млн рублей. Кассовое освоение составляет 8 189,73 млн рублей, или 81,8 % от годовых назначений.

– Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан – 1 171,6 млн рублей. Кассовое освоение составляет 1 067,6 млн рублей, или 91,1 % от годовых назначений.

– Министерство по делам молодежи Республики Дагестан – 8,98 млн рублей. Кассовое освоение составило 8,98 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

В 2022 году из 7 региональных проектов финансирование предусмотрено по 6 проектам.

Региональные проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено		Остатки средств на 01.01.2023г.	
			Сумма	%	Сумма	%
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	12 284,4	12 284,4	10 354,7	84,3	1 929,7	15,7
1. «Современная школа»	11 533,3	11 533,3	9 605,9	83,3	1927,4	16,7
2. «Успех каждого ребенка»	276,4	276,4	276,4	100,0	0,0	0,0
3. «Патриотическое воспитание»	138,9	138,9	136,7	98,5	2,2	1,5
4. «Цифровая образовательная среда»	264,7	264,7	264,7	100,0	0,0	0,0
5. «Молодые профессионалы»	8,98	8,98	8,98	100,0	0,0	0,0
6. «Социальная активность»	6,09	6,09	6,09	100,0	0,0	0,0



4.1. Региональный проект «Современная школа»

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» запланировано обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, а также возможность получения профессионального развития и обучения для педагогических работников, в рамках следующих мероприятий:

- строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 ученических мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест;
- создание 171 центров образования «Точка роста»;
- обновление материально-технической базы и содержания предмета «Технология»;
- создание детского технопарка «Кванториум»;
- создание и функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;
- предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты по программе «Земский учитель».

Реализацию регионального проекта «Современная школа» осуществляют:

- Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный исполнитель) – 348,9 млн рублей;
- Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 10 012,88 млн рублей;
- Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (МО Администрация Городской округ «город Дербент») – 1 171,6 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 11 533,3 млн рублей, или 100 % годовых назначений (средства федерального бюджета – 10 622,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 910,56 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 9 605,9 млн рублей, или 83,3 % от годовых назначений.

Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 1 927,4 млн рублей, или 16,7 % от объема годовых назначений (средства федерального бюджета – 1 758,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 168,5 млн рублей).

Заключено 170 контрактов, или 100 % от плана на сумму 11 533,3 млн рублей.

1. Строительство общеобразовательных организаций.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» запланировано строительство **57** общеобразовательных организации на 25 706 ученических места⁵, из них по состоянию на 1 января 2023 года завершены и осуществляют образовательную деятельность **10 школ на 3 350 ученических мест, в том числе:**

– 6 школ на 1 744 уч. места (введены в 2020 году): в с. Акбулатюрт на 120 уч. мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч. мест, в с. Кандаураул на 300 уч. мест, в с. Эндирей, блок-пристройка к МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» на 300 уч. мест, МКОУ «Теречная СОШ» на 300 уч. мест в с. Теречное Хасавюртовского района, блок – пристройка к МБОУ «СОШ № 26» на 604 уч. места в г. Махачкала);

– 4 школы на 1 606 уч. места (введены в 2021 году): в с. Луткун Ахтынского района на 400 уч. мест, в с. Новокостек на 400 уч. мест, в с. Эндирей Хасавюртовского района на 502 уч. места, школа в с. Оружба Магарамкентского района на 304 уч. мест).

В 2022 году было запланировано строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 ученических места.

Министерством образования и науки Республики Дагестан по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации в связи с наличием рисков начало строительства и освоения средств федерального бюджета была осуществлена замена следующих объектов:

– объект «Школа на 420 уч. мест в г. Избербаш на объект «Школа на 420 уч. мест с. Новосаситли Хасавюртовского района»;

– объекты «Школа № 14 в г. Хасавюрт на 1 150 уч. мест и «Пристройка на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт» на 3 объекта общей мощностью 1 424 уч. мест, строительство которых было начато в рамках Республиканской инвестиционной программы на объекты: «Школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского район», «Школа на 320 уч. мест в с. Охли Левашинского района, «Школа на 604 уч. мест в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1».

Таким образом, количество школ, запланированных к строительству (начало строительства) в 2022 году, составило **46 школ на 21 736 ученических места, в том числе:**

– 26 объектов на 13 852 уч. места с вводом в эксплуатацию в 2022 году (в том числе: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС») – 12 школ на 7 104 ученических мест, местные подрядчики – 14 школ на 6 748 уч. места);

– 20 объектов на 7 884 уч. места с вводом в эксплуатацию в 2023 году.

1. По состоянию на 1 января 2023 года, из 26 объектов на 13 852 уч. мест с вводом в эксплуатацию в 2022 году:

Завершено строительство 4 школ на 2 450 ученических мест (школа на 502 уч. мест в МКР «Загородный» г. Махачкалы; школа на 120 уч. мест в

⁵Нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

с. Кванада Цумадинского района; школа на 1 224 уч. места в п. Семендер г. Махачкалы; школа на 604 уч. мест в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1⁶), по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Начало фактического функционирования объектов планируется с 1 сентября 2023 года.

2. Не завершено строительство 22 школ на 11 402 уч. мест, в том числе:

– ФГУП «ГУСС» – 9 школ на 5 258 уч. мест;
– Администрация ГО «город Дербент» – 1 школа на 804 уч. места;
– Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (далее – ГКУ РД «ДГЕЗЗ» – 12 школ на 5 340 уч. мест.

В связи с наличием рисков начало строительства и освоения средств федерального бюджета, в соответствии с поручением протокола совещания у Директора Департамента просвещения высшего образования и науки Правительства РФ Синюгиной Т.Ю. от 17 октября 2022 г. № П8-75487, срок ввода указанных объектов в эксплуатацию перенесен на 2023 год с вводом в эксплуатацию 10 школ на 3 350 уч. мест 1 сентября 2023 года.

В 2022 году строительство объектов в рамках национального проекта «Образование» осуществляют 3 заказчика.

2.1. ФГУП «Главное управление специального строительства» (9 школ на 5 258 уч. мест).

По состоянию на 1 января 2023 года из общего количества школ, предусмотренных к строительству ФГУП «ГУСС» в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» (16 школ на 8 706 уч. мест), *завершено строительство 7 школ на 3 488 ученических мест, в том числе в 2022 году завершено строительство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 3 школам на 1 846 уч. мест (школа на 502 уч. мест в МКР «Загородный» г. Махачкалы; школа на 120 уч. мест в с. Кванада Цумадинского района; школа на 1 224 уч. места в п. Семендер г. Махачкалы).* Начало фактического функционирования объектов планируется с 1 сентября 2023 года.

По 9 незавершенным школам, завершение которых предусматривалось в 2022 году, по состоянию на 1 января 2023 года уровень строительной готовности составил от 27 % до 87 %, в том числе:

- по 7 школам на 3 954 ученических мест – от 60 % до 87 %;
- по 2 школам на 1 304 ученических места – от 27 % до 51 %.

В связи с наличием рисков начало строительства и освоения средств федерального бюджета, в соответствии с поручением протокола совещания у Директора Департамента просвещения высшего образования и науки Правительства РФ Синюгиной Т.Ю. от 17 октября 2022 г. № П8-75487, срок ввода указанных 9 объектов в эксплуатацию перенесен на 2023 год.

⁶ Школа на 604 уч. мест в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1 (местные подрядчики), остальные 3 школы – ФГУП «ГУСС»).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Таблица № 1. Перечень объектов общего образования, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (генподрядчик - ФГУП «ГУСС»)

млн рублей

	Объекты образования	Кол-во мест	Стоимость контракта	Профинансировано	Освоено	Год завершения	% строит. готовности
1	МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» (блок-пристройка) в с.Эндирей Хасавюртовского района	300	281,45	0,10	0,23		Получена лицензия
2	Школа в с. Новокостек Хасавюртовского района	400	441,72	21,50	9,99		Получена лицензия
3	Школа в с. Эндирей №1 Хасавюртовского района	502	430,34	10,98	1,00		Получена лицензия
4	Школа в с. Луткун Ахтынского района	400	382,96	78,19	31,93		Получена лицензия
5	СОШ № 41 в пос. Загородный г. Махачкалы	502	374,94	95,86	75,22	2022	Разрешение на ввод
6	Школа в с.Кванада Цумадинского района	120	160,56	112,63	59,59	2022	Разрешение на ввод
7	СОШ № 58 в пос. Семендер г. Махачкалы	1224	1 017,6	688,22	540,97	2022	Разрешение на ввод
	Итого по завершённым объектам	3 448	2 071,97	1 007,5	718,93		
8	Школа в с.Хамавюрт Хасавюртовского района	502	346,63	189,97	140,65	2022	91,6 % (перенесена на 2023 г.)
9	МБОУ «СОШ № 27» (блок-пристройка) в г. Махачкале	604	495,09	231,71	179,61	2022	86,3 % (перенесена на 2023 г.)
10	Школа в с. Гигатли Цумадинского района	120	185,24	161,15	91,63	2022	81,6 % (перенесена на 2023 г.)
11	Школа в с.Авадан Докузпаринского района	400	419,24	346,5	225,46	2022	77,6 % (перенесена на 2023 г.)
12	Школа в г. Каспийске	1224	984,75	613,28	402,81	2022	73 % (перенесена на 2023 г.)
13	Школа в с. Солнечное Хасавюртовского района	804	758,92	256,62	222,81	2022	71 % (перенесена на 2023 г.)
14	СОШ № 2 в г. Каспийске	300	262,72	162,36	132,00	2022	64,2 % (перенесена на 2023 г.)
15	Школа в МКР «Ипподром» г. Махачкалы	1224	985,25	832,84	576,67	2022	63 % (перенесена на 2023 г.)
16	Школа в с. Хебатли Цунтинского района	80	125,56	65,54	64,13	2022	27 % (перенесена на 2023 г.)
	Итого по незавершённым объектам	5 258	4 563,4	2 860,0	2 035,8		
	Итого	8 706	6 635,4	3 867,5	2 754,7		

2.2. Администрация МО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) – школа на 804 места в городе Дербент (переходящий объект 2021 года). В 2022 году на строительство школы профинансировано 881,15 млн рублей. Кассовое исполнение составило 777,2 млн рублей, или 88,2 % от объема финансирования. Уровень строительной готовности составил 60,0 %. Срок ввода объекта перенесен на 2023 год.

2.3. ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» – 12 школ на 5 340 уч. мест (информация приведена в таблице № 2).

По состоянию на 1 января 2023 года по 12 школам, завершение которых планировалось в 2022 году, уровень строительной готовности составил от 0 % до 19 %.

По 11 школам на 5 504 ученических мест с началом строительства в 2022 году, по состоянию на 1 января 2023 года заключены государственные контракты, получены положительные заключения госэкспертизы и начаты подготовительные работы.

3. По 20 школам на 7 884 уч. мест, начало строительства которых было запланировано в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году, по состоянию на 1 января 2023 года ситуация представлена следующим образом.

3.1. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 г. № 206-р строительство **19 школ на 7 280 уч. мест** осуществляют 3 государственных заказчика и 10 подрядчиков⁷, в том числе:

3.1.1. ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» – 17 объектов на 5 256 ученических мест.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 29.12.2021 N 91 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на начало строительства 17 школ на 5 256 ученических мест были предусмотрены средства в сумме 1 275,65 млн рублей.

ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» заключено 17⁸ контрактов на сумму 4 836,04 тыс. рублей (в том числе на 2022 год – 1 275,65 млн рублей, на 2023 год – 3 560,4 млн рублей). Контракт по каждой школе предусматривает выполнение инженерных

⁷Перечень организаций, определенных единственными подрядчиками по проектированию и строительству объектов капитального строительства, предусмотренных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан».

⁸ Информация приведена в Таблице № 2

изысканий, подготовку проектной документации, а также выполнение работ по строительству объекта и поставке оборудования.

В 2022 году на начало строительства произведено финансирование в сумме 1 275,65 млн рублей, или 100 % от назначений (федеральный бюджет – 1 262,92 млн рублей и республиканский бюджет – 12,7 млн рублей) при кассовом исполнении в сумме 1 275,65 млн рублей, или 100 % от финансирования.

3.1.2. Администрация МО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) – 1 школа на 1 224 места в г. Дербент.

Администрацией МО «город Дербент» заключен контракт от 1 июня 2022 года на сумму 1 075,5 млн рублей (в том числе на 2022 год – 290,4 млн рублей, на 2023 год 785,1 млн рублей (срок получения положительного заключения государственной экспертизы – 30 ноября 2022 года, срок ввода в эксплуатацию – 30 ноября 2023 г). Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 290,44 млн рублей. На официальном сайте ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ (<https://egrz.ru>) по состоянию на 1 января 2023 года отсутствовала информация о получении положительной оценки государственной экспертизы.

3.1.3. ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (заказчик) осуществляет строительство школы на 800 ученических места в г. Кизляре. ООО «СК «Моно-строй». Заключен контракт на разработку ПСД и ведение строительных работ. Получено положительное заключение госэкспертизы. Начаты строительно-монтажные работы.

3.2 ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (заказчик) осуществляет строительство школы в с. Кироваул, Кизилюртовский район на 604 уч. мест. Заключен контракт на разработку ПСД и ведение строительных работ. Получено положительное заключение госэкспертизы. В 2022 году на строительство школы профинансировано 146,8 млн рублей, фактически освоены 146,1 млн рублей, или 99,5 % (с учетом авансирования). Начаты строительно-монтажные работы, уровень строительной готовности – 10,0 %.

По результатам проведенного мониторинга, Счетная палата Республики Дагестан отмечает, что из запланированных к вводу в 2022 году 26 школ на 13 852 ученических мест:

- завершены и введены в эксплуатацию 4 объекта 2 450 уч. места;
- не завершены и перенесены на 2023 год 22 объекта.

По 20 объектам на 7 884 уч. места начало строительства, которых было предусмотрено в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году, начаты

строительные работы по 1 школе на 604 уч. мест в с. Кироваул, Кизилюртовский район (строительная готовность – 10 %)

2) Согласно Закону Республики Дагестан от 29.12.2021 N 91 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятий по строительству объектов общего образования в рамках регионального проекта «Современная школа», в 2022 году было предусмотрено 11 184,5 млн рублей (средства федерального бюджета 10 279,1 млн рублей, республиканского бюджета – 905,3 млн рублей).

По данным Министерства финансов Республики Дагестан на мероприятия по строительству общеобразовательных объектов в 2022 году профинансировано 11 184,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

По состоянию на 1 января 2023 года освоено 9 257,3 млн рублей, или 82,8 % от годовых назначений (средства федерального бюджета 8 520,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 736,8 млн рублей).

Неосвоенный остаток средств составил 1 927,2 млн рублей, или 17,2 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 1 758,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 168,5 млн рублей).

Следует отметить, что большая часть освоенных средств, согласно Постановлению Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года № 137 «Об установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», направлена на авансирование строительства и разработку проектно-сметной документации.

Принятие решения об увеличении финансирования строящихся объектов общего образования в рамках реализации механизма казначейского сопровождения, позволило увеличить объем авансирования подрядных организаций до 9 257,3 млн рублей (82 %), из запланированных 11 184,5 млн рублей.

В 2022 году строительство объектов по национальному проекту осуществляется в рамках 4 мероприятий, в том числе:

1. Мероприятие по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях (2 школы на 908 ученических мест, заказчик – ГКУ РД «Дирекция единого заказчика-застройщик», подрядчики – местные организации).

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством просвещения РФ и Правительством РД от 19 сентября 2022 года № 073-09-2022-524, финансирование на данное мероприятие в 2022 году предусмотрено в сумме 435,24 млн рублей (средства федерального бюджета – 413,48 млн рублей и средства республиканского бюджета – 21,76 млн рублей).

Кроме того, в целях доведения строительства в соответствии с проектно-сметной документацией из республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках Республиканской инвестиционной программы в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 6,98 млн рублей.

В рамках данного мероприятия в 2022 году произведено финансирование в сумме 442,22 млн рублей, или 100 % от предусмотренных средств (средства федерального бюджета – 413,48 млн рублей и средства республиканского бюджета – 28,74 млн рублей). Кассовое исполнение составило 435,24 млн рублей, или 98,4 % от годовых назначений.

2. Мероприятие по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (1 школа в с. Хебатли Цунтинского района на 80 ученических мест), в соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством просвещения РФ и Правительством РД от 18 апреля 2022 года № 073-09-2019-169/8, профинансировано 65,54 млн рублей, или 100 % от предусмотренных расходов (средства федерального бюджета – 64,89 млн рублей и средства республиканского бюджета – 0,65 млн рублей). Кассовое исполнение составило 64,1 млн рублей, или 97,8 % от финансирования.

3. Мероприятие по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (23 школы на 9 692 ученических места) произведено финансирование в сумме 3 850,2 млн рублей, или 100 % от предусмотренных расходов (федеральный бюджет – 3 539,52 млн рублей и республиканский бюджет – 310,68 млн рублей), при кассовом исполнении в сумме 3 556,21 млн рублей, или 92,4 % от финансирования.

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством просвещения РФ и Правительством РД от 28 ноября 2022 года № 073-09-2022-743/6, финансирование на данное мероприятие в 2022 году было предусмотрено 3 392,15 млн рублей (федеральный бюджет – 3 358,23 млн рублей и республиканский бюджет РД – 33,92 млн рублей).

В связи с удорожанием строительства на данное мероприятие предусмотрено финансирование из резервного фонда Правительства РФ в сумме 181,13 млн рублей и с учетом софинансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 2,0 млн рублей общий объем финансирования предусмотрен в сумме 183,13 млн рублей.

Кроме того, в целях доведения строительства в соответствии с проектно-сметной документацией из республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках Республиканской инвестиционной программы в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 274,92 млн рублей.

4. Мероприятие по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года (24 школы на 12 838 ученических мест).

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством просвещения РФ и Правительством РД от 13 декабря 2022 года № 073-09-2022-870/6, финансирование на данное мероприятие в 2022 году предусмотрено в сумме 5 297,93 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 244,95 млн рублей и средства республиканского бюджета – 52,28 млн рублей).

Дополнительно, в связи с удорожанием строительства, на данное мероприятие предусмотрено финансирование из резервного фонда Правительства РФ в сумме 1 016,27 млн рублей и с учетом софинансирования из республиканского бюджета РД в сумме 10,27 млн рублей, общий объем финансирования предусмотрен в сумме 1 026,54 млн рублей.

Кроме того, вне заключенных соглашений в целях доведения строительства в соответствии с проектно-сметной документацией из республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках Республиканской инвестиционной программы в 2022 году было предусмотрено финансирование в сумме 783,09 млн рублей.

В рамках данного мероприятия в 2022 году Министерством финансов Республики Дагестан произведено финансирование в сумме 7 107,56 млн рублей, или 100 % от предусмотренных расходов (средства федерального бюджета – 6 261,23 млн рублей и средства республиканского бюджета – 846,34 млн рублей). Кассовое исполнение составило 5 201,76 млн рублей, или 73,2 % от финансирования.

В дальнейшем согласно дополнительному соглашению от 23.12.2022 № 073-09-2022-870/7, заключенному между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан объем средств, предусмотренных из федерального бюджета в 2022 году на реализацию мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены (1 026,5 млн рублей) был уменьшен на 546,6 млн рублей и составил 479,9 млн рублей.

Однако, в связи с поздним доведением расходных расписаний до Республики Дагестан (26.12.2022 г) соответствующие операции по уменьшению лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования не были произведены Министерством финансов Республики Дагестан. Соответственно по состоянию на 1 января 2023 года лимиты бюджетных обязательств остались в сводной бюджетной росписи неизменными, что не соответствует Соглашению от 23.12.2022 № 073-09-2022-870/7.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Таблица № 2. Перечень объектов образования, запланированных к строительству в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2022 года (местные подрядные организации)

млн рублей

№	Объекты образования	Кол-во мест	Стоимость контракта	Профинансировано	Освоено	% строит. готовность	Год завершения	Примечание
1	Школа в г. Хасавюрт, ул. Победы, 1	604	502,0	399,4	0,0	100,0	2022	Разрешение на ввод
2	Пристройка к зданию школы № 7 в г. Кизилюрт	250	817,5	253,3	278,8	9,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
3	Школа в с. Цяиб - Ичичали, Хасавюртовский район	392	461,27	324,47	534,85	20,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
4	Школа № 22 в г. Махачкале (реконструкция)	250	241,9	255,74	232,89	2,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
5	Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского района (строительство)	700	533,4	544,65	428,27	8,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
6	Школа № 39 в г. Махачкале (реконструкция)	500	417,0	434,55	526,63	0,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
7	Школа в с. Параул Карабудахкентского района (строительство)	400	366,36	366,68	428,27	19,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
8	Школа в п. Шамхал г. Махачкалы	604	425,5	439,06	432,08	0,0	2022	Переносится на 2023 год
9	Школа в с. Красный Восход Кизлярского района	400	328,0	354,16	349,49	5,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
10	Школа в с. Ст. Сивух Хасавюртовского района	604	514,28	533,62	527,28	2,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
11	Школа в п. Шамхал г. Махачкалы	604	425,5	439,06	432,08	0,0	2022	ПСД, перенесена на 2023 год
12	Школа в с. Хурик Табасаранского район	500	491,15	470,53	126,57	20,0	2023	Взамен другим школам
13	Школа в с. Охли Левашинского района	320	174,86	89,19	49,19	46,0	2023	Взамен другим школам
14	Школа в с. Кироваул Кизилюртовского района	604	525,91	146,78	146,11	20,0	2023	ПСД
15	Школа в г. Кизляр	800	696,65	196,25	195,40	36,0	2023	ПСД
	Итого ГКУ РД «ДЕГЗЗ», 15 объектов	7 532	6 921,8	5 247,4	4 687,9			
16	Школа в с. Ашали Ботлихского района	50	50,93	12,24	12,24	0,0	2023	
17	Школа в пос. Ленинкент г. Махачкалы	604	548,64	146,11	146,11	0,0	2023	
18	Школа в пос. Новый Хушет г. Махачкалы	604	548,36	146,11	146,11	0,0	2023	

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объекты образования	Кол-во мест	Стоимость контракта	Профинансировано	Освоено	% строит. готовность	Год завершения	Примечание
19	Школа в МКР «Ветеран» г. Махачкалы	604	548,21	146,11	146,11	0,0	2023	
20	Школа в с. Адапак Карабудахкентского района	220	206,06	53,62	53,62	0,0	2023	
21	Школа в с. Параул Карабудахкентского района	200	186,11	48,78	48,78	0,0	2023	
22	Школа в с. Какамахи Карабудахкентского района	220	205,94	53,62	53,62	0,0	2023	
23	Школа в с. Зеленоморск Карабудахкентского района	120	115,3	29,36	29,36	0,0	2023	
24	Школа в с. Пятилетка Хасавюртовского района	300	277,06	72,91	72,91	0,0	2023	
25	Школа в с. Шагада, Хасавюртовский район	200	186,22	48,78	48,78	0,0	2023	
26	Школа в с. Советское Хасавюртовского района	200	186,25	48,78	48,78	0,0	2023	
27	Школа в с. Байрамаул, Хасавюртовский район	604	548,51	146,11	146,11	0,0	2023	
28	Школа в с.Борагангечув Хасавюртовского района	300	277,16	72,91	72,91	0,0	2023	
29	Школа в с. Сулейбакент Левашинского района	300	277,05	72,91	72,91	0,0	2023	
30	Школа в с. Хахита Левашинского района	200	186,26	48,78	48,78	0,0	2023	
31	Школа в с. Тлох Ботлихского района	450	409,44	108,94	108,94	0,0	2023	
32	Школа в с. Зило Ботлихского района	80	78,4	19,58	19,58	0,0	2023	
	Итого по ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» - 17 объектов	5256	4835,9	1275,7	1275,7			
33	Школа в г. Дербенте (администрация)	1224	1 075,49	290,44	290,4	0,0	2023	
	Всего	14 012	12 833,2	6 813,6	6 254,0	-	-	

2. Создание 171 Центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях.

В целях создания Центров «Точка роста» в 2022 году профинансировано 268,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Освоено 268,1 млн рублей, или 99,5 % от годовых назначений. Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 0,2 млн рублей, или 0,08 % от объема годовых назначений.

Заключено 3 контракта на сумму 268,08 млн рублей (закупка МФУ, ноутбуков и робототехники). Экономия по итогам торгов составила 0,18 млн рублей, которая возвращена в резервный фонд.

Лицензии на право ведения дополнительной образовательной деятельности на 1 января 2023 года получили 169 общеобразовательных организаций, или 99,0 % от планового количества (171 организация).

В сентябре образовательные Центры «Точка роста» официально открыты.

3. Создание детского технопарка «Кванториум» (на базе МБОУ «СОШ № 13» г. Каспийска).

В целях создание детского технопарка «Кванториум» в 2022 году профинансировано и освоено 21,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 9 контрактов по закупке оборудования на общую сумму 21,44 млн рублей. Ремонтные работы помещений учебных кабинетов завершены, осуществлено обновление мебели. Учебное оборудование и средства воспитания поставлены.

Открытие детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 13» г. Каспийска состоялось 13 сентября 2022 года.

4. Обновление материально-технической базы коррекционных школ и содержания предмета «Технология» в двух коррекционных интернатных учреждениях (МБОУ «Аксайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», с. Аксай, Хасавюртовский район, МБОУ «Школа-интернат № 7», г. Дербент) - 15,9 млн рублей.

В целях реализации обновления материально-технической базы 2 коррекционных школ в 2022 году профинансировано 16,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Фактически освоено 16,05 млн рублей, или 99,6 % от годовых назначений (остаток в виде экономии 0,06 млн рублей возвращен в резервный фонд Правительства Российской Федерации).

Заключено 65 контрактов на общую сумму 15,8 млн рублей, в том числе:

– по МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» (с. Аксай, Хасавюртовский район) заключено 46 контракта на сумму 7,93 млн рублей;

– по МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №7» (г. Дербент) заключено 19 контрактов (договоров) на сумму 7,9 млн рублей.

Ремонтные работы помещений, в которых было запланировано создание специализированных кабинетов, а также мастерских, завершены. Учебное оборудование и средства воспитания поставлены в полном объеме.

5. Создание и функционирование Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов. ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов» в 2022 году было запланировано показателя по охвату деятельностью более 6 тысяч педагогических работников.

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ на 1 января 2023 года, составляет 27 812 человек.

По состоянию на 1 января 2023 года доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в

том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, составляет 305 %.

6. Предоставление единовременных компенсационных выплат по программе «Земский учитель».

С 2022 года в рамках регионального проекта реализуются мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 14 декабря 2021 года № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, при замещении которых предоставляются компенсационные выплаты.

В 2022 году трудовые договора заключены с 43 педагогическими работниками.

На реализацию данного мероприятия профинансированы и освоены расходы в сумме 43,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значение показателей		%
			План	Факт	
1	Современная школа	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ	20	61	305,0

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, не выполнены в полном объеме. Однако, обеспечено значительное перевыполнение целевого показателя реализации регионального проекта на 2022 год (на 305 %). Следует отметить, об отсутствии согласованности целевого показателя с мероприятиями, проводимыми в целях реализации регионального проекта «Современная школа».

Приведенные данные о реализации регионального проекта «Современная школа» свидетельствуют о повторении в 2022 году ситуации предыдущих лет, связанной со срывом сроков окончания строительства объектов образования и неосвоением профинансированных бюджетных средств.

Результаты проведенного мониторинга показали, что Министерством строительства Республики Дагестан, ГКУ «Дирекцией единого государственного заказчика-застройщика», ФГУП «ГУСС», Администрация МО ГО «город Дербент», ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» не было обеспечено принятие качественных управленческих решений в целях своевременного освоения выделенных средств и строительства объектов в установленные сроки.

Проведенный анализ показал, что основными причинами длительных сроков проведения мероприятий по разработке проектно-сметной документации в 2022 году являлись: задержка предоставления земельных участков муниципальными образованиями под строительство объектов с соответствующей разрешительной документацией; не проведение исследований пригодности выделенного земельного участка под строительство объектов; отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры в непосредственной близости от выделенного участка под строительство.

Основными причинами низких темпов строительства и принятия выполненных работ продолжают оставаться:

- отсутствие соответствующей материально-технической базы у субподрядчиков;
- недостаточное количество рабочего и инженерно-технического персонала для выполнения строительных работ у субподрядных организаций;
- систематические срывы рабочего графика и низкая организация выполнения строительных работ;
- отсутствие качественного технологического контроля на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;
- низкая исполнительская дисциплина по представлению заказчику актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и отсутствие исполнительно-технической документации.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- обеспечить завершение строительства объектов, незавершенных в 2022 году, и соблюдение нормативных сроков строительства объектов, запланированных в рамках реализации национальных проектов в 2023 году;
- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы по объектам, начало строительства которых было запланировано в 2022 году;
- органам исполнительной власти и муниципальных образований Республики Дагестан уполномоченных по надзору за ходом строительства, и по вводу в эксплуатацию объектов завершеного строительства (муниципалитеты) надлежит обеспечить строгий контроль за ходом строительства и приемки в эксплуатацию завершенных объектов.



4.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» было предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 63,5 %, за счет проведения следующих мероприятий:

- создание в 52 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 48,3 млн рублей;
- создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 228,1 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансировано 276,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета 273,6 млн рублей, республиканского бюджета – 2,8 млн рублей). Фактически освоено 276,3 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений (276,4 млн рублей). Образовавшаяся экономия в сумме 0,01 млн рублей направлена в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

В целях реализации регионального проекта заключены 26 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 276,4 млн рублей по следующим мероприятиям:

- приобретение открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) для 41 школы и установка в 11 школах футбольных мини-полей – 3 контракта на сумму 48,3 млн рублей. Завершена установка 41 открытого плоскостного спортивного сооружения (воркауты) и 11 футбольных мини-полей;
- создание ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Альтаир» – 23 контракта на сумму 228,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 228,1 млн рублей. 30 августа 2022 года в Махачкале прошло официальное открытие ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Альтаир».

В ходе реализации регионального проекта проведены следующие мероприятия:

1) Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.01.2022 № 2 «О создании государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» утвержден перечень мероприятий по созданию ГАОУ ДО РД «Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», определены функции и полномочия учредителя, основной вид деятельности, расходы на содержание.

В целях реализации мероприятия заключены 24 контракта на сумму 228,1 млн рублей.

Профинансировано и освоено 228,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

30 августа 2022 года в Махачкале прошло официальное открытие ГАУ ДО РД «Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»».

2) Создание условий для занятия физкультурой и спортом в 52 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (48,32 млн рублей).

В рамках реализации Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 19 декабря 2021 года № 073-09-2022-122 для 52 сельских школ было запланировано приобретение открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) (41 школа) и установка 11 футбольных мини-полей (11 школ).

Заключены 3 контракта на сумму 48,31 млн рублей.

Профинансировано 48,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение – 48,2 млн рублей, или 99,6% от объема финансирования средств. По итогам закупочной кампании образовавшаяся экономия в сумме 0,01 млн рублей направлена в резервный фонд Правительства РФ.

По состоянию на 1 января 2023 года завершена установка 41 открытого плоскостного спортивного сооружения (воркауты) и 11 футбольных мини-полей.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий, процент	63,5	64,16	101
2	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, возрастающий	1	1	100
3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий, процент	30	73,89	246,3
4	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий, процент	3,9	6,5	166,7

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по всем 4 целевым показателям регионального проекта.



4.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, до 16,25 %:

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в размере 264,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 262,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,7 млн рублей).

Профинансированы и освоены средства в сумме 264,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 42 контракта по закупке оборудования, или 100 % от плана на общую сумму 264,7 млн рублей.

В рамках регионального проекта проведены следующие мероприятия:

1) Обновление материально - технической базы 145 школ. В рамках мероприятия заключены 24 контракта на сумму 229,8 млн рублей. Профинансированы и освоены 229,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Поставлено оборудование в 145 образовательных организаций;

2) Создание Центров цифрового образования детей «ИТ-куб». В рамках мероприятия заключены 18 контрактов на общую сумму 34,9 млн рублей. Профинансировано и освоено 34,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. В сентябре 2022 году открыты 2 Центра цифрового образования «ИТ-куб» на базе ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж».

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, возрастающий, процент	16,25	16,65	102,4
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, возрастающий	10	16,98	169,8
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС, возрастающий	10	38,47	384,7
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации общеобразовательных программ	10	18,27	182,7

По результатам мониторинга 2022 году следует отметить, что мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме. По всем 4 целевым показателям регионального проекта достигнуты плановые значения на 2022 год.



4.4 Региональный проект «Молодые профессионалы «Республика Дагестан»»

В 2022 году в рамках регионального проекта было запланировано оснащение 12 мастерских в 4 профессиональных образовательных организациях: ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», ГБПОУ РД «Колледж экономики и предпринимательства», Бизнес-колледж Дагестанского университета народного хозяйства и ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова».

На реализацию регионально проекта профинансировано 62,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 61,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей). Фактически освоено 62,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В рамках регионального проекта заключено 67 контрактов, или 100 % от плана по закупке оборудования на общую сумму 62,2 млн рублей, из них по:

- ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» – 13 контрактов (договоров) на сумму 3,98 млн рублей;
- ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» заключены – 42 контракта (прямые договоры) на сумму 28,8 млн рублей;
- ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 4 контракта (договоров) на сумму 14,3 млн рублей;
- ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» – 8 контрактов на сумму 15,1 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта проведены следующие мероприятия.

В сентябре 2022 года состоялось открытие:

- мастерских по направлению «Социальная сфера» компетенциям: «Медицинский и социальных уход», «Лабораторный медицинский анализ», «Стоматология ортопедическая» в ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;
- ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» (г. Дербент);
- ГАОУ ВО «Дагестанский университет народного хозяйства» (г. Махачкала);
- ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» (г. Махачкала).

Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования составляет 33 460 человек, из них 864 обучающихся по итогам демонстрационного экзамена продемонстрировали уровень, соответствующий национальным или международным стандартам.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2022 году в республике аккредитована 51 площадка в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена по 30 компетенциям.

Центром опережающей профессиональной подготовки при ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» профориентационными мероприятиями охвачены 60 645 человек.

В 2022 году Республика Дагестан вошла в число 15 субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям.

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 24.08.2022 №10-02-744/22 утвержден перечень по востребованным и перспективным профессиям в Республике Дагестан, по которым будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения: монтажник электрических подъемников (лифтов), санитар ветеринарный, маляр, агент рекламный и инструктор-проводник при занятиях туризмом на транспортных средствах. Реализацией программ профессионального обучения будут заниматься 5 профессиональных образовательных учреждений региона

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, возрастающий, процент	2,41	2,58	107
2	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, возрастающий, процент	58,5	61,1	104,5
3	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, возрастающий, единица	29 562	60 645	205,1

По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 2022 году следует отметить, что мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.

По всем 3 целевым показателям регионального проекта достигнуты плановые значения на 2022 год.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает осуществлять совместно с центрами занятости населения в городах и районах осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников, прошедших обучение в мастерских.



4.5. Региональный проект «Социальная активность»

Региональным проектом запланировано увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества, до 99,6 тыс. человек за счет:

- создания 7 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик поддержки добровольчества во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (Волонтеры-медики, Волонтеры культуры, Лиза Алерт и ДоброЦентр);

- проведение регионального отбора на участие во Всероссийском конкурсе субсидий лучшим практикам в сфере добровольчества;

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта профинансировано 8,98 млн рублей (средства федерального бюджета – 8,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей). Фактически освоено 8,98 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

Заключены 22 контракта, или 100 % от плана по закупке оборудования на общую сумму 8,9 млн рублей.

По результатам проведения конкурса «Развитие сети ресурсных центров добровольчества в Дагестане» были определены победители город Кизляр, Хасавюртовский, Сулеман-Стальский и Левашинский районы, ресурсным центрам добровольчества, которым передано материально-техническое обеспечение: ноутбуки, проекторы, фотопринтеры, информационные стенды.

Согласно протоколу от 5.07.2022 г. Экспертной комиссии Всероссийского конкурса лучших региональных практик «Регион добрых дел», Республика Дагестан вошла в список победителей, которым в 2023 году из средств федерального бюджета будет предоставлена субсидия на реализацию лучших региональных практик, поддержки волонтерства в сумме 9,04 млн рублей.

В ЕИС «Добро.ру» зарегистрировано 62 319 добровольцев. 774 организаторов мероприятий и 14 593 волонтеров прошли обучение. Волонтерами республики проведено 1009 мероприятий.

По целевому показателю «Общая численность граждан Республики Дагестан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) в добровольческую деятельность» фактическое значение на 1 января 2023 года составляет 100 500 человек, или 101 % от плана на 2022 год (99 622 человека).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает осуществлять мероприятия по развитию добровольчества в сфере паллиативной помощи, в том числе с вовлечением молодежи в решение социальных проблем семей с неизлечимо больными детьми, и формированию добровольческой практики системной помощи детским больницам.



4.6. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В ходе реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2022 году было запланировано:

- внедрение рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (100 % охвата обучающихся);

- увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 196,0 тыс. человек;

- развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки проектов, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи – 13,47 тыс. человек.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство образования и науки Республики Дагестан.

По состоянию на 1 января 2023 года профинансированы расходы в размере 138,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 137,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,4 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 136,71 млн рублей, или 98,5 % от финансирования и годовых назначений (138,5 млн рублей).

В рамках реализации мероприятия по оснащению государственными символами Российской Федерации государственных и муниципальных общеобразовательных организаций профинансированы средства в сумме 108,5 млн рублей освоены в полном объеме.

В целях проведения мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию профинансировано 30,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Фактически освоено 28,2 млн рублей, или 93 % от объема финансирования – 30,3 млн рублей. Неосвоенный остаток средств составил 2,1 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года в общеобразовательных организациях введены 239 ставки советников директора по воспитанию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.

В 2022 году в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активность, приняло участие 235,4 тыс. человек, или 120,1 % от плана (196 тыс. человек).

В целях обеспечения поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в Республике Дагестан проведены мероприятия с охватом более 196 тыс. человек, или 1 420,3 % от планового объема (план – 13,47 тыс. человек).

Достижение целевых показателей регионального проекта не предусмотрено.



4.7. Региональный проект

«Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»

В ходе реализации регионального проекта запланировано создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.

В 2022 году в рамках регионального проекта было запланировано проведение информационной кампании по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и участие делегации молодежи Республики Дагестан в количестве 20 человек в образовательных программах Форума «Таврида».

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» (Постановление Правительства от 19 ноября 2021 г. N 311). Отправка участников будет осуществлена за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий данной государственной программы (2,0 млн рублей).

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России» (Республика Дагестан) № 091-2021-ЕГ001-36 от 24 декабря 2021 года между Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

В рамках подготовки делегации на участие в форуме «Таврида» с 20 по 21 июня в Махачкале на базе ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» и в Центре традиционной культуры народов России им. Абасова Б.Х. муниципального образования «Хасавюртовский район» прошел IV Республиканский форум «Волонтеры культуры».

С 15 по 19 августа 2022 года делегация Республики Дагестан в количестве 17 человек приняла участие в фестивале «Таврида.АРТ», который прошел в Республике Крым, г. Судак, бухта Капсель.

С 5 по 11 сентября 2022 года на образовательном заезде «Главная сцена» форума «Таврида» приняла участие дагестанская делегация, в состав которой вошли 8 артистов республиканских театров (артисты, режиссеры театров, театральные менеджеры и продюсеры).

На отдельные мероприятия поехали 2 представителя, финалисты и победители платформы «Россия – страна возможностей» и проекта «Твой ход».

В рамках форума участники посетили тренинги и лекции от мастеров российской сцены.

Всего в образовательных программах Форума «Таврида» обеспечено участие 27 человек, или 135 % от плана (20 человек).

Достижение целевых показателей регионального проекта не предусмотрено.



5. Национальный проект «Жилье и городская среда»



Куратор национального проекта:

Мажонц М. Л.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

**Руководитель региональных
проектов:**



Сулейманов А.А.

Министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Российской Федерации являются:

– улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее, чем до 120 млн. кв. метров в год (до 2030 г.);

– повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

– улучшение качества городской среды в полтора раза (до 2030 года);

– создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %;

– обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

– повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 4 региональных проекта:

1) «Жилье»;

2) «Формирование комфортной городской среды»;

3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

4) «Чистая вода».


В 2022 году из 4 региональных проектов было предусмотрено финансирование 3 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Жилье» не предусматривалось.

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» профинансированы средства в сумме 2 731,96 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (федеральный бюджет – 2 497,88 млн рублей, республиканский бюджет Республики Дагестан – 24,11 млн рублей, средств муниципальных образований – 209,97 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года освоено 2 731,96 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (2 731,96 млн рублей).

Финансирование национального проекта
«Жилье и городская среда» в 2022 году

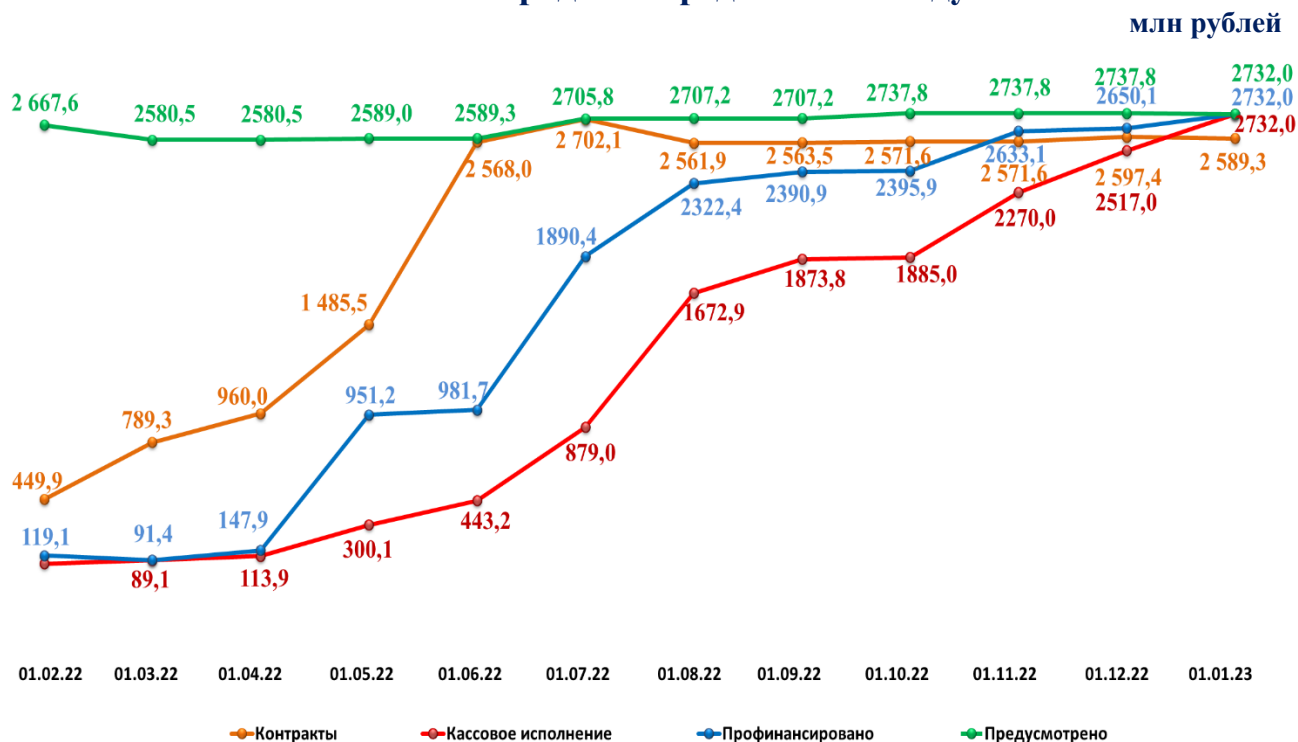

В ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по 3 региональным проектам заключено 129 контрактов на общую сумму 2 589,3 млн рублей, или 99,2 % от годового объема (130 контрактов). Не заключен 1 контракт по региональному проекту «Чистая вода».

Информация о реализации региональных проектов национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Дагестан за 2022 год представлена в следующей таблице.

млн рублей

Национальные (региональные) проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено за 2022 год		Остатки средств на 1 января 2023 г.	
			Сумма	%	Сумма	%
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»	2 732,0	2 732,0	2 732,0	100	0	0
1. «Жилье»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. «Формирование комфортной городской среды»	1 227,2	1 227,2	1 227,2	100	0,0	0,0
3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	0,87	0,87	0,87	100,0	0,0	0,0
4. «Чистая вода»	1 503,8	1 503,8	1 503,8	100	0,0	0,0



5.1. Региональный проект «Жилье»

В ходе реализации регионального проекта «Жилье» в 2022 году предусматривалось достижение объема жилищного строительства в размере 1 004,0 тыс. кв. м (дополнительное соглашение от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 к Соглашению, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан).

Финансирование регионального проекта «Жилье» в 2022 году не предусматривалось.

По данным Дагестанстата в 2022 году введено 1 005,3 тыс. кв.м. жилья (97,5 % к 2021 году), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 535,8 тыс.кв.м. (110,8 % к январю - декабрю 2021 года);
- строительство многоквартирных домов – 468,5 тыс.кв.м. (86 % к январю – декабрю 2021 года).

Уровень достижения значения показателя по дополнительному соглашению от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 составил 100,0 %.

Динамика выполнения целевых показателей регионального проекта «Жилье»

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
2018	тыс.кв.м.	891,2	976,0
2019	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
2020	тыс.кв.м.	929,0	969,7
2021	тыс.кв.м.	937,0	1 031,2
2022	тыс.кв.м.	1 004,0	1 005,3



5.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан».

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году было предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за счет проведения следующих мероприятий:

- благоустройство 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий – 1 098,0 млн рублей;

- благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина города Буйнакск (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 85,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию регионального проекта профинансировано 1 227,3 млн рублей, или 100 % годовых назначений (за счет федерального бюджета – 1 008,2 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 9,1 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоено средств в сумме 1 227,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключены 122 контракта, или 100 % от планового объема на сумму 1 215,2 млн рублей. Сумма в размере 12,1 млн рублей не подлежит контрактации.

Следует отметить, что в Соглашениях, заключенных Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с муниципальными образованиями Республики Дагестан, необходимо было обеспечить выполнение обязательств по ежемесячному кассовому исполнению в размере 100 % от объемов финансирования. В течение 2022 года указанное требование не соблюдалось.

Кроме этого, дополнительному соглашению от 28 февраля 2022 г. № 069-09-2022-592/1, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, было предусмотрено обеспечение 100 % кассового исполнения в срок до 1 декабря 2022 года, что также не исполнено.

По состоянию на 1 января 2023 года завершены работы на всех 179 объектах благоустройства (в том числе 117 общественных и 62 дворовых территорий).

В 2022 году на реализацию проекта: «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) в г. Буйнакск (победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) профинансированы средства в сумме 124,1 млн рублей (средства федерального бюджета (грант) – 110,6 млн рублей, средства местного бюджета – 13,5 млн рублей). Освоено 124,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Администрацией городского округа «город Буйнакск» заключен муниципальный контракт от 4 мая 2022 года № 103200008422000517 на сумму 86,97 млн рублей с исполнителем работ ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие - 57» на выполнение работ по благоустройству «Городского сада по ул. Ленина. Дополнительным соглашением № 1 от 3 октября 2022 года к муниципальному контракту на выполнение работ по реализации проекта, срок исполнения контракта продлен до 30 ноября 2022 года.

По состоянию на 1 января 2023 года информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» отсутствует, акты приемки выполненных работ не размещены.

Всего с начала реализации регионального проекта в Республике Дагестан благоустроены 636 общественных территорий, а также реализованы 4 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значение показателя		%
		План	Факт	
1	Индекс качества городской среды, возрастающий, балл	181	172	95
2	Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий	636	636	100
3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. нарастающий	3	4	133,3
4	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	40	30	75
5	Количество городов с благоприятной городской средой	4	3	75
6	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	15	12	80
7	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	100	111,1
8	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, возрастающий	20	20	100

В 2022 году запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме. По состоянию на 1 января 2023 года из 8 целевых показателей регионального проекта обеспечено достижение плановых значений по 4 целевым показателям. По 3 целевым показателям, значение рассчитывается не ранее 1 апреля 2023 года.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

– органам исполнительной власти и муниципалитетам усилить контроль за реализацией государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»;

– рекомендовать городским округам и муниципальным районам увеличить долю софинансирования из местного бюджета на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;

– принять меры по своевременному заключению контрактов с целью обеспечения исполнения обязательств поставщиками в установленные сроки;

– при заключении контрактов и определении сроков выполнения мероприятий регионального проекта предусмотреть резерв времени в целях снижения рисков возможных нарушений графика выполнения работ;

– обеспечить оперативный контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству территорий;

– исключить факты неэффективного использования выделенных бюджетных средств;

– использовать «Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды с учетом особенностей территорий, на основе мнения жителей», а также Методические рекомендации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 г. № 913/пр;

– определить персональную ответственность руководителей органов исполнительной власти и муниципальных образований за качественное выполнение мероприятий регионального проекта и достижением утвержденных индикативных показателей;

– обеспечить ведение претензионной работы с подрядными организациями в части устранения, выявленных в течение гарантийного срока недостатков.



5.3. Региональный проект

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах».

В рамках досрочного завершения адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах» планировалось расселение 72 семей (227 человек) из аварийного жилищного фонда, общей площадью 2,75 тыс. кв. метров, признанного таковым до 1 января 2017 года.

На реализацию регионального проекта в 2022 году профинансировано 0,87 млн рублей (средства федерального бюджета). Средства освоены в полном объеме.

В рамках досрочного завершения программы переселения (этапы 2019 - 2020, 2020-2021, 2021 - 2022, 2022 -2023 годов) обеспечено расселение 67 семей (210 человек).

В 2022 году программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах» досрочно завершена. Показатели программы приняты как условно достигнутые в виду непредвиденных обстоятельств. Однако, по состоянию на 1 января 2023 года нерасселенными остаются 5 семей (17 чел.) в городе Махачкале, в том числе:

- с 2 семьями осталось заключить соглашения на выкуп жилых помещений, по которым администрацией г. Махачкалы поданы иски в суд в связи с отказом от расселения собственников;

- по 2 соглашениям заключены контракты на основании решения суда об изъятии объекта недвижимости путем выкупа;

- по 1 соглашению администрацией г. Махачкалы подано исковое заявление в суд в связи с отказом от предоставления банковских реквизитов. Собственником квартиры №4 в доме по ул. Гамидова, 11 А, 19 ноября 2021 года было подписано соглашение об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд, путем предоставления возмещения, однако в последствии собственником не представлены банковские реквизиты для перечисления выкупной суммы.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2022 году до собственников 3 жилых помещений (100,2 кв. метра) на территории г. Махачкалы по адресу ул. Юсупова, дом 28 кв. №3,5,7 доведены денежные средства в размере 4,9 млн рублей.

До собственников 8 жилых помещений, проживающих в аварийном многоквартирном доме на территории Унцукульского района (523,2 кв. м.) средства доведены в полном объеме в сумме 16,8 млн рублей.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значение показателя		%
			План	Факт	
1	Сокращение непригодного жилого фонда	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. человек	0,15	0,227	245
2		Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс кв.м	2,64	2,75	166

По 2 целевым показателям регионального проекта (нарастающим итогом с начала реализации) обеспечено достижение плановых значений на 2022 год. Однако, плановые результаты государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах» (72 семьи, или 227 человек) не достигнуты.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

– муниципальным образованиям, в целях недопущения судебных разбирательств с гражданами, жилье которых попадает под расселение из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан, привлечь специализированные организации для определения технического состояния и аварийности жилых домов.



5.4. Региональный проект «Чистая вода».

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике Дагестан в 2022 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 72,2 % и доли городского населения до 91,2 % за счет строительства и реконструкции 8 объектов водоснабжения.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Функции заказчика-застройщика по объектам «Водоснабжение городского округа «город «Южно-Сухокумск», «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» и «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск. Строительство водовода Чиркей – Буйнакск Республики Дагестан» осуществляет ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности». По остальным объектам заказчиками работ являются муниципальные образования.

Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Чистая вода»

млн рублей

№	Стройки и Объекты	Мощность (кв. м)	Предусмотрено	Стоимость по контракту	Профинансировано	Освоено	% готовности
	Итого		1 503,8	1374,0	1 503,8	1 503,8	71,6
1	Реконструкция систем водоснабжения города Кизляра (переходящий объект с 2021 года)	30,6	40,2	46,66	40,2	40,2	100,0
2	Реконструкция межпоселкового водовода В. Казанище – Бетаул – Кырлар, Буйнакский район (переходящий объект с 2021 года)	10,26	44,9	48,8	44,9	44,9	100,0
3	Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского р-на (объект с 2021 г)	1200 куб. м/сут	3,49	3,49	3,49	3,49	100,0
4	Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района (объект 2021г)	18,04	36,0	36,0	36,0	36,0	100,0
5	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрта (переходящий объект с 2021 года)	23,07	189,85	189,85	189,85	189,85	98,0
6	Строительство водовода Чиркей – Буйнакск (переходящий на 2023 год)	31,65	1 151,67	854,7	1 151,67	1 151,67	55,0
7	Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района	24,73	36,29	194,44	36,29	36,29	20,0
8	Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск»	11,01	1,39	0,0	1,39	1,39	0

В рамках реализации регионального проекта было запланировано в 2022 году строительство и ввод в эксплуатацию 8 объектов водоснабжения (5 объектов переходящие с 2021 года).

На реализацию регионального проекта в 2022 году профинансированы и освоены средства в сумме 1 503,83 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 488,79 млн рублей, средства республиканского бюджета – 15,04 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта по 7 объектам из 8 заключены контракты с учетом строительного контроля на общую сумму 1 374,0 млн рублей.

Согласно информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, из 8 объектов с запланированным вводом в эксплуатацию в 2022 году, фактически введены в эксплуатацию 4 объекта, в том числе:

– «Реконструкция систем водоснабжения города Кизляр». Освоено 40,2 млн рублей, или 86,2 % от лимитов на 2022 год (46,6 млн рублей). Остаток средств в размере 6,4 млн рублей возвращен в бюджет в виде экономии. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.06.2022 № RU05-043-64-2022, выданное отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа «город Кизляр»;

– «Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района (переходящий объект с 2021 г). Освоено 36,0 млн рублей, или 100 % от лимитов на 2022 год. По данным ЕИС «Закупки» по контракту, на основании актов выполненных работ, произведена оплата исполненных обязательств в полном объеме. Исполнение контракта завершено;

– «Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах, Хунзахского района Республики Дагестан», муниципальный контракт № 03 от 09.04.2021 г. с ООО «Хунзахское СЭУ». Освоено 3,5 млн рублей, или 100 % от лимитов на 2022 год. Согласно информации на сайте <https://zakupki.gov.ru>, по контракту, на основании актов выполненных работ, произведена оплата исполненных обязательств в полном объеме;

– «Реконструкция межпоселкового водовода «В. Казанище – Бетаул – Кырлар», Буйнакский район, контракт с ООО «Капитал» от 27.04.2021 г. № 0303300003521000002 на сумму 157,6 млн рублей. Освоено 44,9 млн рублей, или 100 % от лимитов на 2022 год. По данным ЕИС «Закупки» по контракту, на основании актов выполненных работ, произведена оплата исполненных обязательств в полном объеме. Исполнение контракта завершено.

По объекту «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск». Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» освоено 854,7 млн рублей, или 100 % от лимитов на 2022 год

По объекту «Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт» Администрацией г. Хасавюрт 19 апреля 2021 года был заключен государственный контракт на выполнение строительных работ с ООО «Авилон» со сроком завершения работ до 31 октября 2021 года.

Однако, в связи с систематическим нарушением графика производства работ, Минстроем России в целях исключения риска срыва реализации мероприятия ФП «Чистая вода» в октябре 2021 года было принято решение о переносе лимита средств в размере 73,44 млн рублей и показателя «ввод в эксплуатацию» на 2022 год.

В 2022 году в целях гарантированного завершения и ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт» из резервного фонда Правительства Российской Федерации были дополнительно выделены средства в размере 115,26 млн рублей, которые 1 ноября 2022 года были доведены до бюджета г. Хасавюрт.

Несмотря на проведенные мероприятия, в 2022 году Администрацией г. Хасавюрт не обеспечено завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию, что является нарушением условий соглашения, заключенного между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан (№ 069-09-2022-177/7 от 24.12.2021г.).

В виду низкого уровня строительных работ, а также из-за расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, в 2022 году также не завершено строительство следующих объектов водоснабжения:

- «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» (уровень готовности 20 %, подрядчик ООО «Арт-строй»);
- «Водоснабжение городского округа город Южно-Сухокумск, Республика Дагестан». В связи недобросовестным исполнением контрактных обязательств, ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Контракт не заключен.

Средства на строительство указанных 2 объектов в сумме 297,0 млн рублей перераспределены на объект «Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» (переходящий на 2023 год).

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» было предусмотрено достижение 2 целевых показателей, характеризующих обеспеченность населения качественной питьевой водой. Показатели рассчитываются по итогам года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан. По данным ГИИС «Электронный бюджет» в 2022 году по Республике Дагестан обеспечено достижение плановых значений по показателям «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (100 %), «Доля городского

населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» (100 %).

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий, процент	72,2	72,2	100
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий, процент	91,2	91,2	100
3	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.	11	10	91 %

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, однако не обеспечено достижение планового значения по целевому показателю регионального проекта «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами».

В ходе реализации регионального проекта в установленные сроки не завершено строительство 3-х объектов водоснабжения, в том числе переходящий объект с 2021 года («Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт»). Указанное свидетельствует о том, что мероприятия регионального проекта не увязаны с достижением плановых значений по целевым показателям.

За период реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Республики Дагестан с 2019 года по 2022 год построены 10 объектов водоснабжения из 11 запланированных. В связи с переносом ввода в эксплуатацию 3 объектов водоснабжения с 2022 года на 2023 год в 2022 году построено 4 объекта. Однако, в ГИИС «Электронный бюджет» по целевому показателю «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом, ед.» по состоянию на 1 января 2023 г. приведено нулевое значение.

По состоянию на 1 января 2023 по объекту «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск»», контракт не заключен, работа по подготовке технической документации на проведение конкурсных мероприятий, не завершена.

По состоянию на 1 января 2023 года в Республике Дагестан не решена проблема обеспечения населения доброкачественным водоснабжением, так как пробах питьевой воды обнаруживается повышенное содержание мышьяка, аммиака и железа.

По результатам данных федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мониторинга качества питьевой воды в Республике Дагестан удельный вес всего проб питьевой воды, не отвечающих установленным гигиеническим требованиям за I полугодие 2022 г. составил – 12% (I полугодие 2021 г. – 18 %), в том числе по показателям: санитарно-химическим – 10% (I полугодие 2021 г. – 9 %), органолептическим – 23% (I полугодие 2021г. – 28 %), микробиологическим - 7% (I полугодие 2021г. – 11 %).

Существующие системы водоподготовки воды из поверхностных источников Махачкалы, Избербаша, Каспийска, Буйнакск, Буйнакского, Кизилюртовского, Карабудахкентского, Каякентского, Сергокалинского и других районов не позволяют добиться очистки исходной воды до требований гигиенических нормативов из-за использования старых технологических решений водоподготовки или их отсутствия, низкого санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений.

С учетом изложенного темпы реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (за 4 года построено 11 объектов водоснабжения) на текущий момент не в полной мере обеспечивают достижения национальной цели в части повышения качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает:

- принять комплекс мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, допущенных в ходе реализации регионального проекта;
- обеспечить своевременную разработку проектно-сметной документации и прохождению экспертизы по объектам водоснабжения, запланированным к строительству в 2023 году;
- при разработке проектно-сметной документации предусмотреть обязательное наличие обеззараживающей бактерицидной установки на объекте водоснабжения;
- закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд осуществлять строго в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- предусмотреть персональную ответственность глав муниципальных образований и городских округов за качеством выполнения работ и достижением утвержденных показателей.



6. Национальный проект «Экология»



**Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Ибрагимов И.М.
Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента РФ от 21.07.2020 N 474) основными целями реализации национального проекта «Экология» в Российской Федерации являются:

– эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;

– кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;

– сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» из 5 региональных проектов в 2022 году реализуются 4 региональных проекта⁹:

1) «Чистая страна» (начало реализации – 2023 год);

2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

3) «Сохранение уникальных водных объектов»;

4) «Сохранение лесов».

Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан, регионального проекта «Сохранение лесов» – Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Экология» предусмотрены средства в сумме 4 315,4 млн рублей (федерального бюджета – 4 266,4 млн рублей, республиканского бюджета – 43,4 млн рублей, средства «Даглес» – 5,6 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года профинансированы средства в размере 4 315,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 4 315,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений.

Заключено 6 контрактов, или 100 % от планового объема на сумму 10,2 млн рублей.

В 2022 году по национальному проекту «Экология» из 4 региональных проектов запланировано финансирование 3 региональных проектов.

⁹ Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»



6.1 Региональный проект «Чистая страна».

В рамках реализации проекта «Чистая страна» к 2024 году запланирована ликвидация 4 свалок и рекультивация территорий (35,4 га), на которых они размещены в границах городских округов, в том числе в городах: Буйнакск (4 га), Каспийск (9 га), Южно-Сухокумск (6 га), Хасавюрт (14 га).

Планируемая численность населения, качество жизни которых улучшится от реализации регионального проекта – 227,25 тыс. человек.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Начало реализации регионального проекта запланировано на 2023 год.

Общий объем финансирования на 2023 – 2024 годы предполагается в сумме 586,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 556,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 29,30 млн рублей).

В 2022 году финансирование, заключение контрактов и достижение целевых показателей в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрено.

Региональный проект реализуется в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» (утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 657).

В 2021 году на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированных свалок Министерству природных ресурсов и экологии Республики Дагестан за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан¹⁰ профинансировано 47,85 млн рублей.

В целях подготовки проектно-сметной документации от 28 декабря 2021 года ГКУ РД «Дагводсервис» (Заказчик)¹¹ с ООО «Гидропроект» (Подрядчик) заключены 4 контракта на общую сумму 33,8 млн рублей, в том числе:

– свалка в г. Южно-Сухокумске – контракт № 2057100353521000024 на сумму 9,1 млн рублей;

– свалка в г. Каспийске – контракт № 2057100353521000025 на сумму 10,3 млн рублей;

– свалка в г. Буйнакске – контракт № 2057100353521000023 на сумму 6,8 млн рублей;

– свалка в г. Хасавюрте – контракт № 2057100353521000026 на сумму 7,6 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года проектная документация по всем 4 объектам подготовлена и прошла государственную экспертизу.

Заключение контрактов на проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде планируется в феврале 2023 года.

¹⁰ Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2021 № 363-р

¹¹ Подведомственная организация Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан



6.2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» запланированы мероприятия по созданию 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- территориальный узел Махачкала с мусоросортировочным комплексом мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 300 тыс. тонн/год;
- территориальный узел Хасавюрт с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год;
- территориальный узел Дербент с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год.

По состоянию на 1 января 2023 года на реализацию регионального проекта профинансированы и освоены расходы в размере 4 286,6 млн рублей, или 100 %.

В целях уменьшения транспортных расходов на перевозку отходов до объектов размещения во всех территориальных зонах будут созданы перегрузочные станции (36 станций) на территории труднодоступных районов. Кроме этого, требуется обустройство контейнерных площадок в каждом муниципальном образовании Республики Дагестан.

Строительство трех комплексов по обработке твердых коммунальных отходов будет реализовано при финансовом участии Публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

В этой связи, 13 сентября 2022 г. на площадке IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в г. Москва состоялось подписание трёх концессионных Соглашений между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор». Объем инвестиций составит около 13 млрд рублей. Комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Республикой Дагестан направлена заявка для принятия участия в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по выплате в период с 2022 по 2024 год части расходов концедента. По результатам одобрения Минприроды России указанной заявки, 5 декабря 2022 года на реализацию регионального проекта в Республику Дагестан в декабре 2022 года поступили средства федерального бюджета в сумме 4 286,6 млн рублей.

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, в рамках заключенных трёх концессионных соглашений, указанные средства перечислены ООО «Республиканский экологический оператор» на строительство 3 мусоросортировочных комплексов, за счет чего обеспечено освоение 4 286,6 млн рублей, или 100 % от плана.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», подпрограмма «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. N 657).

Согласно данным подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан» на 2022 год, при средней численности населения республики более 3-х млн человек, ежегодно образуется свыше 1,3 млн тонн отходов.

При этом для складирования отходов занято 14 гектаров земли (на официально разрешенных полигонах в районе городов Избербаш 8 га и Кизляр 6 га), а объем перерабатываемых отходов не достигает 1%.

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех муниципалитетах, а также отсутствие системного графика вывоза (до 2-х раз в день при необходимости) являются первоочередными задачами, с которых необходимо начинать решение вопросов в этой сфере.

В тоже время, при составлении новой Территориальной схемы приведены только сведения о количестве контейнеров в городах и селах Республики Дагестан, без проведения анализа показателя «Количество планируемых контейнерных площадок и контейнеров», на основании которого и следует осуществлять решение основной проблемы, сдерживающей переход на новую систему обращения с отходами.

Кроме того, законодательно не определено, на кого конкретно возложена ответственность в части приобретения мусорных контейнеров.

Среднее количество специализированной техники, задействованной региональным оператором в вывозе твердых коммунальных отходов, составляет 205 единиц, из которых 20 единиц – собственные, 185 единиц - арендованные, а численность контейнерных площадок, расположенных на территории Республики Дагестан - 2095 (данные паспорта Подпрограммы). Таким образом, 1 машина обслуживает более 10 контейнерных площадок, что является недостаточным. При этом, необходимо учитывать площадь территории Республики Дагестана (50,3 тыс. кв. км, из которых горы 25,5 тыс. кв. км), плотность населения (62,7 чел./км²), а также протяженность территории.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО, убывающий	100	100	100
2	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	38	0	0
3	Количество разработанных электронных моделей.	100	100	100



6.3. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрено увеличить протяженность расчищенных участков русел рек Республики Дагестан до 13,28 км.

В 2022 году в рамках регионального проекта была запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан».

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, от 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, от 9.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 января 2023 года профинансированы средства в размере 3,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует.

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» заключен 1 контракт с ООО «Земля» на подготовку проектно-сметной документации по проекту «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 3,4 млн рублей (бюджет 2022 года – 3,0 млн рублей, бюджет 2023 года – 0,4 млн рублей).

В соответствии с заключенным государственным контрактом проектная документация разработана. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации.

Достижение целевых показателей по региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в 2022 году не предусмотрено.



6.4. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2022 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий:

- увеличение площади лесовосстановления – 17,1 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 1,05 млн рублей;
- оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной техникой и оборудованием – 7,2 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года Комитету по лесному хозяйству Республики Дагестан профинансировано 25,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 25,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений, в том числе по следующим мероприятиям:

- увеличение площади лесовосстановления – 10,0 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 0,05 млн рублей;
- оснащение лесопожарной техникой и оборудованием – 7,2 млн рублей.

В целях оснащения лесопожарной техникой и оборудованием ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» заключены 5 контрактов (договоров) по которым поставлена следующая техника:

- автомобиль ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной установкой (1 ед.) на сумму 5,9 млн рублей;
- квадрик - вездеход на сумму 0,9 млн рублей;
- оргтехника (2 договора) на сумму 0,26 млн рублей;
- ранцевые огнетушители (1 договор) на сумму 0,23 млн рублей.

Техника поставлена, оплата произведена.

ГБУ РД «Республиканские леса» проведены работы по лесовосстановлению на площади 530 га, или 103,1 % от плана на сумму 6,5 млн рублей, в том числе лесоразведение на площади 50 га на сумму 19,7 млн рублей. За счет средств ООО «Даглес» заготовлено 5 515 кг семян, или 100 % от плана.

На 1 января 2023 года обеспечено достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» – 100 % (план – 100 %).



7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Куратор национального проекта:
Джафаров Р.Д.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Салавов Д. Ш.
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации являются:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;
- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 %;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 годом;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом (не более 4 человек на 100 тысяч населения).

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта.

- 1) «Дорожная сеть»,
- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- 3) «Безопасность дорожного движения».



Реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» осуществляет Министерство внутренних дел Республики Дагестан.

На реализацию национального проекта в 2022 году профинансированы расходы в сумме 2 322,0 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

(средства федерального бюджета – 794,5 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 527,5 млн рублей). Фактически освоено 2 322,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 20 контрактов по 2 региональным проектам, или 100 % от планового объема контрактов на общую сумму 2 322,0 млн рублей.

Информация о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2022 год представлена в следующей таблице.

Национальный проект/региональные проекты	Предусмотрено	Профинансировано	Освоено за 2022 год		Остатки средств на 1 января 2022 года	
			Сумма	%	Сумма	%
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»	2 321,9	2 321,9	2 321,9	100	0	0
1. «Дорожная сеть»	2 102,65	2 102,65	2 102,65	100	0	0
2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	219,3	219,33	219,33	100	0	0
3. «Безопасность дорожного движения»	0	0	0	0	0	0

В 2022 году по национальному проекту из 3 региональных проектов финансирование осуществлялось по 2 региональным проектам. Финансирование регионального проекта «Безопасность дорожного движения» не осуществлялось.

Информация о реализации целевых показателей (индикаторов) национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Дорожная сеть	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процент	81	81	100
2		Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий, процент	59,36	59,36	100
3		Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, процент	64	100	156,2
4		Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог (накопленным итогом),	6,07	12,87	212
5		Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), возрастающий	0,1149	0,172	149,7
6	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, процент	15	50	333,3
7		Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий, процент	20	37,5	188
8	Безопасность дорожного движения	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (убывающим итогом), человек	10,48	10,48	100
9		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (убывающим итогом), человек	4,02	4,02	100



7.1. Региональный проект «Дорожная сеть».

В ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» было запланировано приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций, за счет проведения следующих мероприятий:

– приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2 автомобильных дорогах регионального значения, входящих в состав Махачкалинской городской агломерации (114,9 пог. метров) – 302,2 млн рублей;

– ремонт и реконструкция 48,9 км автомобильных дорог регионального значения (7 объектов с учетом объекта «Содержание автомобильной дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке км 0 – км 4 (контракт жизненного цикла)») – 1 137,3 млн рублей;

– ремонт (капитальный ремонт) и организация дорожного движения на 20,9 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (44 объекта) – 457,9 млн рублей;

– реконструкция улично-дорожной сети г. Дербента (2 объекта протяженностью 6,07 км: улицы Кобякова – Нанейшвили, улица Фермерская) – 205,2 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года профинансировано 2 102,6 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений. (средства федерального бюджета – 687,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 414,9 млн рублей)

Кассовое исполнение составляет 2 102,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений.

В рамках регионального проекта заключены 16 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 2 102,6 млн рублей.

По объектам улично-дорожного движения города Махачкалы завершены работы на 40 улицах из 40 предусмотренных.

По объектам регионального значения завершены работы на 9 объектах из 9 предусмотренных.

Итого по всем объектам выполнение работ по укладке а/б покрытия составляет 100 % (570 тыс. кв.м).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн рублей

№	Объект исполнения	Предусмотрено по контракту на 2022 год	Кассовое исполнение ¹²		Исполнитель
			Сумма	%	
ГКУ РД «Дагестанавтодор»					
1	Ремонт А/Д Бабаюрт-Гребенская 0-8 км, контракт от 29.09.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	81,3	81,3	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
2	Ремонт А/Д Мамраш–Ташкапур–Араканский мост 15 – 23 км, контракт от 29.09.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	140,8	140,8	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
3	Ремонт А/Д Буйнакск–Гимры–Чирката км 8 – км 21, контракт от 25.10.2021 г. (срок исполнения 30.10.22 г.)	88,8	88,8	100	АО «МОСТОТРИЯД-99»
4	Ремонт А/Д Буйнакск–Гимры–Чирката км 0 - км 8, контракт от 25.10.2021 г., в том числе на 2022 год - 122,3 млн рублей (срок исполнения 30.09.22)	285,3	285,3	100	АО «МОСТОТРИЯД-99»
5	Строительство А/Д Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию Каспий», контракт от 05.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)	68,9	68,9	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
6	Содержание А/Д Мамраш–Ташкапур–Араканский мост 0-4 км, контракт от 16.12.2019 г. срок исполнения 31.12.2023 г.	0,36	0,36	100	ООО «Юагропромдорстрой»
7	Строительный контроль А/Д Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» от 13.11.2021 г. (срок исполнения 30.11.22)	540,2	540,2	100	ООО «ТЕХНОКОНТРОЛЬ»
8	Капитальный ремонт А/Д Махачкала–Буйнакск–Леваши–В.Гуниб 12-23 км контракт от 15.03.2022 г. (срок исполнения 30.12.23)	0,71	0,71	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
9	Реконструкция А/Д Гели–Талги, на участке км 0- км 4, контракт от 13.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)	232,8	232,8	100	ООО «СЕВКАВДОРСТРОЙ»
МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город «Дербент»					
10	Реконструкция ул. Фермерская в г. Дербенте, контракт от 11.11.20 (срок исполнения 27.04.22)	84,3	84,3	100	ООО «Маяк»

¹² уточнено по состоянию на 1 января 2023 года.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объект исполнения	Предусмотрено по контракту на 2022 год	Кассовое исполнение ¹²		Исполнитель
			Сумма	%	
11	Реконструкция ул. Кобякова-Нанейшвили в г. Дербенте, контракт от 02.12.2020 г. (срок исполнения 02.06.22)	120,9	120,9	100	ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-55»
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»					
12	Капитальный ремонт по 11 объектам УДС Ленинского района, г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	68,9	68,9	100	ООО «МАХАЧКАЛИНСКАЯ ДПМК»
13	Капитальный ремонт по 6 объектам УДС в г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 (срок исполнения 31.12.22)	148,6	148,6	100	ООО «ДОРСТРОЙТЕХ»
14	Капитальный ремонт УДС Кировского района, г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	31,0	31,0	100	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
15	Капитальный ремонт по объектам УДС в г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	57,0	57,0	100	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
16	Реконструкция ул. Докузпаринская в г. Махачкала, контракт от 26.04.2022 г. (срок исполнения 30.09.22)	152,3	152,3	100	ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ МОНТАЖ»
	Итого	2 102,6	2 102,6	100	

1. Государственным казенным учреждением Республики Дагестан «Управление автодорог Республики Дагестан» (ГКУ РД «Дагестанавтодор») по 9 объектам регионального и межмуниципального значения заключено 9 контрактов на сумму 1 840,3 млн рублей (объемы финансирования на 2022 год – 1 439,2 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 1 439,2 млн рублей, или 100 % от объемов финансирования на 2022 год:

1) Объект: «Реконструкция автомобильной дороги Гели – Талги», контракт [№ 2056201131421000159](#) от 21.10.2021 г. на сумму 234,0 млн рублей (лимит на 2022 год – 232,8 млн рублей), срок исполнения 31.12.23 г. Объем работ, запланированный на 2022 год выполнен. В ЕИС «Закупки» размещены акты приемки выполненных работ на сумму 232,8 млн рублей, или 100 % от лимитов, предусмотренных на 2022 год;

2) Объект: «Ремонт а/д Буйнакск – Гимры – Чирката 0 – 8 км», контракт [№ 2056201131421000157](#) от 25.10.2021 г. на сумму 140,8 млн рублей, срок исполнения 30.09.2022 г. Контракта исполнен. В ЕИС «Закупки» размещены акты приемки выполненных работ на сумму 140,8 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта.

3) Объект: «Ремонт а/д Буйнакск – Гимры – Чирката 8 – 21 км», контракт ([№ 2056201131421000158](#)) от 25.10.2021 г. на сумму 285,3 млн рублей, срок исполнения 30.10.22 г. Контракт исполнен. В ЕИС «Закупки» размещены акты приемки выполненных работ на сумму 285,3 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта.

4) Объект: «Строительство а/д обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий», контракт ([№ 2056201131421000066](#)) от 05.07.2021 г. на сумму 413,5 млн рублей (лимит на 2022 год – 69,3 млн рублей), срок исполнения 31 декабря 2024 года. Объем работ, запланированный на 2022 год выполнен. В ЕИС «Закупки» размещены акты приемки выполненных работ на сумму 69,3 млн рублей, или 100 % от лимитов, предусмотренных на 2022 год;

5) Объект: «Строительный контроль а/д обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий»», контракт ([№ 2056201131421000163](#)) от 13.11.2021 г. на сумму 4,0 млн рублей (лимит на 2022 год – 0,36 млн рублей), срок исполнения 31.07.23 г. Объем работ, запланированный на 2022 год выполнен. В ЕИС «Закупки» размещены акты приемки выполненных работ на сумму 0,36 млн рублей, или 100 % от лимитов, предусмотренных на 2022 год;

6) Объект: «Капитальный ремонт а/д Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб 12 – 23 км», контракт ([№ 2056201131422000118](#)) от 15.03.2022 г. на сумму 1 207,4 млн рублей (лимит на 2022 год – 531,4 млн рублей), срок исполнения 30.12.23 г. Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан лимиты 2022 года освоены в полном объеме.

В ЕИС «Закупки» заключено Дополнительное соглашение к контракту от 15.11.2022 г. на уменьшение финансирования в 2022 году до 531,4 млн рублей. Сумма исполненных поставщиком обязательств 2022 году составляет 463,6 млн рублей, или 87,2 % от лимитов на 2022 год (531,4 млн рублей);

7) Объект: «Ремонт а/д Бабаюрт – Гребенская 0 – 8 км», контракт ([№ 2056201131421000136](#)) от 29.09.2021 г. на сумму 106,3 млн рублей (лимит на 2022 год – 81,3 млн рублей), срок исполнения 30.09.22 г. Контракт исполнен. Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан лимиты 2022 года освоены в полном объеме.

В ЕИС «Закупки» размещены акты приемки выполненных работ на сумму 106,1 млн рублей;

8) Объект: «Ремонт автомобильной дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост 15 – 23 км», контракт ([№ 2056201131421000137](#)) от 29.09.2021 г. на сумму 113,8 млн рублей (лимит на 2022 год – 88,8 млн рублей). Контракт исполнен. В ЕИС «Закупки» размещены акты приемки выполненных

работ на сумму 113,8 млн рублей, или 100 % от лимитов, предусмотренных на 2022 год;

9) Объект: «Содержание автомобильной дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке км 0 – 4 км», контракт ([№ 2056201131419000289](#)) от 16.12.2019 г. на сумму 46,1 млн рублей (лимит на 2022 год – 0,71 млн рублей), срок исполнения – 31.12.2023 г. Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан лимиты 2022 года освоены в полном объеме. В то же время, согласно ЕИС «Закупки» исполнение контракта не завершено, акты приемки выполненных работ не размещены.

2. Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала») по объектам улично-дорожной сети города Махачкалы заключены 5 контрактов на сумму 457,9 млн рублей (объем финансирования на 2022 год). Кассовое исполнение составляет 457,9 млн рублей, или 100 % от объемов финансирования на 2022 год, в том числе по мероприятиям:

1) Объект: «Капитальный ремонт УДС Кировского района, г. Махачкале» контракт ([№ 3054100850422000004](#)) от 01.04.2022 г. на сумму 31,0 млн рублей (срок исполнения 30.12.22 г). Контракт исполнен. В ЕИС «Закупки» стоимость контракта составляет 30,3 млн рублей. Размещены акты приемки выполненных работ на сумму 30,3 млн рублей;

2) Объект: «Капитальный ремонт по объектам УДС в г. Махачкале» контракт ([№ 3054100850422000003](#)) от 01.04.2022 г. на сумму 59,3 млн рублей, срок исполнения 31.12.22 г. Контракт исполнен. В ЕИС «Закупки» размещены акты приемки выполненных работ.

3) Объект: «Капитальный ремонт по 6 объектам УДС в г. Махачкале» контракт ([№ 3054100850422000005](#)) от 01.04.2022 г. на сумму 151,5 млн рублей (срок исполнения 31.12.22). Контракт исполнен. В ЕИС «Закупки» согласно Дополнительному соглашению от 30 ноября 2022 года, стоимость контракта составляет 151,5 млн рублей. Фактически оплачено по актам приемки выполненных работ 151,5 млн рублей, или 100 % от общей стоимости контракта;

4) Объект: «Реконструкция ул. Докузпаринская в г. Махачкале» контракт ([№ 3054100850422000009](#)) от 26.04.2022 г. на сумму 147,9 млн рублей (срок исполнения 30.09.22г.). Контракт исполнен. В ЕИС «Закупки» фактически оплачено по актам приемки выполненных работ 147,9 млн рублей, или 100 % от общей стоимости контракта. Однако, контракт не исполнен в установленные сроки, штрафные санкции за нарушение условий контракта к подрядчику не применялись.

3. Администрацией городского округа «город Дербент» (МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город Дербент») по объектам улично-дорожной сети города Дербент в 2020 году заключены 2 контракта с бюджетом на 2022 года в сумме 205,2 млн рублей по ремонту 2 улиц общей протяженностью 6,07 км). Освоено 205,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений на 2022 год.

1) Объект: «Реконструкция улицы Фермерская в г. Дербенте» контракт (№ 3054201850520000081) от 11.11.2020 г. на сумму 227,1 млн рублей со сроком исполнения 27 апреля 2022 г. Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан исполнение контракта завершено.

Согласно ЕИС «Закупки» контракт (№ 3054201850520000081) от 11.11.2020 г. не исполнен (последнее обновление информации о контракте 16.01.2023 г.). Исполненные поставщиком обязательства составляют 216,5 млн рублей, фактически оплачено по актам приемки выполненных работ 217,2 млн рублей. Из-за нехватки предусмотренного финансирования в целях завершения контракта, дополнительно профинансированы средства МО «город Дербент» в сумме 42,5 млн рублей, согласно Соглашению № 526313. Так же сроки исполнения по контракту были перенесены на 23 декабря 2022 года. Меры реагирования за нарушение условий контракта к подрядчику не применялись.

2) Объект: «Ремонт улицы Кобякова – Нанейшвили» контракт (№ 3054201850520000094) от 2.12.2020 г. на сумму 266,4 млн рублей (срок исполнения 25 декабря 2022 года). Согласно данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан исполнение контракта завершено.

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процент	81	81	100
2	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий, процент	59,36	59,36	100
3	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, процент	64	100	156,2
4	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог (накопленным итогом),	6,07	12,87	212
5	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), возрастающий	0,1149	0,172	149,7

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, обеспечено достижение 5 плановых значений по всем 3 целевым показателям регионального проекта.



7.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» запланировано:

- внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Махачкалинской агломерации – 106,8 млн рублей;
- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на км 67+000 а/д Кизляр–Терекли–Мектеб – 60,0 млн рублей;
- установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения) на автомобильных дорогах республиканского и межмуниципального значения Республики Дагестан (15 ед.) – 52,5 млн рублей

На реализацию регионального проекта профинансированы средства в сумме 219,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 106,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 112,5 млн рублей). Освоено 219,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 4 контракта на сумму 219,3 млн рублей, в том числе:

1) Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации – 1 контракт (№ 3054100850421000056) от 23 ноября 2021 года на сумму 320,32 млн рублей (лимит 2022 года – 106,8 млн рублей). Заказчик – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала», подрядчик – ООО Национальный центр информатизации». Фактически освоено 106,8 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

2) Строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 65+650 а/д Кизляр – Терекли – Мектеб – граница Ставропольского края – контракт (№ 2056103950022000003) от 28 апреля 2022 г. на сумму 60,0 млн рублей. Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения». Подрядчик – ООО «ДОРБОСТСЕРВИС». Контракт исполнен.

3) Установка систем видеоконтроля (камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД), 12 штук – контракт № 2000068 от 16 мая 2022 года на сумму 42,0 млн рублей. Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения». Подрядчик ООО «Национальный центр информатизации». Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме.

4) Установка систем видеоконтроля (3 ед. камер фото-видеофиксации нарушений ПДД) – контракт № 2000107 от 18 мая 2022 г. на сумму 10,5 млн рублей. Заказчик – ГКУ РД «Дагестанавтодор». Подрядчик – ООО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРСВЯЗЬ». Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме.

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр – факт 37,5 %, или 188 % от плана (20 %). Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автодорог регионального (межмуниципального) значения – факт 50 %, или 333 % от плана (50 %).



7.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

Реализация регионального проекта направлена на повышения безопасности участников дорожного движения и снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2022 году (не более 10 человек на 100 тысяч населения и не более 4 человек на 10 тысяч транспортных средств).

Проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659).

На 2022 год в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021 – 2023 годах, предусмотрено финансирование в размере 21,3 млн рублей, в том числе Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан предусмотрено финансирование в сумме 10,9 млн рублей на реализацию 2 мероприятия, в том числе:

- приобретение передвижных (мобильных) комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения – 10,0 млн рублей (освоены в полном объеме);

- участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение, комплексной информационно-пропагандисткой компании в целях повышения ответственности и культуры поведения на дороге водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, подготовка тематических телепрограмм (освоены в полном объеме).

В июле 2022 г. в ГБУ РД «Детский оздоровительный лагерь «Орленок» проведена республиканская профильная смена юных инспекторов движения «Безопасная дорога детства». В смене приняли участие 250 юных инспекторов дорожного движения.

Для снижения уровня аварийности в Республике Дагестан Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по Республике Дагестан проведены мероприятия по привлечению к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма руководителей образовательных организаций, педагогов и родителей, в том числе:

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– 31 марта 2022 г. единое республиканское родительское собрание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций «Внимание, родители, дети на дороге!»;

– 20 мая 2022 года единое республиканское родительское собрание по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Безопасные каникулы».

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Безопасность дорожного движения	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (убывающим итогом), человек	10,48	10,48	100
2		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (убывающим итогом), человек	4,02	4,02	100

Согласно данным сайта «Статистика ГИБДД» (<http://stat.gibdd.ru>) с января-ноябрь 2022 года на территории Республики Дагестан произошло 1 300 ДТП, в которых погибли 276 человек и ранено 1 823 человек.

По данным Министерства внутренних дел по Республике Дагестан динамика дорожно-транспортных нарушений по Республике Дагестан с 2018 года на ноябрь 2022 год приведена в следующей таблице:

Динамика дорожно-транспортных нарушений по Республике Дагестан с 2018 года по ноябрь 2022 год

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	ноябрь 2022
Количество зарегистрированных ДТП, в которых:	1 738	1 595	1 444	1384	1300
погибло (чел.)	368	351	316	304	276
ранены (чел.)	2 630	2 248	1976	1918	1823

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная палата предлагает активизировать деятельность по размещению в средствах массовой информации социальной рекламы, публикаций, роликов, статей по обеспечению безопасности дорожного движения, информации о фактах резонансных ДТП при перевозках пассажиров и грузов, а также о результатах проверок, проводимых по данному направлению и принятых мерах.



8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»



Куратор национального проекта:
Джафаров Р.Д.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Гамзатов Ю.В.
Министр цифрового развития Республики
Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основной целью реализации национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации» является цифровая трансформация, в ходе которой должны быть обеспечены:

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %;

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 97 %;

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, доступной для всех организаций и домохозяйств;

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «Кадры для цифровой экономики»,
- 2) «Информационная инфраструктура»,
- 3) «Информационная безопасность»;
- 4) «Цифровые технологии»,
- 5) «Цифровое государственное управление».

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» профинансированы расходы в сумме 201,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 199,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 201,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» заключены 4 контракта, или 100 % от плана на сумму 201,3 млн рублей.

Экономия по результату приемки работ по контрактам составила 99,74 тыс. рублей, возвращена в бюджет.

В 2022 году из 5 региональных проектов по национальному проекту «Цифровая экономика» предусмотрено финансирование только на реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура».

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий национального проекта «Цифровая экономика» представлено в следующей таблице

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Кадры для цифровой экономики	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, возрастающий	151	166	109,9
2	Информационная инфраструктура	Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий	100	100	100
	Цифровое государственное управление	Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi, возрастающий	5,6	5,68	100
		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастающий	55	100	181,8
		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий	3,9	4,1	105,1
		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, возрастающий	30	31,1	103,7
		Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий	50	84	168
		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проективном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий	20	84	420
		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения,	50	98	196
		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий	50	51	102
		Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, %	0	0	100%
		Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий	1	1	100



8.1. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

В ходе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» предусмотрено:

- обучение 151 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления;

- проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению системы компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для населения;

- повышение активности образовательных организаций в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов.

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта в 2022 году не предусматривалось.

Мероприятия регионального проекта были реализованы в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы».

На образовательные программы, реализуемые в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», от Республики Дагестан зачислено 166 человека. Таким образом, обеспечено достижение планового значения целевого показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» в размере 109,9 % от плана (151 человек).

Осуществляется информационная поддержка проекта «Цифровые профессии», позволяющего любому гражданину пройти обучение со скидкой от 50-100% по программам дополнительного образования в формате онлайн.

В СМИ направлена информация об образовательных ИТ-проектах: «Код будущего» – для школьников и «Цифровые кафедры» – для студентов.

Наблюдается устойчивый рост обучающихся и педагогов образовательных организаций на платформе «Цифровой образовательный контент», предоставляющей онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам на базе АНО ВО «Университет Иннополис». Количество подключенных образовательных организаций (в том числе частных) достигло 1 567, количество зарегистрированных педагогов – 22 200 человек, учащихся – 157 401 человек.



8.2. Региональный проект «Информационная инфраструктура».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2022 году предусмотрено:

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети «Интернет» в государственных (муниципальных) образовательных организациях (81 школа) – 191,4 млн рублей;

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» – 9,9 млн рублей.

- обеспечение подключения и широкополосного доступа социально значимых объектов к сети Интернет;

- содействие в оказании универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.

В 2022 году на реализацию регионального проекта профинансированы и освоены расходы в размере 201,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 4 контракта, или 100 % от планового объема на сумму 201,3 млн рублей, в том числе:

- контракт на проведение проектно-изыскательских работ с ПАО «Ростелеком» от 15 марта 2022 года № CERF-01 на сумму 70,41 млн рублей по 1 344 школам (1 994 помещений). Оплачено по контракту 67,8 млн рублей. По результатам приемки работ по контракту № CERF-01 образовалась экономия в объеме 2,6 млн рублей (включена в сумму контракта № CERF-03). Подготовлены и приняты технические паспорта на 1 310 школ;

- контракт на проведение монтажных работ по установке структурированной кабельной системы от 12 июля 2022 года с ПАО «Ростелеком» № CERF-02/1 на сумму 118,5 млн рублей (79 школ). Остаток средств в объеме 2,47 млн рублей включен в сумму контракта № CERF-03;

- контракт с ПАО «Ростелеком» на проведение монтажных работ по установке структурированной кабельной системы от 07.10.2022 г. № CERF-03 на сумму 5,0 млн рублей (3 школы). Контракт исполнен;

- контракт в целях создания и организации работы единой службы оперативной помощи по номеру «122» от 6 июня 2022 года № 0103200008422001380 на сумму 9,9 млн рублей. Контракт исполнен. Согласно Дополнительному соглашению от 11.08.2022 № 071-17-2022-047/2 осуществлен на возврат экономии в объеме 2,3 млн рублей.

В целях формирования в государственных (муниципальных) образовательных организациях, инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к сети Интернет выполнены проектно-изыскательские работы, подготовлены и приняты технические паспорта на 1 310 школ.

Проведены строительно-монтажные работы на 81 объекте (118 зданиях), расположенных в городах Махачкала, Каспийск, Дербент и Хасавюрт. В 118 зданиях смонтирована структурированная кабельная система, установлено оборудование и проведена пуско-наладка. Подписаны акты приемки выполненных работ.

Для обеспечения приема, обработки вызовов (обращений) граждан по номеру «122» смонтировано техническое оборудование и проведена настройка программного обеспечения. Реализован сценарий интерактивной голосовой службы на кнопке 1 по вопросам частичной мобилизации, обеспечена круглосуточная работоспособность горячей линии.

По мероприятию «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов» проведена работа по заключению договоров на оплату услуг «Интернет» для социально значимых объектов (СЗО) непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты СЗО. При этом, органы власти и организации указывают на отсутствие предусмотренных средств в бюджете организаций на указанные цели. Договоры на оказание услуг заключены по 1 489 объектам СЗО, или 86,0 % от плана (1 732 объектов).

Согласно письму Минцифры России от 25 октября 2010 года № МШ-П18-122-47969 с 2022 года необходимо было предусмотреть финансирование оплаты услуг Интернет для социально значимых объектов в рамках бюджетов субъектов Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2023 года возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» обеспечен: 1 412 общеобразовательным организациям, 988 фельдшерско-акушерским пунктам, 688 органам местного самоуправления, 51 учреждению культуры, 5 пожарным постам.

В результате предпроектного обследования населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек установлено наличие существующих услуг подвижной радиотелефонной связи на территории 15 населенных пунктов из 44 запланированных на 2022 год. В 29 населенных пунктах ведутся работы по установке оборудования для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Срок завершения - март 2023 года.

По состоянию на 1 января 2023 года, по данным представленным ответственным исполнителем, 2 целевых показателя (индикатора), выполнены.

Доля социально-значимых объектов, имеющих доступ к сети «Интернет» составила 100 %.

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной «Интернет» по технологии WiFi – 5,68 %, или 100 % от плана.



8.3. Региональный проект «Информационная безопасность».

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Информационная безопасность» предусмотрено:

- содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления Республики Дагестан по использованию отечественного программного обеспечения;
- повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры;
- проведение мониторинга использования органами власти Республики Дагестан преимущественно отечественного оборудования;
- проведение анализа средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан;
- получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2022 году не предусматривалось.

В целях импортозамещения в 2022 году проводилось тестирование отечественного офисного программного обеспечения, в частности Единой коммуникационной платформы органов государственной власти Республики Дагестан. Кроме этого, в целях разработки ведомственных планов импортозамещения, разработаны типовые формы планов импортозамещения. Целью создания планов импортозамещения является переход на использование органами исполнительной власти Республики Дагестан отечественного офисного программного обеспечения в период 2023-2024 годы.

В целях исполнения рекомендации ФСТЭК России по переходу на отечественное решение Communicate Pro с 28 ноября 2022 года официальный республиканский почтовый домен «e-dag.ru» перенесен на данную платформу и функционирует в штатном режиме. Проведена работа по созданию учетных записей электронной почты на домене для всех сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан.

В рамках заключенных соглашений с российскими разработчиками офисного программного обеспечения, получены лицензии на российское программное обеспечение для общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) Республики Дагестан для реализации задач по цифровой трансформации образовательной отрасли.

Проведен пилотный проект по внедрению российской операционной системы и офисного программного обеспечения в 5 образовательных учреждениях Республики Дагестан, а также получено и доведено до ответственных лиц городских округов 3 990 лицензий на операционную систему

РЕД ОС для 132 ОУ городов Махачкала, Каспийск, Дербент и Хасавюрт (1210 лицензий для 70 ОУ г. Махачкала, 272 лицензии для 16 ОУ г. Каспийск, 1075 лицензий для 25 ОУ г. Дербент и 523 лицензии для 21 ОУ г. Хасавюрт). Работы по установке программного обеспечения завершены в ОУ г. Каспийск. По остальным городам – работы на стадии завершения.

Проведена работа по определению количества субъектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) и принадлежащих им объектов КИИ, а также работа по согласованию планов о проведении мероприятий в случае установления в отношении объектов КИИ уровней опасности целевых компьютерных атак.

В рамках проведенной работы выявлено 209 субъектов КИИ, у которых в ведении имеется 247 значимых объектов КИИ и 961 незначимый объект КИИ. Количество субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере: здравоохранения – 154 субъекта КИИ, связи – 13 субъектов КИИ, транспорта – 9 субъектов КИИ, энергетики – 6 субъектов КИИ, науки – 8 субъектов КИИ, топливно-энергетическом комплексе – 6 субъектов КИИ, оборонно-промышленном комплексе – 9 субъектов.

Направлен запрос в органы исполнительной власти Республики Дагестан и органы местного самоуправления Республики Дагестан об использовании в работе отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования. Для организации защищенного канала связи, защиты сети и доступа Правительственной защищенной сети министерствами и ведомствами Республики Дагестан используется криптографический шлюз безопасности ПАК VIPNET Coordinator HW 100, ПАК VIPNET Coordinator HW 100С 4х, ПАК VIPNET Coordinator HW 100 N1, ПАК VIPNET Coordinator HW 1000, включенные в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

В Агентстве по охране культурного наследия Республики Дагестан, Комитете по рыбному хозяйству Республики Дагестан, Агентстве информации и печати Республики Дагестан, Администрации МО «город Кизляр», Администрации МО «Бежтинский участок», Администрации МО «Кизлярский район», Администрации МО «Курахский район», криптографическое отечественное оборудование отсутствует.

Подготовлен запрос в органы исполнительной власти Республики Дагестан, являющиеся владельцами государственных информационных систем, об используемых на серверах средствах защиты информации.

Направлен запрос в Минцифры России о формировании Национальным удостоверяющим центром сертификатов безопасности на домены e-dag.ru и dagestan.digital. Получен TLS-сертификат безопасности российского образца (Хеш алгоритм-подписи ГОСТ Р 34.11-2012 256 бит) на домен dagestan.digital.

Исполнение мероприятия по обеспечению безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами власти Республики Дагестан перенесено на 2023 год.



8.4. Региональный проект «Цифровые технологии»

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2022 году было предусмотрено проведение следующих мероприятий:

– содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта;

– проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Республики Дагестан.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2022 году не предусмотрено.

В 2022 году проведена работа по информированию ИТ – сообщества, действующего на территории Республики Дагестан, о существующей системе мер поддержки сферы информационных технологий, а также о мерах, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83.

В республиканских СМИ, официальном телеграмм – канале, а также в информационных письмах в адрес компаний в сфере ИТ, размещена и направлена информация: о реализации новых программ Фонда содействия инновациям («Код-ЦТ», «Цифровизация -ЦТ»); о конкурсном отборе технологических компаний для участия в акселерационной программе «Спринт»; о реализации Программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса», о вебинарах для субъектов МСП; о запуске приема заявок на возмещение расходов на рекламу в интернете российского программного обеспечения и услуг в сфере ИКТ; о новом порядке государственной аккредитации ИТ-компаний и мерах поддержки аккредитованных компаний; контактные данные аккредитованных ИТ-компаний; о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета.

В целях принятия дополнительных региональных мер поддержки ИТ-компаний сформирован ряд инициатив, связанных с применением льготных налоговых ставок для организаций, осуществляющих деятельность в сфере ИТ технологий, предоставлением государственного имущества в аренду на льготных условиях, а также снижению земельного налога и налога на имущество для объектов связи и центров обработки данных.



8.5. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» было предусмотрено:

- обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде;
- обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи;
- информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию от 1 июня 2022 г. № 20 утвержден актуализирован Перечень массовых социально значимых услуг, состоящий из 94 федеральных услуг. В соответствии с данным протоколом Приказом Министерством цифрового развития цифры Республики Дагестан от 26 сентября 2022 года № 153-ОД утвержден Региональный перечень МСЗУ, состоящий из 84 услуг.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2021 года № 359 определены 84 массовых социально-значимых услуги (МСЗУ), переводимые в электронный формат. Министерством цифрового развития Республики Дагестан внесены изменения в Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2021 г. № 359, в целях приведения регионального перечня МСЗУ в соответствие с федеральным перечнем.

На 1 января 2023 г. в электронный формат переведены все 84 МСЗУ.

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 года № Пр-354, в целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием Платформы обратной связи (ПОС), создано 4 329 учетных записей (на 1 января 2022 года – 2 715), в том числе: имеющие статус «подтвержден» – 3 843 (на 1 января 2022 года – 1 938), имеющие статус «не подтвержден» (сотрудники не осуществили вход и не начали работать в ПОС) – 486 (на 1 января 2022 года – 777).

Органы местного самоуправления и их подведомственные учреждения зарегистрированы на Платформе обратной связи на 100 %.

В 2022 году обеспечено достижение плановых значений по всем 9 целевым показателям регионального проекта.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) составил 4,14 баллов, или 105 % от планового значения (3,9 баллов). Доля расходов на закупки и(или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения составила 98 % (план – 50 %).



9. Национальный проект «Культура»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Бутаева З. А.

Министр культуры Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Культура» являются:


- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз;
- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 %.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» реализуются три региональных проекта:

- 1) «Культурная среда»;
- 2) «Творческие люди»;
- 3) «Цифровая культура».

Финансирование национального проекта «Культура» в 2022 году

млн рублей

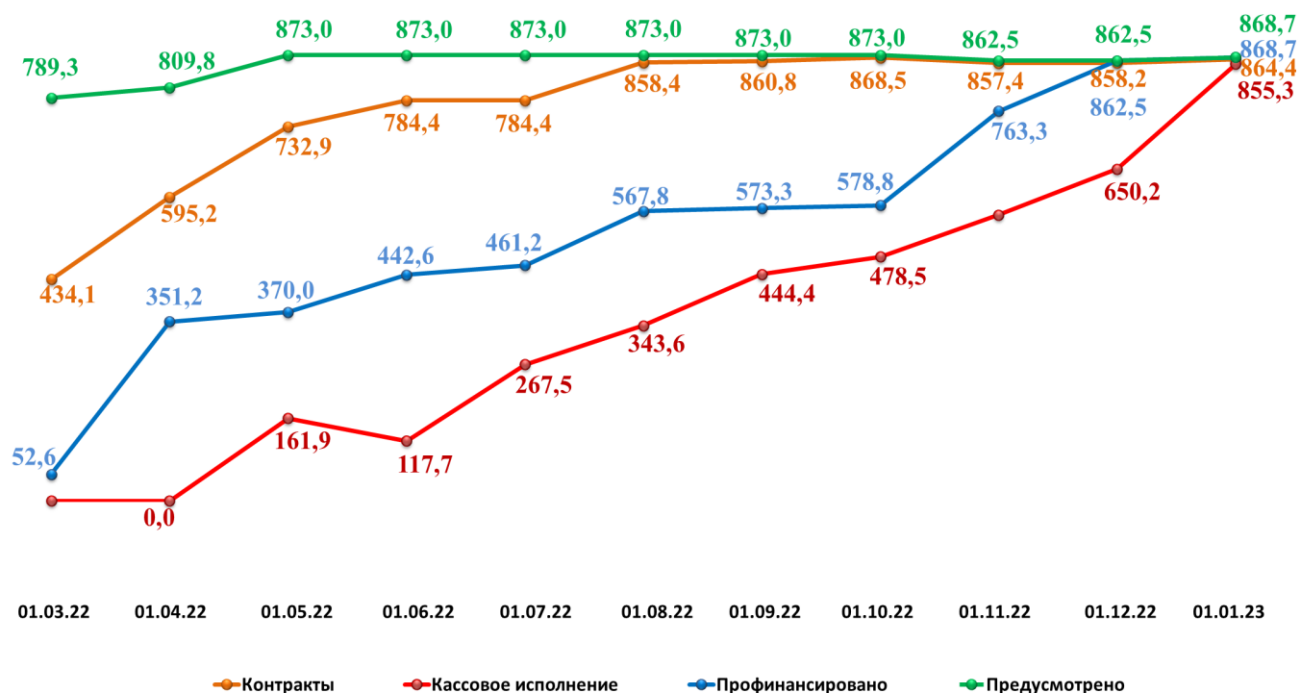

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Культура» профинансированы расходы в сумме 868,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 725,5 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 127,7 млн рублей, средства местных бюджетов – 15,5 млн рублей).

На 1 января 2023 года фактически освоено 855,3 млн рублей, или 98,5 % от объема финансирования. По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил 13,4 млн рублей, или 1,5 % от годовых назначений.

Информация о реализации региональных проектов на территории Республики Дагестан представлена в следующей таблице.

Национальные (региональные) проекты	Профинансировано	Освоено		Остатки средств на 1.01.2022 г.	
		Сумма	%	Сумма	%
НП «КУЛЬТУРА»	868,7	855,3	98,5	13,4	1,5
1. «Культурная среда»	834,9	821,5	98,4	13,4	1,6
2. «Творческие люди»	31,5	31,5	100	0,0	0,0
3. «Цифровая культура»	2,3	2,3	100	0,0	0,0

В ходе реализации национального проекта заключено 138 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 864,4 млн рублей.

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию национального проекта, 4,3 млн рублей не подлежат контрактации.

В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланировано финансирование 3 региональных проектов.

№	Региональный проект	Наименование показателей	Значения показателей		%
			План	Факт	
1	Культурная среда	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, нарастающим итогом, ед.	46	46	100
2		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, ед.	25	25	100
4	Творческие люди	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.)	1 865	1 865	100
5		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	106	106	100
6		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий	2 119	4 816	227
7	Цифровая культура	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности нарастающим итогом, ед.	4	4	100



9.1. Региональный проект «Культурная среда»

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году было предусмотрено увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, а также количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, за счет проведения следующих мероприятий:

- переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры – 25,1 млн рублей;
- техническое оснащение 3 муниципальных музеев – 19,4 млн рублей;
- создание 4 модельных библиотек – 30,0 млн рублей;
- капитальный ремонт 2 детских школ искусств – 33,2 млн рублей;
- капитальный ремонт 12 Домов культуры – 162,1 млн рублей;
- завершение строительства «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкала (переходящий объект) – 417,8 млн рублей;
- завершение строительства Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан (переходящий объект) – 73,6 млн рублей;
- благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр – 40,4 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 834,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 721,4 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 98,0 млн рублей, средства местных бюджетов – 15,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 821,5 млн рублей, или 98,4 % от объема финансирования (834,9 млн рублей). Неосвоенный (неиспользованный) остаток средств составил 13,4 млн рублей, или 1,6 % от объема финансирования.

По состоянию на 1 января 2023 года в рамках мероприятий регионального проекта проведена следующая работа:

- 1) Переоснащены 5 образовательных учреждений в сфере культуры (с. Новый Кумух, Буйнакский район, город Махачкала, город Дагестанские Огни, с. Кумух, Лакский район, село Новый Хушет, город Махачкала) – 25,1 млн рублей;
- 2) Оснащены 3 муниципальных музея (город Махачкала, город Каспийск, Табасаранский район, с. Хучни) – 19,4 млн рублей;
- 3) Открыты 4 модельные библиотеки: ЦГБ МБУ «Централизованная библиотечная система г. Махачкала», Филиал № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Каспийск» имени Ф. Алиевой, ЦГБ МКУ «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Кизилюрт», городская библиотека – филиал №1 МКУ «Централизованная библиотечная система г. Избербаш»;

4) Проведен капитальный ремонт 2 детских школ искусств: МКУ ДО «ДШИ в с. Маджалис», МКУ ДО «ДШИ в с. Уркарах» – 30,0 млн рублей;

5) Завершено строительство «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект с 2020 года).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 2324-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с ростом цен на строительные ресурсы в 2022 году выделены дополнительные средства в объеме 85,42 млн рублей.

В результате внесения существенных изменений в проектно-сметную документацию, а также приобретения монтируемого оборудования по прайс-листам рыночной стоимости была образована экономия на сумму 13,38 млн рублей.

В заключенный государственный контракт от 14 мая 2020 года № 2056206403420000008 Дополнительным соглашением от 28 декабря 2022 года № 10, были внесены корректировки с учетом фактически выполненных работ в части снижения стоимости на сумму 13,38 млн рублей.

В этой связи направлено обращение в адрес Министерства культуры Российской Федерации о корректировке объемов финансирования 2022 года посредством возврата сэкономленных средств в сумме 13,09 млн рублей в федеральный бюджет. Однако по состоянию на 1 января 2023 года средства не возвращены в федеральный бюджет.

б) Капитально отремонтированы 12 Домов культуры, техническая готовность по объектам составляет 100 % (перечень объектов приведен в таблице).

По состоянию на 1 января 2023 года не завершено строительство 2 объектов, в том числе:

– Центр культурного развития г. Кизляр (переходящий объект с 2021 года), строительная готовность – 36 %. По состоянию на 1 января 2023 года освоено 105,1 млн рублей, или 98,3 % от годовых назначений (106,9 млн рублей (из них 33,3 млн рублей дополнительные средства из резервного фонда)). Неосвоенный остаток составил 1,8 млн рублей, или 1,6 % от объема годовых назначений.

В связи с низкими темпами проведения строительных работ частично перенесены на 2023 год ранее предусмотренные на 2022 год средства в сумме 60,6 млн рублей. Общий объем средств по объекту на 2022 год составил 73,6 млн рублей, вместо ранее предусмотренных 134,2 млн рублей;

– Благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в г. Кизляре, строительная готовность 10 %.

В целях снижения риска неосвоения частично перенесены на 2023 год предусмотренные на 2022 год средства в сумме 35,3 млн рублей. Общий объем средств по объекту на 2022 год составил 40,4 млн рублей, вместо ранее предусмотренных – 75,7 млн рублей. По состоянию на 1 января 2023 года освоено 40,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

**Перечень
объектов, подлежащих строительству, капитальному ремонту,
в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году**

млн рублей

№	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства	Мощность		Преду смотре но	Кассовое освоение (млн. руб.)	Остаток (млн руб.)	Технич. готовность объекта (%)
		колич. мест	ед. изм				
1	Капремонт Дома культуры в с. Калининаул, Казбековский район	400	мест	3,76	3,76	0,0	100 %
2	Капремонт Дома культуры в с. В. Гаквари, Цумадинский район	130	мест	7,75	7,75	0,0	100 %
3	Капремонт Дома культуры в с. Урахи, Сергокалинский район	600	мест	7,42	7,42	0,0	100 %
4	Капремонт Дома культуры в с. Янгикент, Кайтагский район	260	мест	21,82	21,82	0,0	100 %
5	Капремонт Дома культуры в с. Кули, Кулинский район	200	мест	19,65	19,65	0,0	100 %
6	Капремонт Дома культуры в с. Урада, Шамильский район	200	мест	13,49	13,49	0,0	100 %
7	Капремонт Дома культуры в с. Цахур, Рутульский район	200	мест	4,64	4,64	0,0	100 %
8	Капремонт Дома культуры в с. Чагаротар, Хасавюртовский район	180	мест	19,46	19,46	0,0	100 %
9	Капремонт Дома культуры в с. Хараг, Табасаранский район	120	мест	11,71	11,71	0,0	100 %
10	Капремонт Дома культуры в с. Смугул, Ахтынский район	100	мест	6,59	6,59	0,0	100 %
11	Капремонт Дома культуры в с. Хучни, Табасаранский район	450	мест	22,93	22,93	0,0	100 %
12	Капремонт Дома культуры в с. Ахты, Ахтынский район	200	мест	22,85	22,85	0,0	100 %
13	Капремонт МКУ ДО «Детская школа искусств в с. Маджалис»	375	обуч.	13,69	13,69	0,0	100 %
14	Капремонт МКУ ДО «Дахадаевская районная школа искусств»	515	обуч.	19,53	19,53	0,0	100 %
15	Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка»	7 645,3	кв.м	417,8	417,8	0,0	100 %
16	Строительство Центра культурного развития в г. Кизляре	1 517	кв.м	106,9	106,9	0,0	36 %
	Благоустройство территории ЦКР в г. Кизляре	-	-	40,4	40,4	0,0	10 %

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.	46	46	100
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, ед	25	25	100

Мероприятия, обеспеченные финансированием, не выполнены в полном объеме. Однако, обеспечено выполнение 2 целевых показателей.



9.2. Региональный проект «Творческие люди».

На реализацию регионального проекта профинансированы и освоены расходы в сумме 31,5 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений. (средства федерального бюджета – 4,1 млн рублей, республиканского бюджета – 27,4 млн рублей, местных бюджетов – 0,04 млн рублей).

Заключены 30 контрактов, или 100 % от плана на сумму 27,2 млн рублей.

В рамках регионального проекта оказана поддержка муниципальным учреждениям культуры сельских поселений путем выплаты 29 поощрений по 100 тыс. рублей (2,9 млн рублей), а также лучшим работникам муниципальных учреждений культуры – 26 премий по 50 тыс. рублей (1,3 млн рублей). Кроме этого, проведены:

- фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России», (г. Махачкала, 12 июня 2022 г) – 0,55 млн рублей;
- программы для школьников – 0,3 млн рублей;
- Республиканский форум «Волонтеры культуры» – 0,25 млн рублей;
- 3 международных творческих проекта (XX Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи», Международный театральный фестиваль «Русская сцена») – 13,0 млн рублей;
- фестиваль «Дербент перекрёсток цивилизаций», X Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары» – 7,55 млн рублей;
- 17 выставочных проектов региональных музеев в регионах России – 5,0 млн рублей;
- творческий фестиваль для детей и молодежи «Наши надежды», с 27 ноября по 4 декабря 2022 г. (0,4 млн рублей);

Прошли обучение 629 работников культуры, или 100 % от плана (0,2 млн рублей). Всего с начала реализации проекта прошло обучение 1 865 работников.

Выполнение показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.)	1 865	1 865	100
2	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов,	106	106	100
3	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий	2 119	4 816	227

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, обеспечено достижение плановых значений по всем 3 целевым показателям регионального проекта.



9.3 Региональный проект «Цифровая культура».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» в 2022 году было предусмотрено увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, до 4 единиц за счет создания мультимедийного гида по экспозициям на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» (2 зал).

По состоянию на 1 января 2023 года профинансировано и освоено 2,3 млн рублей (средства республиканского бюджета), или 100 % от годовых назначений.

В рамках реализации регионального проекта заключен 1 контракт, или 100 % от плана на сумму 2,3 млн рублей.

Поставлено и смонтировано оборудование, проведены пуско-наладочные работы.

Фактическое значение целевого показателя «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, нарастающим итогом» по состоянию на 1 января 2023 года составило 4 единицы и обеспечено за счет создания в период с 2019 года по 2022 год 4 мультимедийных гидов в ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой» (2019 год), в ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (2020 год), в ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи», 1 зал (2021 год), в ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» 2 зал (2022 год).

Следует отметить, что целевой показатель по региональному проекту не отражает эффективность реализации мероприятий с точки зрения востребованности и охвата аудитории: количество онлайн-трансляций, число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры и др. Таким образом, отсутствует возможность оценки эффективности достижения общественно значимого результата «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям проводимых культурно-массовых мероприятий».



10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов



Хрюкин А. Р.

Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан


Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основной целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

- 1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»);
- 2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»);
- 3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

**Финансирование национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство» в 2022 году**

млн рублей

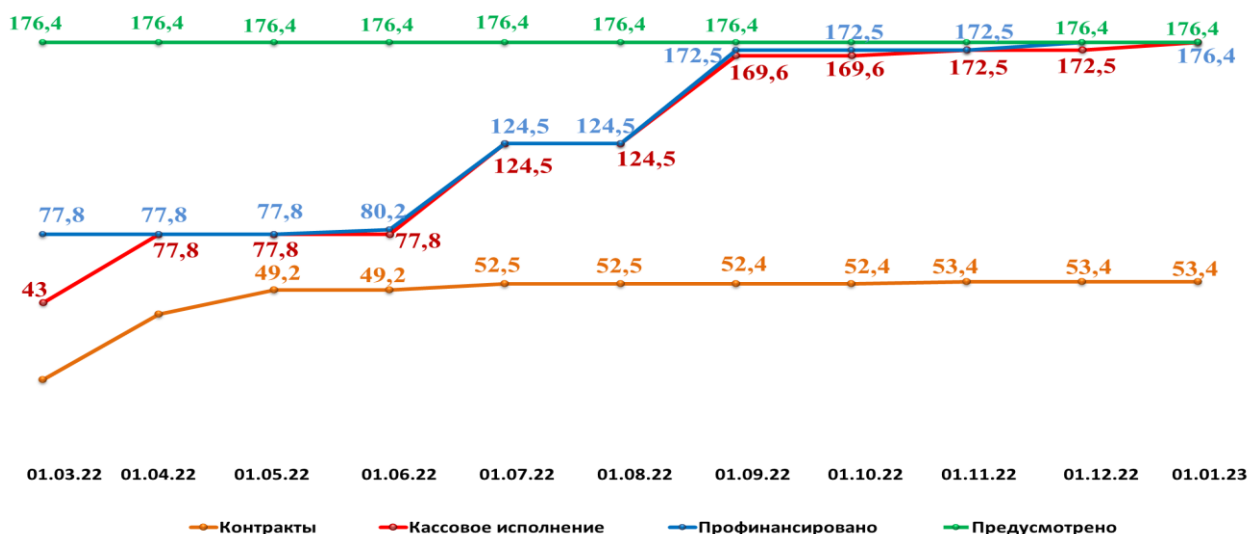

Реализацию национального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (81,7 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (94,7 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года профинансированы и освоены расходы в размере 176,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 174,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,76 млн рублей).

В рамках национального проекта заключено 89 контрактов по 3 региональным проектам на общую сумму 53,4 млн рублей, или 100 % от плана.



10.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»)

В ходе реализации регионального проекта «Поддержка самозанятых» запланировано предоставление консультационных, информационных и образовательных форм поддержки самозанятым гражданам.

На реализацию регионального проекта профинансировано и освоено 13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 13,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан освоение годовых назначений обеспечено за счет перечисления 13,3 млн рублей ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятий по развитию центров «Мой бизнес».

В рамках регионального проекта заключено 18 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 12,5 млн рублей в целях проведения мероприятий:

– продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» на общественном транспорте – 1 контракт на сумму 0,26 млн рублей;

– маркетинговые услуги (Логобуки) – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей. Услуги оказаны 30 самозанятым гражданам;

– консультации по вопросам самозанятости – 1 контракт на сумму 0,5 млн рублей. Оказаны консультации 508 самозанятых граждан;

– содействие в популяризации продукции самозанятых граждан – 2 контракта на сумму 1,8 млн рублей. Услуги оказаны 12 самозанятым гражданам;

– содействие в размещении самозанятых граждан, на электронных торговых площадках («Ozon», Вайлдберриз) – 2 контракта на сумму 1,8 млн рублей. Услуги оказаны 12 самозанятым гражданам;

– проведение Международной выставки «Клинок-Традиции и современность» – 1 контракт на сумму 1,25 млн рублей. В выставке-ярмарке приняли участие 4 самозанятых граждан;

– проведение V Международной выставки легкой промышленности «Красная нить» – 1 контракт на сумму 1,25 млн рублей. В выставке приняли участие 4 самозанятых граждан;

– проведение выставки ярмарки «Благословенный Кавказ» и «Ювелирные традиции 2022» – 1 контракт на сумму 1,45 млн рублей. В выставке-ярмарке приняли участие 4 самозанятых граждан;

– проведение Международной выставки-ярмарки народно-художественных промыслов России «Ладья Зимняя сказка – 2022» – 1 контракт на сумму 1,45 млн рублей. В выставке-ярмарке приняли участие 5 самозанятых граждан;

– обучение интернет-маркетингу – 1 контракт на сумму 0,2 млн рублей. Обучены 12 самозанятых граждан;

– внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес» – 1 контракт на сумму 0,13 млн рублей;

– проведение 3 мастер-классов – 3 контракта на сумму 0,45 млн рублей. Проведены мастер-классы с участием 116 самозанятых граждан.

Средства 0,8 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальные расходы, командировки, не контрактуются.

Согласно данным Единого реестра СМПС по состоянию 1 января 2023 года фактическое значение по целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД)», составило 211,5 тыс. человек, что в 14,4 раза превышает плановое значение (14,7 тыс. человек).

Согласно отчету Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан количество самозанятых составило 211,98 тыс. человек, или больше на 0,48 тыс. человек по сравнению с данным Единого реестра СМПС.

По сравнению с 2021 годом (37,83 тыс. человек) количество самозанятых увеличилось на 173,7 тыс. человек. Указанное свидетельствует о значительном занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.

Количество самозанятых граждан, получивших консультационные услуги и прошедших программы обучения с начала реализации регионального проекта, составило 707 человек, или 107,9 % от плана (655 человек);

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам, составил 5,65 млн рублей, или 182,3 % от планового объема (3,1 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года Центром «Мой бизнес» зарегистрировано 643 самозанятых граждан, что на 361 человек больше по сравнению с 2021 годом.

По данным информационного ресурса «Налог на профессиональный доход» на территории Республики Дагестан на 1 января 2023 года снялось с учета самозанятых – 25 181 лиц, или больше на 17 723 лиц по сравнению с 2021 годом (7 458 лиц). Вместе с тем, сумма начисленного налога на профессиональный доход за 2022 год составила 252,6 млн рублей, или увеличилась на 201,5 млн рублей по сравнению с 2021 годом (51,1 млн рублей).

Поступления от налогоплательщиков за 2022 год составили 145,6 млн рублей, или увеличилась на 104,1 млн рублей по сравнению с 2021 годом (41,5 млн рублей).

За 2022 год налогоплательщиками НПД было «выбито» 6 497,7 тыс. чеков, или больше на 4 451,1 тыс. чеков по сравнению с 2021 годом (2 046,6 тыс. чеков) суммарный облагаемый доход по которым составил 7,6 млн рублей, или увеличился на 5,9 млн рублей по сравнению с 2021 годом (1,69 млн рублей), средний доход по одному чеку – 1,2 тыс. рублей или больше на 0,4 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом (824 рубля).



10.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»)

Мероприятия регионального проекта направлены на оказание информационной, консультационной, финансовой форм поддержки начинающим деятельность субъектам МСП за счет:

- развития деятельности центров «Мой бизнес» – 23,6 млн рублей;
- предоставления грантов социальным предприятиям – 3,9 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансировано 27,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 27,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоено 27,5 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан указанные средства (27,5 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» заключены 36 контрактов на общую сумму 22,3 млн рублей, или 100 % от плана. Оставшиеся средства в размере 1,3 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальные услуги, командировки, не контрактуются.

В рамках регионального проекта проведены следующие мероприятия:

- обучающие мастер-классы (г. Махачкала, г. Буйнакс) – (440 физ. лиц);
- обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» – «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства» – (201 физическое лицо и 25 субъектов МСП);
- обучающие однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП», в которых приняли участие 182 физических лица и 51 субъект МСП;
- образовательные программы для детей 14-17 лет (438 физических лиц) и олимпиад (3 555 физических лиц) в районах Дагестана;
- конкурс «100 лучших товаров и услуг» – 31 субъект МСП;
- конкурс «Молодой предприниматель 2022» – 20 СМСП;
- обучение основам социального предпринимательства – 11 СМСП;
- внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес»;
- экспресс оценка индекса технологической готовности – 8 СМСП;
- содействие в размещении продукции на электронных торговых площадках – 12 СМСП.

Оказаны услуги (консультационные услуги) по:

– вопросам начала ведения бизнеса, ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам, и другим актуальным направлениям 1 626 физических лиц и 813 субъектам МСП;

– составлению бизнес-планов (ТЭО) – 30 субъектам МСП, сертификации продукции – 16 субъектам МСП, финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП – 12 субъектам МСП, НХП – 31 субъект МСП, электронно-информационные услуги – 19 субъектов МСП;

– содействию в популяризации продукции субъекта малого и среднего предпринимательства – 20 СМСП;

– продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» в средствах массовой информации.

По результатам реализации регионального проекта:

– количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения составило – 4,8 тыс. человек, или 112,6 % от планового значения (4,3 тыс. чел);

– количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям – 48 единиц, или 129,7 % от плана (37 ед.);

– объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составило 60,8 млн рублей, или 844,4 % от плана (7,2 млн рублей);

– количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составляет 7,5 тыс. единиц, или 124,2 % от плана (6,04 тысяч единиц);

– субъектам МСП созданным физическими лицами до 25 лет включительно, оказан комплекс услуг и финансовая поддержка в виде грантов – 26 грантов, или 325 % от плана (8 единиц).

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 23 микрозайма начинающим предпринимателям на общую сумму 57,7 млн рублей.

Гарантийным фондом в 2022 году выдано 16 поручительств начинающим предпринимателям на сумму 28,1 млн рублей.



10.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В ходе реализации регионального проекта было предусмотрено создание комплексной системы акселерации, включающей инструменты поддержки субъектов МСП, в ходе проведения следующих мероприятий:

- развитие деятельности центров «Мой бизнес» – 5,81 млн рублей;
- оказание экспортной поддержки субъектам МСП – 13,72 млн рублей;
- докапитализация Гарантийного фонда – 21,3 млн рублей;
- поддержка фермеров (предоставления грантов «Агростартап» и субсидий сельскохозяйственно-кооперативам) – 94,75 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансировано 135,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 134,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,3 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года фактически освоено 135,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, согласно заключенным соглашениям профинансированные средства перечислены подведомственным организациям:

– ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» – 5,81 млн рублей;

– АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» – 13,72 млн рублей;

– Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан в целях реализации мероприятия «Развитие региональных гарантийных организаций» – 21,35 млн рублей;

– Гарантийному фонду Республики Дагестан – 94,75 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта заключены 35 контрактов, или 100 % от планового объема, на сумму 18,6 млн рублей.

Гарантийным фондом Республики Дагестан в 2022 году выдано 237 поручительств на общую сумму 973,0 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 136 микрозаймов на общую сумму 421,7 млн рублей.

ГАУ РД «Центром поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказаны комплексные услуги 341 субъекту МСП (план 319 ед.), в ходе проведения следующих мероприятий:

– обучающее мероприятие на тему «Основы Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года. N 44-ФЗ, и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ» – 52 субъекта МСП;

– обучающая программа «Развитие женского предпринимательства» – 120 субъектов МСП;

– скоринг субъектам МСП – 35 субъектов МСП;

– маркетинговые услуги (создание логобуков) – 31 субъект МСП;

– маркетинговые услуги (фирменный стиль) – 30 субъектов МСП;

– электронно-информационные услуги – 52 субъекта МСП;

– сертификация продукции/услуги – 17 субъектов МСП;

– экспресс-оценки индекса технологической готовности – 2 СМСП;

– анализ потенциала малых и средних предприятий – 2 СМСП;

– стажировка по России – 2 сотрудника центра инжиниринга;

– внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес».

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» средства предусмотренные на реализацию мероприятий освоены в полном объеме (13,72 млн рублей), так же оказаны следующие услуги:

– организованы и проведены международные бизнес-миссии – 10 СМСП;

– организованы и проведены реверсные бизнес-миссии – 52 СМСП;

– организованы выставочно-ярмарочные мероприятия в иностранных государствах – 7 СМСП;

– организованы выставочно-ярмарочные мероприятия на территории РФ – 5 СМСП;

– привлечение на услуги группы РЭЦ – 242 СМСП;

– регистрация и продвижение МСП на международной электронной торговой площадке – 12 СМСП;

– содействие в поиске и подборе иностранного покупателя – 35 СМСП (в том числе силами Центра 7 СМСП);

– создание сайта на иностранном языке – 3 СМСП;

– сопровождение экспортного контракта – 3 СМСП.

Заключены 17 экспортных контрактов (план 17 контрактов). Объем экспорта составил 7,7 млн долл США.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализуются мероприятия с общим объемом в сумме 94,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,8 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,95 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года профинансировано 94,75 млн рублей или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 94,75 млн рублей, или 100 % от предусмотренного, в том числе по следующим мероприятиям:

- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 44,3 млн рублей;
- софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 2,4 млн рублей;
- оказание поддержки фермерам в виде предоставления грантов по программе «Агростартап» – 48,1 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта предоставлены субсидии 15 СПоК (или 115,4 %) из 7 районов республики.

Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров перечислено 2,4 млн рублей.

Заключены соглашения с 16 победителями конкурса по предоставлению грантов «Агростартап». Средства перечислены в полном объеме. Кроме того, предоставлена государственная поддержка 31 субъектам МСП.

По результатам реализации регионального проекта:

- количество новых рабочих мест, созданных КФХ, получившими грант «Агростартап», составляет 48 единицы, или 129,7 % от плана (37 единиц);
- количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан – 702 единицы, или 100,3 % от планового объема (700 единиц);
- количество КФХ, ИП и СПОК, получивших государственную поддержку – 68 единицы, или 151,1 % от планового объема (45 единиц);
- количество действующих микрозаймов, выданных МФО – 636 микрозаймов, или 142,3 % от планового объема (447 микрозаймов);
- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций – 1 741,8 млн рублей, или 881 % от планового объема (197,8 млн рублей);
- ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта – 7,7 млн долларов, или 104,1 % от плана (7,4 млн долларов);
- количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 17 единиц, или 100 % от плана;
- оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса – 341 единица, или 107 % от плана (319 единиц).

По объемам финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, фактическое значение значительно превышает плановое значение (881 %), что свидетельствует о занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой

По результатам оказанных услуг учреждениями, подведомственными Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, в ходе реализации национального проекта, наибольший удельный вес поддержки в 2022 году получили субъекты МСП, осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, в том числе:

– Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан оказана поддержка субъектам МСП в следующих отраслях: торговля – 43%, сфера услуг – 27%; производство – 16%; сельское хозяйство и здравоохранение по 5%; строительство – 3 %;

– ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказана поддержка субъектам МСП в следующих отраслях: торговля – 49%, сфера услуг – 42%, строительство – 3%, общественное питание – 3% и прочие виды деятельности – 3%;

– Гарантийным фондом РД оказана поддержка субъектам МСП в следующих отраслях: торговля – 54%, прочие виды деятельности – 15%, производство – 14%, строительство – 5%, здравоохранение – 4%, сельское хозяйство – 4%, АЗС – 4%, туризм – 1 %;

– АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» оказана поддержка субъектам МСП в следующих отраслях: агропромышленный комплекс – 49%, промышленность – 40%, услуги – 12%.

Агентством не осуществляется поддержка субъектов МСП созданных в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе, экспортно-ориентированном секторе. В результате наибольший удельный вес поддержки в 2022 году получили субъекты МСП в сфере торговли и прочих видов деятельности.

В ходе анализа данных Единого реестра субъектов МСП (<https://ofd.nalog.ru>) по состоянию на 10 января 2023 года, наблюдается динамика роста следующих показателей развития малого и среднего предпринимательства по Республике Дагестан:

– численность занятых в сфере МСП по Республике Дагестан составила 44 004 человек, что на 1 715 человека больше по сравнению с показателями на 10 января 2022 года (42 289 чел.). Количество вновь созданных субъектов МСП за 2022 год составило – 11 878 субъектов МСП или уменьшилось на 701 субъект МСП по сравнению с 2021 годом (12 579 МСП);

– среднесписочная численность работников, занятых у субъектов МСП – 54 869 человек, или больше на 2 951 человек по сравнению с показателями на 10 января 2022 года (51 918 чел.);

– занимаются производством – 49 субъектов МСП или больше на 34 субъекта МСП по сравнению с данным на 10 января 2022 года (15 МСП).

Проведенный анализ показал, что в 2022 году, реализуемые в рамках национального проекта мероприятия оказали положительное влияние на рост: численности, занятых в сфере МСП; среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП; количества субъектов МСП, занимающихся производством.



11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Халилов Н. Р.

Министр промышленности и торговли
Республики Дагестан



Хрюкин А. Р.

Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» являются:

– вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности;

– формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;

– достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долларов США в г. и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долларов США в г., а также объема экспорта оказываемых услуг – 100 млрд долларов США в год.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт»:

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан);

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан)).

В 2022 году финансирование национального проекта не предусмотрено.

Ответственными исполнителями реализации регионального проекта являются:

– Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;

– Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.



11.1. Региональный проект «Промышленный экспорт».

В ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» предусмотрено увеличение объема экспорта продукции машиностроения до 5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,0 млн долларов США.

В 2022 году в соответствии с паспортом федерального проекта «Промышленный экспорт» отсутствует региональная составляющая и не предусмотрено финансирование субъектов Российской Федерации.

Во исполнение мероприятий регионального проекта Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан проведена следующая работа.

Предприятиям Республики Дагестан направлены справочные материалы о поддержке, осуществляемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 931 «О государственной поддержке российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением НИОКР и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков».

3 февраля 2022 г. состоялось IV заседание рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества Постоянной Российско-Иранской комиссии, в ходе которого обсуждены вопросы поставок продукции предприятий республики и создания совместных производств на территории Республики Дагестан.

С 28 по 29 апреля 2022 года министр промышленности и торговли Республики Дагестан в составе официальной делегации Российской Федерации под руководством Директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации России В.П. Хоценко принял участие в Итоговом заседании Российско-Белорусской рабочей группы по импортозамещению (г. Минск, Республика Беларусь).

Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан подготовлен материал для белорусской стороны по логистическим маршрутам и возможностям направления грузов (продукции белорусских предприятий) через транспортные пути Республики Дагестан, задействовав, в том числе, мощности Махачкалинского торгового порта.

С 30 июня по 2 июля 2022 года в г. Гродно Республики Беларусь официальная делегация Республики Дагестан приняла участие в IX форуме регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества углублении интеграционных процессов Союзного государства». Подписан

«План мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Дагестан и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» от 23 августа 2022 года № 11. По итогам достигнутых договоренностей в период с 18 по 20 октября 2022 года Республику Дагестан посетила делегация РУП «Белтаможсервис».

В декабре 2022 года состоялись визиты в Республику Дагестан представителей белорусских организаций РУП «Белтаможсервис», ОАО «Минский тракторный завод» и Концерна «Беллегпром», в рамках которых состоялись встречи с руководством Республики Дагестан.

С 22 по 25 июня 2022 года состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Иранской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали в Республику Дагестан. В рамках визита состоялась встреча с Главой Республики Дагестан С.А. Меликовым, в ходе которой обсуждены вопросы укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

В период с 25 по 27 июля 2022 года Республику Дагестан посетила делегация Посольства Объединенных Арабских Эмиратов под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммада Ахмад Аль-Джабера. По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности в сфере развития туризма, образования, промышленности и продовольственной безопасности.

1 сентября 2022 года представители Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан приняли участие в рабочей встрече с управляющим директором иранской компании Лазир Агро Хасаном Афрахтех, на которой обсуждены вопросы получения земельных участков для строительства завода по переработке риса на территории Кизлярского района Республики Дагестан, заводов по производству водных кормов в прибрежной зоне Каспийского моря, возможности функционирования грузовых судов в акватории Каспийского моря и установления предполагаемого объема ловли кильки иранской стороной.

В период с 17 по 19 октября 2022 года Республику Дагестан посетила узбекская делегация во главе с Генеральным консулом Республики Узбекистан в г. Ростове-на-Дону Б.А. Аликуловым. В ходе визита состоялись встречи с Главой Республики Дагестан С.А. Меликовым, руководством министерств Республики Дагестан и предприятий обувной промышленности, в рамках которых состоялось обсуждение направлений развития двустороннего сотрудничества.

В период с 5 по 6 октября делегация Республики Дагестан приняла участие в работе II Каспийского экономического форума. В ходе Форума обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области экологии, энергетики, транспорта и логистики, энергетики и туризма, городской инфраструктуры и социально-гуманитарной сферы.



11.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 году до 33,0 млн долл. США, в том числе в 2022 году до 28,5 млн долл. США.

Согласно дополнительному соглашению от 29 декабря 2020 года № 082-08-2020-461/2, заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» в 2022 году предусматривалось финансирование в сумме 20,8 млн рублей на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий на проведение мелиоративных работ. Планировалось увеличение площади мелиоративных работ на землях сельхозназначения на 500 га, или до 2 450 га с момента реализации регионального проекта (2019 год).

В дальнейшем, дополнительным соглашением от 12 января 2022 года № 082-2019-Т20050-1/9 индикаторы 2022 – 2023 годов были обнулены, в связи с чем софинансирование на реализацию регионального проекта в текущем году не предусмотрено.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

В рамках регионального проекта в 2019-2021 годах проведены мероприятия по государственной поддержке в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортноориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном баранина и рис). Площадь проведенных работ в 2019-2021 годах доведена до 2 206 га (при плане 1 950 га или 113,1 % плана).

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК на 1 декабря 2022 года в сопоставимых ценах составил 82,6 млн дол. США, или 289,8 % от планового значения по целевого показателя на 2022 год (28,5 млн дол. США).



11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Региональный проект реализуется на основании заключенных в 2019 году соглашений между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории Республики Дагестан».

Дополнительным соглашением от 18 декабря 2020 года № 2019-Т6007-1/1, заключенным между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан, основным целевым показателем проекта определен «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0».

Дополнительным соглашением от 30.06.2022 г. №2019-Т6007-1/4 изменен перечень инструментов РЭС 2.0 обязательных для внедрения в Республике Дагестан в 2022 году. Дополнительным соглашением от 24.10.2022 г. №2019-Т6007-1/5 изменен срок внедрения РЭС 2.0 с 2022 года на 31.12.2023 г.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан.

В целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан в 2022 году обеспечено внедрение 7 инструментов РЭС 2.0 из 15 необходимых. Уровень внедрения составил 60 %.

Создан Экспортный совет при Главе Республики Дагестан (Указ Главы Республики Дагестан от 24.08.2022 г. № 171).

Сформирована управленческая команда по развитию экспорта в Республике Дагестан, состав которой утвержден распоряжением Правительства Республики Дагестан от 30.08.2022 г. № 395-р.

Сформирована база экспортно-ориентированных производителей товаров и услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

Создан Центр поддержки экспорта Республики Дагестан.

В целях организации комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, с потенциальными зарубежными контрагентами проводятся бизнес-миссии дагестанских предпринимателей за рубеж, а также организовывается их участие на международных выставках.

В целях создания и развития механизма популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи, проводятся форумы и конференции по экспортной тематике, с участием экспортно-ориентированных предприятий.

В целях развития экспортной деятельности через каналы электронной торговли, предоставляются услуги по регистрации предпринимателей на международных маркетплейсах.



12. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»



Куратор национального проекта:
Алиев Р.А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов



Султанов Г.Р.

Министр экономики и территориального
развития Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» являются:

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год;
- привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно;
- вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализуются 2 региональных проекта:

- 1) *«Системные меры по повышению производительности труда»;*
- 2) *«Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».*

Ответственным исполнителем национального проекта «Производительность труда» являются Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 января 2023 года профинансированы и освоены расходы в размере 6,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В рамках национального проекта в 2022 году заключены 2 прямых договора, или 100 % от плана на общую сумму 6,5 млн рублей.

В 2022 году из 2 региональных проектов, было предусмотрено финансирование регионального проекта «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».



12.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году было предусмотрено:

– создание производственной площадки «Фабрика процессов» по обучению сотрудников предприятий инструментам бережливого производства – 4,5 млн рублей;

– проведение мероприятий по привлечению региональных центров компетенций из иных субъектов Российской Федерации – 2,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта профинансированы и освоены средства в сумме 6,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года № 138 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда» проведен отбор и определено юридическое лицо по передаче предусмотренных финансовых средств на реализацию мероприятий национального проекта (АО «Корпорация развития Дагестана»).

АО «Корпорация развития Дагестана» заключены 2 договора, или 100 % от плана на сумму 6,5 млн рублей, в том числе:

– договор с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» от 30.08.2022 г. № 10/22 на сумму 4,5 млн рублей, на оказание услуг по организации учебной производственной площадки «Фабрика процессов»;

– договор с НО «Фонд Содействия Инновационному Развитию Ставропольского края» от 1.08.2022 г. № 09/22 на сумму 2,0 млн рублей на оказание консультативных услуг в области управления предприятием по привлечению экспертов Регионального центра компетенций Ставропольского края на АО «Концерн КЭМЗ».

Площадка для создания «Фабрика процессов» предоставлена ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».

Работы по созданию «Фабрики процессов» завершены, подготовлены 4 тренера для дальнейшего проведения обучающих мероприятий по принципам бережливого производства на указанной производственной площадке.

1 декабря 2022 года проведена сертификация «Фабрики процессов» с участием представителей ФЦК.

В целях достижения показателя «Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)» экспертами Федерального Центра Компетенций были определены 3 предприятия (АО «Аэропорт Махачкала», ООО «Дагестан Стекло

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт») при плане 2 предприятия. Общее количество обученных сотрудников предприятий составляет 50 человек (139 % от плана), в том числе 15 сотрудников ООО «Дагестан Стекло Тара», 12 сотрудников АО «Аэропорт Махачкала» и 23 сотрудников АО «Махачкалинский морской торговый порт».

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%	Примечание
		План	Факт		
1	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом (единиц)	2	3	150	АО «Дагестан Стекло Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала»
2	Количество предприятий-участников внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом (единиц)	1	1	100	АО «Концерн КЭМЗ» привлечено РЦК Ставропольского края
3	Количество предприятий-участников внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом (единиц)	5	5	100	АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Завод «Дагдизель», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон»
4	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом (человек)	36	50	139	15 сотрудников АО «Дагестан Стекло Тара», 23 сотрудников АО «Махачкалинский морской торговый порт», 12 сотрудников АО «Аэропорт Махачкала»
5	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом (человек)	10	23	230	РЦК Ставропольского края обучено 23 сотрудника АО «Концерн КЭМЗ»
6	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом (человек)	40	50	125	17 работников АО «Завод Дагдизель»; 24 работника АО «Международный аэропорт «Махачкала»; 9 работников АО «Кизлярагрокомплекс»
7	Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом (единиц)	8	9	113	
8	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение по повышению производительности труда, нарастающим итогом (человек)	86	125	145	
9	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте (процент)	50	50	100	

Мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты.



12.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для повышения производительности труда, в том числе:

- обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности»;
- оказание помощи в выходе на экспорт;
- международное сотрудничество и организация международных стажировок участников национального проекта;
- профессиональная переподготовка и аудит рабочих мест, возрождение движения рационализаторов при поддержке специалистов WorldSkills).
- цифровая экосистема производительности.
- нефинансовые меры поддержки (рейтинг наставничества).

Финансирование регионального проекта» не предусмотрено.


В рамках реализации регионального проекта в 2022 году продолжается работа по привлечению сотрудников предприятий-участников к участию в программе профессиональной переподготовки «Лидеры производительности». Обучение по программе передготовки управленческих кадров прошли по одному представителю от АО «Кизлярагрокомплекс» и АО «Завод «Дагдизель», а также 3 представителя от АО «Концерн «КЭМЗ».

В настоящее время обучение по программе проходят по два сотрудника из руководящего звена АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель».

По программе «Акселератор экспортного роста», прошел обучение 1 представитель от АО «Кизлярагрокомплекс».

В 2022 году в рамках регионального проекта предусмотрено проведение регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Принят Указ Главы Республики Дагестан от 27 июня 2022 года № 137 «О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан». Конкурс проведен, определен победитель конкурса (токарь 5 разряда АО «Концерн КЭМЗ» Сляров Валерий Константинович). Победитель конкурса награжден дипломом 1 степени.

По итогам 2022 года обеспечено достижение целевого показателя «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом» – 4 человека.

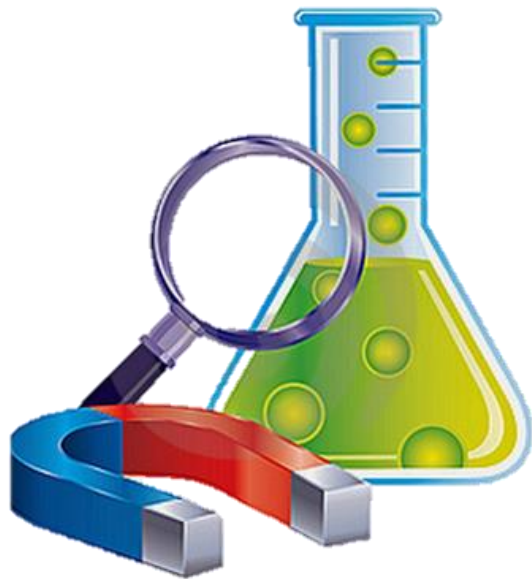

13. Национальный проект «Наука и университеты»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Бучаев Яхья Гамидович

Министр образования и науки Республики
Дагестан

Национальный проект «Наука и университеты» включает в себя 4 региональных проекта:

1) «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» («Исследовательское лидерство»);

2) «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» («Инфраструктура»);

3) «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» («Кадры»);

4) «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и промышленности» («Интеграция»).

Мероприятия национального проекта реализуются в Республике Дагестан посредством участия в рамках федеральных проектов вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук через конкурсы и гранты.

1) В целях реализации мероприятий **федерального проекта «Исследовательское лидерство»** НОЦ «Центр перспективного развития медицины и технологических инициатив» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» принимал участие в следующих проектах: разработка респираторов и хирургических масок с нанопокрытиями; разработка фильтров для ИВЛ; разработка антибактериальных покрытий для дверных ручек, разработка барьерных и биосовместимых нанопленок для применения на медицинских имплантах. Все проекты поддержаны ФГБУ «Фонд содействия инновациям развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

2) В рамках реализации мероприятий **федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»:**

– ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» разработана стратегия деятельности Центра перспективного развития медицины и технологических инициатив и кадрового потенциала по системе «ШКОЛА – ВУЗ – ПРАКТИКА»;

– в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН (далее – ДФИЦ РАН) проводятся мероприятия по созданию двух молодёжных лабораторий с количеством сотрудников 12 человек (за счёт средств федерального бюджета – 3,2 млн рублей);

– на базе ДФИЦ РАН открыт диссертационный совет по научной специальности 1.5.15 Экология (биологические науки) согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1669/нк от 7 декабря 2022 года.

3) В рамках **федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок»**

В 2022 году проведён Республиканский конкурс молодых учёных на звание «Лучший молодой учёный 2022 года» (приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от 10.10.2022 № 10-02-933/22).

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» проведены 4 научно-практические конференции, заключены 6 договоров с предприятиями в целях проведения научно-исследовательских работ. По программам повышения квалификации прошли обучение 43 человек, профессиональную переподготовку прошли 65 человек.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» и ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» участвуют в составе Консорциума с ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» в программе стратегического академического лидерства «Приоритет–2030».

Молодые учёные ДФИЦ РАН приняли участие в федеральном проекте «Молодые учёные – будущее России», где представили 8 проектов.

4) В рамках **федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии»** проводятся мероприятия в рамках соглашения о консорциуме вузов Северо-Кавказского федерального округа. Республика Дагестан подключилась к информационной системе «Единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия исследователей», введённой в эксплуатацию Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» в рамках проекта «Интеграция СНО медицинских вузов СКФО», выигран грант в 1,0 млн рублей по итогам конкурса студенческих научных обществ.

В рамках федерального проекта **«Платформа университетского технологического предпринимательства»** более 60 проектов молодых учёных Дагестанского государственного университета прошли в полуфинал акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов по новым технологиям рынка НТИ Технет.

Два проекта студентов ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» представлены на финале конкурса «Московский молодёжный старт - 2022» по программе «УМНИК», направленной на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых учёных. Победители конкурса будут определены весной 2023 года.

Реализация обоих проектов осуществляется во взаимодействии с экспертами Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Инжинирингового Центра «Цифровые платформы». Партнёрами вуза стали: АО Завод «Дагдизель», АО «Концерн КЭМЗ», АО «Завод имени Гаджиева», АО ДНИИ «ВОЛНА».

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.06.2022 г. № 608 Республика Дагестан не вошла в состав регионов, которым в рамках федерального проекта **«Передовые инженерные школы»** предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных школ и прохождения практик и стажировок.



14. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Куратор национального проекта:



Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Мерданов Э.М.
Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает в себя три федеральных проекта:

- 1) «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» («Туристическая инфраструктура (Республика Дагестан)»)
- 2) «Повышение доступности туристических продуктов» («Доступность туристического продукта»);
- 3) «Совершенствование управления в сфере туризма».

Основными целями реализации национального проекта являются увеличение:

- внутренних туристических поездок до 140 млн поездок (с 65 млн поездок в 2019 г., или в 2,2 раза);
- рабочих мест в отрасли до 4,7 млн (с 2,5 млн в 2019 г., или в 1,9 раза);
- объема экспорта туристических услуг в размере 22,3 млрд долл. (с 11,0 млрд долл. в 2019 г., или в 2 раза).

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

В 2022 на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено финансирование в сумме 334,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 150,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,5 млн рублей, средства юридических лиц – 182,5 млн рублей).

Профинансировано 334,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение по состоянию на 1 января 2023 года составляет 334,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства перечислены на счета контрагентов).

В ходе реализации национального проекта заключено 10 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 334,1 млн рублей.

Данные средства предусмотрены на реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».



14.1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

Мероприятия регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».

В 2022 году была запланирована поддержка предпринимательских инициатив в виде предоставления грантов юридическим лицам.

В целях реализации регионального проекта подписаны:

– Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан от 18 мая 2022 г. № 069-2022-J1009-8;

– Соглашение с Федеральным агентством по туризму о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 174-09-2022-051.

Согласно соглашениям было предусмотрено создание 102 номера в модульных некапитальных средствах размещения, 10 модульных некапитальных средств размещения, 363 койко-места в модульных некапитальных средствах размещения, 60 рабочих мест.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2022 г. № 225 утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов, автокемпингов) и развитие инфраструктуры туризма.

В 2022 году на реализацию регионального проекта профинансировано 334,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 150,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,5 млн рублей, средства юридических лиц – 182,5 млн рублей). Освоены расходы в сумме 334,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

По итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий с 10 победителями заключены соглашения на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения на общую сумму 334,1 млн рублей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн рублей

№ п/п	ФИО, наименование заявителя	Сумма гранта	Общая стоимость проекта	Размер собственных средств на реализацию проекта	% участия
1	ИП Ашуров А.И.	15,0	43,3	28,1	65,0
2	ООО «Крепость»	15,0	31,87	16,87	53,0
3	ООО «Даг-Тур»	15,0	32,48	17,48	54,8
4	СПК «Агрофирма Сивух»	15,6	33,62	17,99	53,5
5	ООО «Рубас-1»	15,0	30,91	15,91	51,4
6	КФХ Магомедов Магомед Исаевич	15,0	32,5	17,5	53,8
7	ООО «Анжелика»	15,8	37,9	18,28	3,0
8	ООО «Цестрис Тревэл»	15,0	30,24	15,24	50,4
9	КФХ «Отдых»	15,0	31,84	16,84	53,0
10	ИП Гасанова Надежда Абдуллаевна	15,0	33,3	18,3	55,0

Проведенный анализ деятельности 10 победителей-получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан по данным ЕИС «Закупки» показал следующее:

1) ООО «Цестрис-Тревэл». Основной деятельностью общества является деятельность туристических агентств.

Объект строительства: загородный модульный отель «ТукиТа-2000».

Согласно Акту о приемке выполненных работ №12 от 25.12.2022 г, работы выполнены. Сумма исполненных обязательств составила 30,24 млн рублей;

2) ООО «Крепость» с 2017 года заключены 18 контрактов на общую сумму 43,9 млн рублей. Ранее заключались контракты по строительству блока санитарно-бытового назначения, строительным работам по устройству кровельных покрытий зданий и сооружений и капитальному ремонту.

Объект строительства: туристическая база отдыха «Санда» в с. Гуниб, Гунибский район. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 31.12.2022 г., работы выполнены, сумма исполненных обязательств – 31,87 млн рублей;

3) ООО «Даг-Тур» на протяжении периода деятельности не заключались государственные контракты. Основным видом деятельности является деятельность туристических агентств.

Объект строительства: туристическая база отдыха «Чалда-Сафари» в с. Чалда, Гергебильский район. Согласно Акту о приемке выполненных работ № 1 от 30.12.2022 г, работы выполнены, сумма исполненных обязательств составила 32,48 млн рублей;

4) СПК «Агрофирма Сивух», основной вид деятельности - выращивание однолетних культур.

Объект строительства: туристическая база «Альпийская деревня» в с. Старый Сивух, Гумбетовский район. Согласно Акту о приемке выполненных

работ от 30.12.2022 г, работы выполнены, сумма исполненных обязательств составила 33,0 млн рублей;

5) ООО «Рубас-1», основной вид деятельности - предоставление мест для краткосрочного проживания.

Объект строительства: туристическая база отдыха «Рубас» в Дербентском районе, побережье Каспийского моря, рядом с парком «Патриот».

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 19.12.2022 г, работы выполнены, сумма исполненных обязательств составила 30,91 млн рублей;

6) ООО «Анжелина», основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Объект строительства: гостиничный комплекс «Анжелина» в с. Берикей, Дербентский район. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 29.12.2022 г., работы выполнены в полном объеме, сумма исполненных обязательств 37,9 млн рублей;

7) КФХ «Отдых», основной вид деятельности - добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.

Объект строительства: гостиничный комплекс «Пляжный дом» в с. Авадан, Догузпаринский район. Согласно Акту о приемке выполненных работ от 26.12.2022 г, работы выполнены, сумма исполненных обязательств – 31,8 млн рублей;

8) ИП Гасанова Надежда Абдуллаевна, основной вид деятельности – торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах.

Объект: отель-Усадьба «Иски (Старый) Мамрач» в с. Советское, Магарамкентский район. Согласно Акту о приемке работ от 30.12.2022 г. работы выполнены, сумма исполненных обязательств – 33,3 млн рублей;

9) ИП КФХ Магомедов Магомед Исаевич, основной вид деятельности – разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Объект строительства: гостиничный комплекс «Горный ветер».

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 30.12.2022 г., работы выполнены, сумма исполненных обязательств составила 32,5 млн рублей;

10) ИП Ашуров А.И. Объект строительства: отель «МОРЕ» в г. Махачкала, Кировский район, Сулакское участковое лесничество, квартал 26, выдел 5, 9, 10.

Согласно Акту о приемке выполненных работ № 27 от 30.12.2022 г, работы выполнены, сумма исполненных обязательств 18,0 млн рублей.

Все вышеперечисленные получатели субсидий (за исключением ООО «Крепость») ранее не заключали государственные контракты (договоры) на строительство модульных некапитальных средств размещения. Осуществление указанными организациями основного вида деятельности не связано с предметом получения субсидий.

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, выполнены. Обеспечено достижение планового значения по целевому показателю «Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой» – факт 10 усл. единиц, или 125 % от плана (8 усл. единиц).

15. Выводы

Проведенный Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг реализации национальных проектов за 2022 год показал следующее:

15.1. На реализацию национальных проектов в 2022 году осуществлены расходы в сумме 35 888,9 млн рублей, или 99,1 % от объема годовых назначений (36 203,8 млн рублей).

15.2. Из общей суммы профинансированных расходов на реализацию национальных проектов за 2022 год освоены 33 014,1 млн рублей, или 92,0 % от объема финансирования (35 888,9 млн рублей), и 91,2 % от объема годовых назначений (36 203,8 млн рублей).

Из 11 финансируемых национальных проектов (финансирование нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Наука» не предусмотрено) по 7 национальным проектам средства освоены в полном объеме («Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда»).

По 2 национальным проектам освоено от 92 % до 99 % («Демография» – 92,5 % (7 508,8 млн рублей), «Культура» – 98,5 % (855,3 млн рублей).

По 2 национальным проектам освоено от 84 % до 87 % («Образование» – 84,3 % (10 354,7 млн рублей), «Здравоохранение» – 87 % (4 207,6 млн рублей).

Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2023 года по сравнению с 2021 годом наблюдается увеличение объема кассовых расходов с 72 % до 99,1 %, следствием чего является также значительное снижение остатков не использованных средств (с 6 689,4 млн рублей до 3 189,7 млн рублей, или на 52 %).

15.3. Несмотря на значительное снижение остатков не освоенных (неиспользованных) средств в 2022 году, темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований по отдельным национальным проектам оказались недостаточными для своевременного и качественного исполнения всех плановых мероприятий и достижения целевых показателей. В результате, на 1 января 2023 года, неосвоенный (не использованный) остаток бюджетных средств составил в сумме 3 189,7 млн рублей, или 8,8 % от годовых назначений (36 203,8 млн рублей), в том числе по национальным проектам:

– «Демография» – 610,0 млн рублей, или 7,5 % от годовых назначений (8 118,8 млн рублей);

– «Образование» – 1 929,6 млн рублей, или 15,7 % от объема годовых назначений (12 284,4 млн рублей);

– «Здравоохранение» – 636,7 млн рублей, или 13,1 % от объема годовых назначений (4 844,3 млн рублей);

– «Культура» – 13,4 млн рублей, или 1,5 % от объема финансирования (868,7 млн рублей).

Следует отметить, что большая часть освоенных средств, согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года № 137 «Об установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», направлена на авансирование строительства и разработку проектно-сметной документации в целях строительства объектов общего образования в рамках национального проекта «Образование».

Принятие решения об увеличении финансирования строящихся объектов общего образования в рамках реализации механизма казначейского сопровождения, позволило увеличить объем авансирования подрядных организаций и, соответственно объем освоения до 9 257,3 млн рублей (82 %), из предусмотренных 11 184,5 млн рублей. Однако, достигнутый уровень освоения предусмотренных назначений (11 184,5 млн рублей) не отражает фактические объемы выполненных строительных работ (оплата по актам КС-2, КС-3).

15.4. В 2022 году негативное влияние на темпы финансирования и освоения бюджетных средств оказывали проблемы, связанные с планированием и заключением контрактов (договоров) в рамках мероприятий национальных (региональных) проектов. Так, из запланированных 1 241 контрактов (договоров) в 2022 году заключены 1 240 контрактов (договор), или 99 % на общую сумму 24 205,3 млн рублей, или 99 %.

Не заключен 1 контракт (договор) по региональному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» (взамен ранее расторгнутого договора).

Длительные сроки заключения контрактов по национальным проектам в 2022 году были вызваны следующими причинами:

– необходимостью корректировки начальной (максимальной) цены контракта и внесением изменений в проектно-сметную документацию в связи с существенным ростом стоимости оборудования и услуг;

– отказом потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, ввиду неопределенности ценового фактора;

– необходимостью использования национального режима (статья 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»);

– нарушением требований Федерального закона 5 апреля 2013 № 44-ФЗ в виду низкого качества подготовки аукционной документации при размещении закупок;

– длительными сроками согласования планового объема контрактов с федеральными министерствами;

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, поставки оборудования и выполнения работ (до 31.12.2022 г.), привели к тому, что основной объем кассовых расходов по национальным проектам пришелся на конец IV квартала 2022 года.

15.5. В 2022 году продолжали иметь место случаи расторжения контрактов в связи с неисполнением контрагентами условий контрактов, например, несоответствие поставленного товара условиям контракта, отказ поставки лекарственных препаратов поставщиком, отсутствие мощностей для строительства быстровозводимых модульных конструкций («Здравоохранение», «Образование»), низкие темпы проведения строительных работ («Жилье и городская среда») и другие.

Следует отметить, что не всеми заказчиками соблюдается требование статьи 103 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о своевременном размещении информации об исполнении обязательств по контрактам, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами. Кроме этого, меры реагирования за нарушение условий контракта к поставщику (подрядчику) также не применяются.

15.6. В 2022 году наряду с положительными результатами, в реализации отдельных национальных проектов продолжали оставаться проблемы и недостатки, которые не позволили своевременно и в полном объеме выполнить запланированные мероприятия и обеспечить эффективное освоение бюджетных средств. К ним относятся национальные проекты, в рамках которых реализуются мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию социально значимых объектов, которые сопровождаются постоянными рисками несвоевременного выполнения работ и неосвоения выделенных средств, в том числе:

15.6.1. Национальный проект «Демография».

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» из 58 объектов на 9 160 мест по состоянию на 1 января 2023 года:

– завершено строительство 51 объекта на 8 040 мест (19 детсадов на

1 830 мест и 32 детсада (ясли) на 6 210 мест). По 51 объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в том числе по 31 объекту на 4 720 мест получена лицензия на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

– не завершено строительство 6 объектов на 1 060 мест, в том числе 1 детсад на 120 мест, 5 детсадов (яслей) на 940 мест, с уровнем строительной готовности от 46 % до 63 % (подрядчик – ФГУП «ГУСС»);

– не начато строительство детсада (ясли) на 60 мест (детсад в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района), так как разработка проектно-сметной документации не завершена.

По объекту «Детский сад на 250 мест в пос. Красноармейск г. Махачкала» заключен государственный контракт с единственным исполнителем по проектированию и строительству (срок начала строительства – 2023 год).

15.6.2. Национальный проект «Образование».

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по состоянию на 1 января 2023 года из 57 объектов общеобразовательных организации на 25 706 ученических места¹³ (с нарастающим итогом) завершены и осуществляют образовательную деятельность 10 школ на 3 350 ученических мест, в том числе: 6 школ на 1 744 уч. места (введены в 2020 году), 4 школы на 1 606 уч. места (введены в 2021 году).

В 2022 году было запланировано строительство (начало строительства) 46 школ на 21 736 ученических места, в том числе:

– строительство (завершение строительства) с вводом в эксплуатацию в 2022 году – 26 объектов на 13 852 уч. мест

– начало строительства в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году – 20 объектов на 7 884 уч. места.

Из 26 объектов на 13 852 уч. мест с вводом в эксплуатацию в 2022 году:

Завершено строительство 4 школ на 2 450 ученических мест (школа на 502 уч. места в МКР «Загородный» г. Махачкалы; школа на 120 уч. мест в с. Кваната Цумадинского района; школа на 1 224 уч. места в п. Семендер г. Махачкалы; школа на 604 уч. места в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1¹⁴), по которым получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Начало фактического функционирования объектов планируется с 1 сентября 2023 года.

Не завершено строительство 22 школ на 11 402 уч. места, в том числе:

– ФГУП «ГУСС» – 9 школ на 5 258 уч. мест;

¹³Нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

¹⁴ Школа на 604 уч. мест в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1 (местные подрядчики), остальные 3 школы – ФГУП «ГУСС»).

- Администрация ГО «город Дербент» – 1 школа на 804 уч. места;
- Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (далее – ГКУ РД «ДГЕЗЗ» – 12 школ на 5 340 уч. мест;

В связи с наличием рисков начало строительства и освоения средств федерального бюджета, в соответствии с поручением протокола совещания у Директора Департамента просвещения высшего образования и науки Правительства РФ Синюгиной Т.Ю. от 17 октября 2022 г. № П8-75487, срок ввода указанных объектов в эксплуатацию перенесен на 2023 год с вводом в эксплуатацию 10 школ на 3 350 уч. мест на 1 сентября 2023 года.

По 20 объектам на 7 884 уч. места начало строительства которых было предусмотрено в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году, начаты строительные работы только по 1 школе на 604 уч. мест в с. Кироваул Кизилюртовского района (строительная готовность – 10 %)

По состоянию на 1 января 2023 года освоено 9 257,3 млн рублей, или 82,8 % от годовых назначений (средства федерального бюджета 8 520,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 736,8 млн рублей).

Как было отмечено ранее, большая часть освоенных средств, согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года № 137 «Об установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», направлена на авансирование строительства и разработку проектно-сметной документации.

Неосвоенный остаток средств составил 1 927,2 млн рублей, или 17,2 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 1 758,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 168,5 млн рублей).

Следует также отметить о наличие проблем в сопровождении реализации мероприятий по строительству объектов образования из-за большого количества исполнителей и раздробленности предусмотренного финансирования. Так, в рамках национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по 4 разным субсидиям, предоставленным Республике Дагестан в целях содействия создания новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Реализацию мероприятий по строительству общеобразовательных организаций одновременно осуществляют три министерства (Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан).

Одновременно, строительством образовательных организаций занимаются четверо заказчиков–застройщиков (Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства»,

Администрация ГО «город Дербент», Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Дирекция единого государственного застройщика заказчика», Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр по сейсмической безопасности»).

Указанное затрудняет осуществление оперативного контроля за текущими рисками строительства и расходования предусмотренных назначений.

В ходе реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование») в 2022 году было запланировано проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Из профинансированных на реализацию мероприятия 30,6 млн рублей, фактически освоено 28,2 млн рублей или 93 %. Неосвоенный остаток на сумму 2,1 млн рублей сложился в виду позднего заключения соглашения (от 28 ноября 2022 года за № 073-09-2022-1080), а также по техническим причинам проведения расчетов.

15.6.3. Национальный проект «Здравоохранение».

В 2022 году из профинансированных на реализацию национального проекта «Здравоохранение» 4 610,5 млн рублей, не освоены 636,7 млн рублей или 13,0 % от годовых назначений (4 884,3 млн рублей), в том числе:

1) По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» не освоено 15,8 млн рублей, или 4,0 % от объема годовых назначений (403,97 млн рублей). В ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» поставленное оборудование не в полном объеме введено в эксплуатацию. Причина неполного оснащения – это задержка комплектующих по контрактованному оборудованию из заграницы. Полная поставка ожидается в феврале 2023 года;

2) По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» не освоено 124,5 млн рублей, или 6,6 % от объема годовых назначений (1 899,8 млн рублей). Из 18 контрактов по 27 единицам оборудования в целях переоснащения ГБУ РД «Республиканского онкологического центра» на сумму 227,0 млн рублей, не осуществлена поставка 3 единиц оборудования в виду наличия проблем с поставкой и сборкой частей (микрочипов и схем), а также задержкой на таможне в городе Хабаровск (неосвоенный остаток – 35,5 млн рублей). Поставка ожидается в феврале 2023 года. Кроме этого, не освоены 89,0 млн рублей, или 56,4 % из 157,8 млн рублей, профинансированных на строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя.

3) По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» не освоены 328,8 млн рублей или 61,4 % от объема годовых назначений (535,3 млн рублей).

Не исполнены в полном объеме обязательства по контракту от 30 сентября 2021 года, заключенному с ООО «Национальный центр информатизации» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан. По итогам проведения испытаний работы по 9 этапам из запланированных 13 этапов признаны выполненными в полном объеме в соответствии с техническим заданием и программами и методиками испытаний. По выполненным 9 этапам произведена оплата на сумму 86,8 млн рублей, или 69,6 % от объема неосвоенных остатков 2021 года (124,67 млн рублей). Работы по этапам 7, 8, 9, 10 ГК не выполнены в полном объеме и не продемонстрированы исполнителям. Общая сумма не выполненных работ составляет 37,8 млн. рублей.

Средства медицинских организаций в сумме 233,8 млн рублей предусмотренные на финансирование услуг по комплексному техническому сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД», также не освоены.

4) По региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» не освоены 167,7 млн рублей, или 10,7 % от годовых назначений (1 565,9 млн рублей) в результате не завершения строительных работ:

- по капитальному ремонту 60 зданий медицинских организаций, в ходе которых не завершены работы по 4 объектам уровень строительной готовности по которым составляет от 60 до 97 % (ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», ФП в с. Иммуный (97 %), ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» с. Терекли-Мектеб, ул. Станкевич (80 %), ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», ФАП в с. Александро-Невское (90 %), ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», ФП в с. Цумада-Урух (60 %);

– по строительству и монтажу 8 объектов быстровозводимых модульных конструкций, в ходе которых не завершено строительство 4 объектов с уровнем готовности от 20 % до 95 %.

По поликлинике ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ», ул. Буйнакского (уровень готовности – 60 %), ФАП ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», в с. Гоор-Хиндах (уровень готовности – 20 %), работы не завершены в связи с поздним доведением лимитов и заключением контрактов.

По ГБУ РД «Поликлиника № 3» г. Махачкала (уровень готовности – 95 %), ГБУ РД «Поликлиника № 8» г. Махачкала (уровень готовности – 75 %) в связи выделением меньшей площади земельного участка, проводилась корректировка проектно-сметной документации и скорректирована этажность здания. Кроме того, работа по изготовлению блочно-модульной конструкции, не завершена производителем в установленные сроки.

15.6.4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

В 2022 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» профинансированы и освоены расходы в сумме 2 731,96 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» также обеспечено полное освоение предусмотренных бюджетных назначений в сумме 1 504 млн рублей. Однако, из 7 объектов строительства и реконструкции со сроком завершения в 2022 году (в том числе 5 объектов незавершенного строительства 2021 года), введены эксплуатацию только 4 объекта («Реконструкция систем водоснабжения города Кизляр»; «Водоснабжение села Батлаич Хунзахского района; «Строительство водопроводных очистных сооружений в селении Хунзах, Хунзахского района»; «Реконструкция межпоселкового водовода «В. Казанище – Бетаул – Кырлар», Буйнакский район).

В виду низкого уровня строительных работ, а также из-за расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, в 2022 году не завершено строительство 3 объектов водоснабжения:

- «Водоснабжение села Карата Ахвахского района» (уровень готовности – 20 %, подрядчик ООО «Арт-строй»);
- «Водоснабжение городского округа город Южно-Сухокумск» (в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядчиком (ООО «Анджи строй») контракт расторгнут в одностороннем порядке, новый контракт не заключен).

Средства на строительство указанных 2 объектов в сумме 297,0 млн рублей перераспределены на объект «Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск».

- «Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт» (объект 2021 года, уровень готовности – 20 %, подрядчик ООО «Авилон»);

По объекту «Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск», начало строительство которого было запланировано на 2022 год с вводом в эксплуатацию в 2023 году, освоено 854,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

15.6.5. Национальный проект «Культура».

В 2022 году на реализацию национального проекта «Культура» профинансированы расходы в сумме 868,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Фактически освоено 855,3 млн рублей, или 98,5 % от объема финансирования. По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил 13,4 млн рублей, или 1,5 % от годовых назначений.

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» профинансированы расходы в сумме 834,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 821,5 млн рублей, или 98,4 % от объема финансирования (834,9 млн рублей).

Из 16 объектов строительства по 15 объектам техническая готовность составляет 100 %, не завершено строительство Центра культурного развития

в г. Кизляр (строительная готовность 36 %). В рамках строительства данного объекта освоено 105,1 млн рублей, или 98,3 % от годовых назначений (106,9 млн рублей (из них 33,3 млн рублей дополнительные средства из резервного фонда)). Неосвоенный остаток составил 1,8 млн рублей, или 1,6 % от объема годовых назначений.

Кроме этого, не завершено благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в г. Кизляре (строительная готовность 10 %), освоено 40,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

По строительству «Центра культуры в городе Кизляр» в связи с низкими темпами строительства и наличием рисков не освоения годовых назначений, лимиты 2022 года в сумме 60,6 млн рублей перенесены на 2023 год. Также перенесены на 2023 год средства республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 35,3 млн рублей, ранее предусмотренные на благоустройство прилегающей территории к центру.

15.7. Проведенный мониторинг реализации национальных проектов показал, темпы строительства по объектам, которые должны были быть завершены в 2022 году в рамках 5 национальных проектов («Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Культура») были недостаточны для своевременного завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Основные риски в ходе реализаций мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной значимости в 2022 году были связаны с несвоевременным и некачественным выполнением следующих работ:

1) На стадии проектирования и отвода земельных участков:

– несвоевременное проведение процедур по отводу земельных участков под планируемые объекты строительства;

– низкое качество предпроектной подготовки, связанное с оформлением и утверждением технического задания, получением технических условий на подключение инженерных сетей (газ, вода, электричество, водоотведение);

– низкое качество подготовки проектно-сметной документации и длительное прохождение процедуры государственной экспертизы в виду наличия многочисленных замечаний к разработанным проектам.

2) На стадии строительства:

– отсутствие соответствующей материально-технической базы, недостаточное количество рабочего и инженерно-технического персонала для выполнения строительно-монтажных работ у подрядных организаций;

– отсутствие качественного технологического контроля на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, систематические срывы рабочего графика и низкая организация выполнения строительных работ;

– низкий уровень строительного контроля за ходом строительства объектов, связанный с необеспечением, со стороны заказчика, постоянного

визуального контроля в части организации 24-часового онлайн-видеонаблюдения;

– несвоевременное оформление и сдача подрядчиками объемов выполненных работ и исполнительной документации заказчику, в результате чего задерживается оплата по фактически выполненным объемам;

– удорожание строительных материалов и оборудования в 2021 – 2022 годах, что привело к росту первоначальной стоимости контракта.

Сложившиеся в Республике Дагестан темпы строительства объектов общего и дошкольного образования, а также качество организации строительных работ продолжают оставаться недостаточными для начала, завершения строительных работ в течение установленного нормативного срока (минимальный нормативный срок строительства социального объекта составляет от 8 до 18 месяцев¹⁵ (в зависимости от мощности объекта). В результате сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов дошкольного и общего образования неоднократно продлеваются.

Практика ежегодного переноса сроков завершения на следующий год приводит к удорожанию объектов строительства ввиду роста цен на строительные материалы и инфляционных процессов, а также отрицательно влияет на эффективность расходования предусмотренных бюджетных ассигнований. Например, в 2022 году в рамках мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года (24 школы на 12 838 ученических мест) дополнительно, в связи с удорожанием строительства, было предусмотрено финансирование 1 026,54 млн рублей (средства резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 1 016,27 млн рублей, средства республиканского бюджета в сумме 10,27 млн рублей)¹⁶.

С начала 2022 года наблюдался значительный рост цен на строительные материалы (бетон, раствор, цемент, асфальтобетон – от 7,5 % до 26 %, сборный железобетон – 9 %; кирпич, камни – от 13 % до 17 %; гидроизоляция – от 29 % до 43 %; краски – от 35,3 % до 72,0 %, гипсокартон – 13,8 %, трубы полиэтиленовые – 10 %), что также потребует дополнительного финансирования в связи с переносом срока завершения строительства объектов на 2023 год.

¹⁵ СНиП 1.04.03-85* «Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 года № 51/90

¹⁶ В дальнейшем согласно дополнительному соглашению от 23.12.2022 № 073-09-2022-870/7, заключенному между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан объем средств, предусмотренных из федерального бюджета в 2022 году на реализацию мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены (1 026,5 млн рублей) был уменьшен на 546,6 млн рублей и составил 479,9 млн рублей.

15.8. Проведенный анализ показал, со стороны кураторов национальных проектов по Республике Дагестан контроль за реализацией мероприятий региональных проектов, осуществляется не на должном уровне. В результате, отдельными министерствами и ведомствами (ответственными исполнителями) не в полной мере обеспечивается результативность и эффективность использования предусмотренных бюджетных ассигнований.

В свою очередь, отсутствие надлежащего контроля со стороны отдельных министерств и ведомств (ответственных исполнителей) за ходом реализации мероприятий, за расходованием средств получателями, низкая организация взаимодействия с муниципальными образованиями и подрядными организациями, также приводят к снижению качества проводимых работ, не освоению бюджетных ассигнований и невыполнению планируемых результатов.

15.9. Проведенный мониторинг, показал, что основными причинами неосвоения бюджетных ассигнований в полном объеме, а также невыполнения запланированных результатов, являются:

- низкое качество организации и планирования мероприятий региональных проектов;
- несоблюдение процедур планирования закупок, которые должны быть начаты еще на стадии формирования бюджетных показателей, в результате чего риски реализации создаются уже этапе планирования;
- несвоевременное заключение контрактов в том числе в виду нарушений при подготовке аукционной документации и проведении конкурсных процедур;
- планирование основного объема кассовых расходов на IV квартал, а также установление сроков выполнения работ по контрактам до конца года;
- ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками) условий заключенных контрактов;
- низкий уровень контроля за своевременностью выполнения обязательств по контрактам и непроведение претензионной работы с поставщиками товаров, за нарушение условий, сроков и обязательств по контрактам;
- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации по объектам строительства и реконструкции;
- неэффективная организация производительности труда, дефицит высококвалифицированных кадров строительных специальностей, отставание от графика строительно-монтажных работ;
- низкие темпы строительных работ и уровень организации строительного контроля;
- необеспечение на региональном уровне информационной доступности, достоверности, полноты и актуальности сведений о реализации региональных проектов.

В ходе реализации национальных проектов в 2022 году согласно заключенным индикативным Соглашениям, запланировано выполнение 180 целевых показателей.

По результатам реализации национальных (региональных) проектов) в 2022 году обеспечено достижение плановых значений по 160 целевым показателям. При этом, по 58 целевым показателям обеспечено исполнение в размере 100 %, по 102 целевым показателям исполнение составило свыше 100 %. Перевыполнение плановых значений свыше 150 % обеспечено по 41 целевому показателю.

По отдельным показателям фактические значения значительно превышают плановые значения (свыше 200 % по 27 целевым показателям). Например, по целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД)» фактическое значение 212 тыс. человек, в 14,5 раз превышает плановое значение на 2022 год (14,7 тыс. человек).

Указанное свидетельствует о недостаточно качественном планировании значений показателей, занижении прогнозных оценок, а также о несвоевременности приведения плановых значений показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

15.10. В соответствии с Планом работ на 2022 год Счетной палатой Республики Дагестан проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по проверке реализации национальных (региональных) проектов, в ходе которых выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 262 713,3 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 21 375,2 тыс. рублей;
- нарушение ведения бухгалтерского учета – 27 769,3 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении закупок – 57 038,4 тыс. рублей;
- иные нарушения – 59 002,6 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 62 460,7 тыс. рублей;
- завышение стоимости выполненных работ (услуг) – 35 067,1 тыс. рублей.

По результатам проведенных мероприятий отдельные нарушения и недостатки были устранены. Предложения и замечания Счетной палаты Республики Дагестан учтены.

Материалы проведенных проверок Счетной палатой Республики Дагестан направляются в правоохранительные органы, в том числе в 2022 году направлено 26 материалов:

- в органы прокуратуры – 4 материала;
- в УФСБ по РД – 1 материал;
- в органы МВД РФ – 12 материалов;
- в СУ СК России по РД – 9 материалов.

16. Предложения

По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

- провести детальный анализ итогов реализации национальных (региональных) проектов в целях исключения возможных рисков их выполнения в 2023 году;

- принять комплекс мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, допущенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2023 году;

- привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших принятие решений, приведших к нарушениям и недостаткам в ходе реализации национальных проектов, а также образованию неиспользованных средств (остатков);

- подготовить предложения по корректировке показателей региональных проектов и государственных программ Республики Дагестан с учетом оценки результатов их реализации за 2022 год и планируемых объемов финансирования на 2023 год;

- во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти обеспечить ритмичное финансирование региональных проектов, а также своевременное и эффективное освоение выделяемых средств в 2023 году;

- принять меры по своевременному заключению контрактов и обеспечить качественное исполнение принятых обязательств;

- принять меры по своевременной подготовке и корректировке проектно-сметной документации по объектам, планируемых к строительству. При этом обеспечить соблюдение нормативных сроков строительства объектов;

- усилить контроль за ходом строительства объектов и вводом их в эксплуатацию;

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов в целях оперативного контроля за своевременным выполнением целевых показателей;

- обеспечить эффективное взаимодействие с муниципалитетами, участниками реализации региональных проектов с целью своевременной реализации мероприятий и достижению намеченных целевых показателей;

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить возможные риски реализации национальных проектов в 2023 году, обеспечит своевременное освоение выделяемых средств, а также достижение запланированных целей.

Приложение на 30 листах.

**Счетная палата
Республики Дагестан**
