



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг  
реализации национальных  
(региональных) проектов  
в Республике Дагестан  
(I квартал 2025 года)**

**МАХАЧКАЛА 2025**

## Содержание

<b>1.</b>	<b>Общие положения.....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» .....</b>	<b>8</b>
2.1	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	10
2.2	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	16
2.3	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» .....	17
2.4	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» .....	18
2.5	Региональный проект ««Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» .....	19
2.6	Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи.....	20
2.7	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» .....	21
2.8	Региональный проект «Здоровье для каждого» .....	22
2.9	Региональный проект «Медицинские кадры».....	23
<b>3.</b>	<b>Национальный проект ««Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» .....</b>	<b>24</b>
3.1	Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» .....	25
<b>4.</b>	<b>Национальный проект «Инфраструктура для жизни» .....</b>	<b>27</b>
4.1	Региональный проект «Жилье».....	29
4.2	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».....	31
4.3	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»....	32
4.4.	Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» .....	34
4.5	Региональный проект «Безопасность дорожного движения» .....	35
4.6	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» .....	36
4.7	Региональный проект «Общественные меры развития дорожного движения» .....	39
5.0	<b>Национальный проект «Кадры» .....</b>	<b>40</b>
5.1	Региональный проект «Образование для рынка труда» .....	41
5.2	Региональный проект «Управление рынком труда».....	41
<b>6.</b>	<b>Национальный проект «Международная кооперация и экспорт ».....</b>	<b>43</b>
6.1	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» .....	44
<b>7.</b>	<b>Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства .....</b>	<b>46</b>
7.1.	Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» .....	47
<b>8.</b>	<b>Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства.....</b>	<b>49</b>

8.1	Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» .....	51
8.2	Региональный проект «Отечественные решения» .....	52
8.3	Региональный проект «Цифровое государственное управление» .....	53
<b>9.</b>	<b>Национальный проект «Экологическое благополучие» .....</b>	<b>54</b>
9.1	Региональный проект «Экономика замкнутого цикла» .....	56
9.2	Региональный проект «Чистый воздух» .....	58
9.3	Региональный проект «Сохранение лесов» .....	59
<b>10.</b>	<b>Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика...» .....</b>	<b>60</b>
10.1	Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» .....	62
10.2	Региональный проект «Производительность труда» .....	64
<b>11.</b>	<b>Национальный проект «Молодежь и дети» .....</b>	<b>66</b>
11.1	Региональный проект «Все лучшее детям» .....	68
11.2	Региональный проект «Педагоги и наставники» .....	70
11.3	Региональный проект «Профессионалитет» .....	71
11.4	Региональный проект «Россия – страна возможностей» .....	72
11.5	Региональный проект «Мы вместе» .....	73
<b>12.</b>	<b>Национальный проект «Семья» .....</b>	<b>74</b>
12.1	Региональный проект «Поддержка семьи» .....	76
12.2	Региональный проект «Многодетная семья» .....	77
12.3	Региональный проект «Охрана материнства и детства» .....	78
12.4	Региональный проект «Старшее поколение» .....	79
12.5	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» .....	80
<b>13.</b>	<b>Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» .....</b>	<b>82</b>
13.1	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» .....	83
<b>14</b>	<b>Выводы .....</b>	<b>85</b>
<b>15.</b>	<b>Предложения .....</b>	<b>92</b>
<b>16.</b>	<b>Приложения .....</b>	<b>93</b>

### 1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2025 год проведен мониторинг (аудит) реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 апреля 2025 г., по результатам которого установлено.

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года» в 2025 году Республика Дагестан участвует в реализации 12 национальных проектов (2025-2030): «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы».

Кроме того, планируется участие Республики Дагестан в реализации национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» (федеральный проект «Новое оборудование и технологии в солнечной ветрогенерации»).

В рамках указанных национальных проектов реализуются 41 региональный проект в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан. В ГИИС «Электронный бюджет» сформированы паспорта по всем региональным проектам

2. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 22 435,8 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 19 909,0 млн рублей, или 88,7 %;
- республиканского бюджета – 2 403,2 млн рублей, или 10,7 %;
- иных источников – 123,5 млн рублей, или 0,6 % (средства муниципальных образований – 119,1 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн. рублей, средства ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 0,9 млн рублей).

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.




В общем объеме ассигнований (22 435,8 млн рублей) наибольший объем средств предусмотрен на реализацию 4 национальных проектов: «Инфраструктура для жизни» – 10 072,7 млн рублей (45 %); «Молодежь и дети» – 5 526,7 млн рублей (24,6 %); «Семья» – 2 726,6 млн рублей (12,2 %), «Продолжительная и активная жизнь» – 2 094,5 млн рублей (9,3 %).

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

3. По состоянию на 1 апреля 2025 г. на реализацию мероприятий семи национальных проектов профинансированы средства в сумме 3 121,8 млн рублей, или 14 % от объема годовых назначений (22 435,8 млн рублей).

### Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2025 году

млн рублей

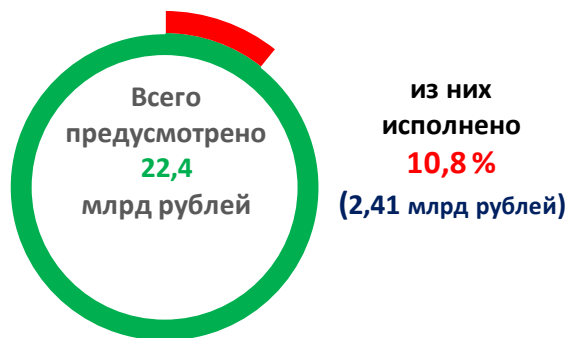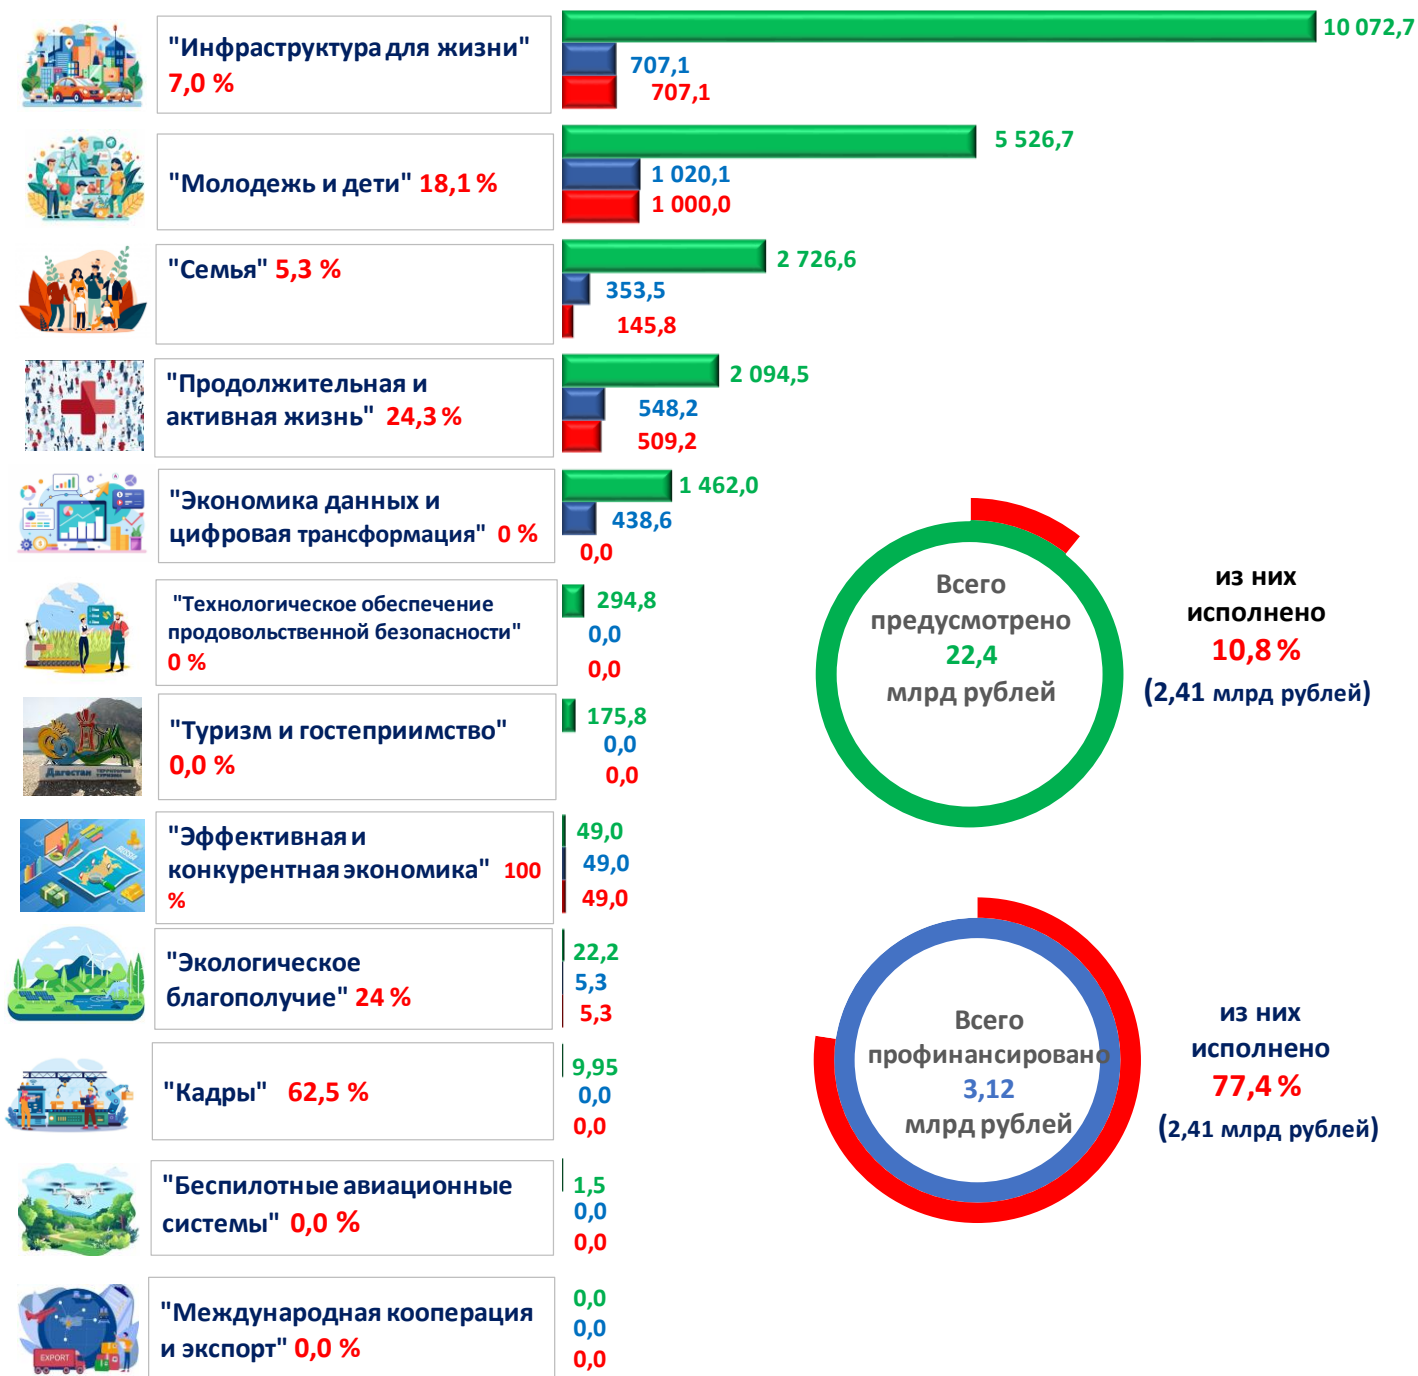

По четырем национальным проектам («Туризм и гостеприимство», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры»), финансирование отсутствует.

Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию семи национальных проектов, кассовое исполнение составило 2 416,4 млн рублей, или 77,4 % от объема финансирования и 10,8 % от объема годовых назначений (22 435,8 млн рублей). По национальному проекту ««Экономика данных и цифровая трансформация государства» кассовое исполнение отсутствует.

Проведенный анализ освоения средств в разрезе видов расходов свидетельствует о том, что в 2025 г. более ритмично будет осуществляться расходование средств на выплаты в рамках социального обеспечения по мероприятиям двух национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети».

По остальным видам расходов кассовое исполнение запланировано по мере оплаты товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных (муниципальных) контрактов за фактически выполненные объемы работ (поставленные товары, услуги).

4. Темпы финансирования и освоения средств, напрямую связаны с заключением контрактов в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов. В 2025 г. в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов из 11 финансируемых национальных проектов по 7 национальным проектам запланировано заключить 411 контрактов.

По 4 национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика») заключение контрактов не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. из 411 запланированных контрактов, заключены 214 контрактов по 5 национальным проектам, или 52 % на общую сумму 10 274,0 млн рублей, в том числе:


– по 2 нацпроектам уровень заключенных контрактов составил 70-71 % («Молодежь и дети» (71 %), «Продолжительная и активная жизнь» (70 %);

– по 3 нацпроектам от 9 % до 43 % («Семья» (43 %), «Инфраструктура для жизни (31 %»)), «Туризм и гостеприимство» (9 %).

По 2 национальным проектам контракты не заключены («Беспилотные авиационные системы» (1 контракт); «Экономика данных и цифровая трансформация государства», 1 контракт)

Кроме того, по региональному проекту «Многодетная семья» (национальный проект «Семья») запланировано заключение 5 215 социальных контактов с гражданами на сумму 1 102,6 млн рублей (учитываются отдельно от общего количества контрактов в виду особенности их заключения). Из них, заключены 1 397 социальных контрактов, или 27 %, на сумму 120,5 млн рублей.

**Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2025 году**

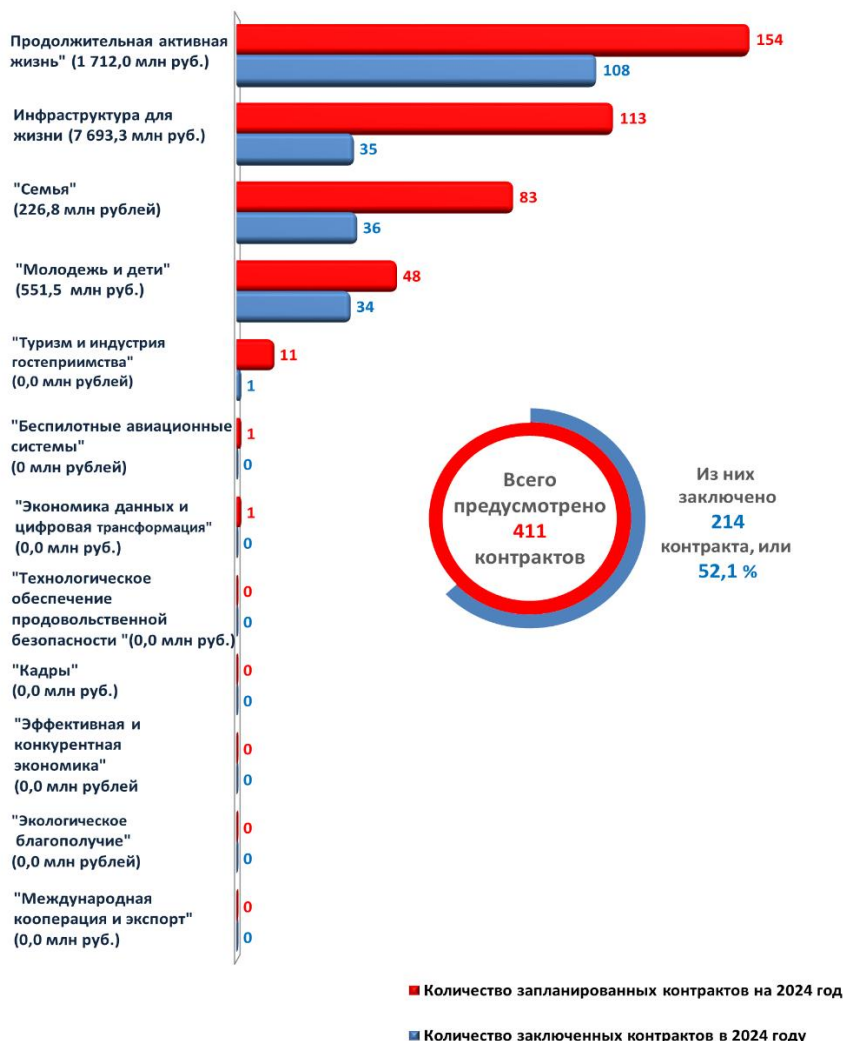

5. Поручение Главы Республики Дагестан данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25, об обеспечении в срок до 1 апреля 2025 г. заключения всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов выполнено только по 2 региональным проектам из 17 региональных проектов, по которым предусмотрено заключение контрактов:

- «Профессионалитет» («Молодежь и дети»);
- «Региональная и местная дорожная сеть» («Инфраструктура для жизни»);

По состоянию на 1 апреля 2025 г. не заключены 197 контрактов, срок заключения которых запланирован на апрель – 126 контрактов, май – 26 контрактов, другие месяцы – 35 контрактов.

Низкий уровень заключения контрактов может явиться причиной неосвоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов и как следствие, недостижения целевых показателей, предусмотренных в Соглашениях с федеральными органами власти.



## 2. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



*Куратор национального проекта:*  
**Махмудов А. М.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан



*Руководитель региональных проектов:*  
**Глазов Я.Н.**  
Министр здравоохранения  
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» до конца 2030 года запланировано:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6;
- снижение временной нетрудоспособности трудоспособных граждан;
- повышение уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации;
- создание и запуск цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни.

В рамках национального проекта «Продолжительность и активная жизнь» в Республике Дагестан реализуются 9 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Модернизация первичного звена здравоохранения»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 4) «Борьба с сахарным диабетом»;
- 5) «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;
- 6) «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;
- 7) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
- 8) «Здоровье для каждого»;
- 9) «Медицинские кадры».

Реализацию нацпроекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2025 г. на мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 2 094,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 886,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 208,1 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 548,2 млн рублей, или 26,2 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 509,2 млн рублей, или 93,0 % от объема финансирования, и 24,3 % от годовых назначений.

Национальный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». При этом, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» в составе государственной программы (версия №1) отсутствуют структурные элементы в виде региональных проектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (отражены региональные проекты национального проекта «Здравоохранение» (2019-2024).

В 2025 г. из 9 региональных проектов запланировано финансирование 7 региональных проектов. По региональным проектам «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Медицинские кадры» финансирование не предусмотрено.

Заключены 108 контрактов или 70,0 % плана (154 контрактов по 5 региональным проектам) на общую сумму 1 712,0 млн рублей.



## **2.1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».**

В ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан», предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- оснащение автотранспортом (за исключением автомобилей скорой помощи) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение передвижных медицинских комплектов (171 единиц) – 190,5 млн рублей;

- дооснащение и переоснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек медоборудованием (746 единиц) – 251,2 млн рублей;

- создание 45 объектов первичного звена здравоохранения – 644,0 тыс. рублей, в том числе: приобретение и монтаж быстровозводимых модульной конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов (43 объекта) – 640,7 млн рублей, и реконструкция зданий медицинских организаций (2 объектов) – 3,3 млн рублей.

- капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек (76 объектов) – 504,7 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 590,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 554,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 35,82 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 533,7 млн рублей, или 33,6 % от объема годовых назначений (1 590,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 497,7 млн рублей, или 93,3 % от объема финансирования и 31,3 % от годовых назначений.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, в паспорте регионального проекта на 2025 г. (1 586,2 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (1 590,3 млн рублей).

Из 88 плановых контрактов (договоров) заключено 87 контрактов, или 99 % от плана на общую сумму 1 575,4 млн рублей, в том числе:

- 1) В целях оснащения автотранспортом медицинских организаций, заключен 1 контракт на поставку 171 автомобилей на сумму 190,5 млн рублей или 100% от плана. Экономия и нераспределенный остаток составили 0,02 млн руб. Поставлена в медицинские организации 171 единица автотранспорта или 100% от плана;

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

2) В целях оснащения медицинских организаций медицинским оборудованием, заключено 5 контрактов на сумму 245,2 млн рублей на поставку 746 ед. оборудования. Поставлено 727 единиц оборудования или 97,5 % от плана. Экономия и нераспределенный остаток составили 5,9 млн рублей;

3) В целях создания и реконструкции 45 объектов первичного звена здравоохранения, запланировано заключено 6 контрактов на сумму 636,9 млн рублей или 100% от плана, в том числе:

– 4 контракта на сумму 633,7 млн рублей по монтажу 43 объектов быстровозводимых модульных конструкций, или 100% от плана. Экономия составила 1,5 млн рублей;

– 2 контракта на сумму 3,2 млн рублей по реконструкции 2 объектов медицинских организаций или 100% от плана. Экономия составила 0,1 млн рублей.

Нераспределенный остаток составил 3,3 млн рублей.

### Перечень объектов быстровозводимых модульных конструкций и реконструкции, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

№	Тип объекта	Наименование Учреждения	Кол-во (ед.)	Сроки поставки/монтажа	Готовность (%)
<b>Быстровозводимые модульные конструкции</b>					
1	ВА	"РД, г. Кизляр, поселок городского типа Комсомольский, ул. Кирова, 5	1 ед.	В течение 45 дней с момента поступления заявки заказчика. Заявка направляется не ранее 01.05.2024 и не позднее 01.09.2024 г.  Подрядчик ООО «СК Альянс Групп»	-
2	ВА	"РД, Бабаюртовский район, с. Уцми-Юрт, ул. Омарова, 17	1 ед.		-
3	ВА	"РД, Буйнакский район, с. Верхний Каранай, ул. Расула Гамзатова, 1	1 ед.		-
4	ВА	РД, Гунибский район, с.Кудали, ул. Кудалинская, 10	1 ед.		-
5	ВА	РД, Казбековский район, с. Инчха, ул. Имама Шамиля, 2	1 ед.		-
6	ВА	РД, Карабудахкентский район, с. Параул	1 ед.		-
7	ВА	РД, Карабудахкентский район, с. Агачаул	1 ед.		-
8	ВА	РД, Кизлярский район, с. Цветковка, ул. Ленина, 3	1 ед.		-
9	ВА	РД, г. Махачкала, пос. Богатыревка	1 ед.		-
10	ВА	РД, Новолакский район, с.Новокули (Новострой)	1 ед.		-
11	ВА	РД, Хасавюртовский район, с.Новогагатли	1 ед.		-
12	ВА	РД, Буйнакский район, с. Кадар	1 ед.		-
13	ВА	РД, Ахвахский район, с. Местерух,	1 ед.	В течение 45 дней с момента поступления заявки заказчика. Заявка направляется не	-
14	ВА	РД, Дербентский район, с. Хазар, ул. Коммунаров, 1	1 ед.		-
16	ВА	РД, Дербентский район, с. Деличобан, ул. Огородная, 1	1 ед.		-

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование Учреждения	Кол-во (ед.)	Сроки поставки/монтажа	Готовность (%)		
				ранее 01.05.2024 и не позднее 01.09.2024 г.			
15	ВА	РД, Докузпаринский район, с. Авадан, ул. Сулеймана Стальского, 26	1 ед.	ИП Магомедов Гамзат	-		
17	ВА	РД, Каякентский район, с. Сагаси-Дейбук, ул. Комсомольская, 1	1 ед.		Подрядчик ООО «Спецстроймонтаж»	-	
18	ВА	РД, Левашинский район, с. Уллуая, ул. Школьная, 1	1 ед.			-	
19	ВА	РД, Магарамкентский район, с. Гильяр, ул. Е.Эмина, 2	1 ед.			-	
20	ВА	РД, Сергокалинский район, с. Урахи	1 ед.			-	
21	ФАП	РД, Чародинский район, с. Урух-Сота, ул. Урух-Сотинская, 3	1 ед.	В течение 30 дней с момента поступления заявки заказчика. Заявка направляется не ранее 01.05.2024 и не позднее 01.09.2024 г. ИП Магомедов Гамзат	-		
22	ФАП	РД, Докузпаринский район, с. Новое Каракюре, ул. Абусаида Керимова 33 а	1 ед.			-	
23	ФАП	РД, Шамильский район, с. с.Верхний Батлук	1 ед.			-	
24	ФАП	РД, Кулинский район, с. Цовкра 1-я, ул. Казбекова, 4	1 ед.			-	
25	ФАП	РД, Рутульский район, с. Шиназ	1 ед.			-	
26	ФАП	РД, Тляратинский район, с. Никар	1 ед.			-	
27	ФАП	РД, Хунзахский район, с. Сиух	1 ед.			-	
28	ФАП	РД, Хунзахский район, с. Буцра	1 ед.			-	
29	ФАП	РД, Бабаюртовский район, с. Чанка-Юрт;	1 ед.		В течение 30 дней с момента поступления заявки заказчика. Заявка направляется не ранее 01.05.2024 и не позднее 01.09.2024 г. Подрядчик ООО «Интех»	-	
30	ФАП	РД, Ботлихский район, с.Кванхидатли;	1 ед.				-
31	ФАП	РД, Буйнакский район, с. Такалай;	1 ед.				-
32	ФАП	РД, Кайтагский район, с. Джирабачи;	1 ед.				-
33	ФАП	РД, Кизлярский район, с. Новый Бирюзьяк;	1 ед.				-
34	ФАП	РД, Кизлярский район, Михеевка;	1 ед.			-	
35	ФАП	РД, Кизлярский район, Хуцеевка	1 ед.			-	
36	ФАП	РД, Кизлярский район, п.им.Кирова;	1 ед.			-	
37	ФАП	РД, Магарамкентский район, с. Гарах;	1 ед.			-	
38	ФАП	РД, Табасаранский район, с. Рушуль;	1 ед.			-	
39	ФАП	РД, Табасаранский район, с. Лидже;	1 ед.			-	
40	ФАП	РД, Акушинский район, с.Куркеби;	1 ед.			-	
41	ФАП	РД, Новолакский район; с.Новочуртах (Новострой);	1 ед.			-	
42	ФАП	РД, Новолакский район; с.Шушия (Новострой);	1 ед.			-	
43	ФАП	РД, Хивский район, с.Зильдик.	1 ед.			-	
<b>Реконструкция</b>							
1	ФАП	Агульский район, с. Амух, ул. Амухская 2.	1 ед.	15.09.2025	-		
2	ФАП	Левашинский район, с. Кулибухна, ул. Лесная 25.	1 ед.	15.09.2025	-		
		<b>Итого объектов</b>	<b>45 ед.</b>				

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Работы по созданию 45 объектов первичного звена здравоохранения, в том числе по монтажу 43 объектов быстровозводимых модульных конструкций и 2 объектов реконструкции не начаты;

4) В целях капитального ремонта 76 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений (504,7 млн рублей) заключено 75 контрактов на сумму 502,74 млн рублей или 99 % от плана.

Имеется риск несвоевременного заключения 1 контракта по объекту «Внутренняя амбулатория, РД, Гунибский район, с. Салта» на сумму 5,4 млн рублей, ввиду отсутствия лимитов из федерального бюджета. Указанное обстоятельство вызвано тем, что при внесении изменений в региональный проект объем средств, необходимых на мероприятие по капремонту на 2025 год, увеличился на 5,43 млн рублей. Планируемый срок заключения контракта – до 1 июня 2025 г.

### Перечень объектов, капитального ремонта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2025 году.

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)
1	П	РД, Агульский район, с. Тпиг	01.12.2025	100
2	ФАП	РД, Гунибский район, с. Хиндах, ул. Хиндахская, 1	01.12.2025	45
3	ФАП	РД, Гунибский район, с. Коммуна	01.12.2025	40
4	ФАП	РД, Кизлярский район, с. Малая Арешевка, ул. Мельничкова, 53	01.12.2025	30
5	ФП	РД, Хунзахский район, с. Баитль, ул. Гаджи Гасангусейнова, 27	01.09.2025	40
6	ФП	РД, Хунзахский район, с. Гацалух, ул. Гацалухская, 10	01.09.2025	40
7	УБ	РД, Гунибский район, с. Согратль	01.12.2025	25
8	С	РД, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 44	01.12.2025	35
9	ФАП	РД, Хасавюртовский район, с. Пятилетка	01.12.2025	20
10	ФАП	РД, Магарамкентский район, с. Хтун-Казмаляр	01.12.2025	20
11	ФАП	РД, Хивский район, с. Межгюль	01.12.2025	20
12	ФП	РД, Дербентский район, с. Коммуна, ул. Самурская, 1	01.12.2025	20
13	ФАП	РД, Магарамкентский район, с. Филя	01.12.2025	20
14	ВА	РД, Дербентский район, с. Великент, ул. Свободы, 1	01.12.2025	20
15	ВА	РД, г. Махачкала, п. Тарки	01.12.2025	15
16	ВА	РД, Ботлихский район, с. Годобери	01.12.2025	20
17	ЦРБ	РД, город Махачкала, Федеральное ш., д. 212 (Новострой)	01.12.2025	15
18	УБ	РД, Казбековский район, пгт Дубки	01.12.2025	20
19	ВА	РД, Кулинский район, с. Вихли, ул. 70 лет Победы 12	01.12.2025	25
20	УБ	РД, Кулинский район, с. Кули	01.12.2025	20
21	ВА	РД, Кизилпортовский район, с. Чонтаул	01.12.2025	20
22	ЦРБ (терапия)	РД, Казбековский район, с. ДЫЛЫМ	01.12.2025	20
23	ФП	РД, Хунзахский район, с. Гонох, ул. 3 Алиева, 11	01.12.2025	25
24	П	"РД, г. Дербент, ул. Ленина, 8»	01.12.2025	20

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)
25	ЦРБ	РД, Гумбетовский район, с.Мехельта	01.12.2025	15
26	ВА	РД, г. Махачкала, с. Красноармейское, ул. Комсомольская, 4	01.09.2025	30
27	ВА	РД, Дахадаевский район, с.Харбук	01.12.2025	30
28	П	РД, г. Избербаш, ул. Маяковского 114а	01.12.2025	10
29	УБ	РД, Гумбетовский район, с.Игали	01.12.2025	15
30	ФАП	РД, Тарумовский район, с.Коктюбей	01.12.2025	20
31	П	РД, Кайтагский район, с.Маджалис	01.12.2025	18
32	ФАП	РД ,Лакский район, с. Кунды	01.12.2025	15
33	ВА	РД, Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, ул.Школьная, 1	01.12.2025	15
34	П № 8	РД, Махачкала, ул. А.Юсупова, 14	01.12.2025	10
35	ПО	РД, Унцукульский район, п.Шамилькала	01.12.2025	10
36	ВА	РД, Гунибский район, с. Ругуджа	01.12.2025	15
37	ЦРБ	РД, Каякентский район, с.Каякент	01.12.2025	15
38	ФП	РД, Цунтинский район, с. Гутатли, ул. М. Гамзатова, 39	01.12.2025	25
39	ФП	РД, Цунтинский район, с. Хибиятли	01.12.2025	25
40	УБ	РД, Дахадаевский район, с.Ашты	01.12.2025	30
41	ФП	РД, Хунзахский район, с.Гозолоколо, ул.Центральная, 29	01.12.2025	5
42	ФП	РД, Гумбетовский район, с. Тантари	01.12.2025	10
43	ФАП	РД, Ботлихский район, с. Тандо	01.12.2025	10
44	ФАП	РД, Гунибский район, с. Мегеб, ул. М.Гаджиева, 1	01.12.2025	15
45	УБ	РД, Гунибский район, с.Корода	01.12.2025	10
46	Н	РД, Казбековский район, с. Дьбылым	01.12.2025	5
47	ФАП	РД, Цумадинский район, с.Кванада	01.12.2025	25
48	ФАП	РД, Ахвахский район, с. Тлиси, ул. Тильсинская, 2	01.12.2025	5
49	ФАП	РД, Ахвахский район, с. Тукита, ул. Тукитинская, 1а	01.12.2025	8
50	ФАП	РД, Ахвахский район, с. Цолода, ул. Цолодинская, 1а	01.12.2025	8
51	УБ	РД, Ахтынский район, с. Хнов, ул. Агаева К.А, 15	01.12.2025	8
52	ФП	РД, Ахтынский район, с.Миджах	01.12.2025	8
53	УБ	РД, Гергебильский район, с.Маали	01.12.2025	10
54	ФП	РД, Гергебильский район, с.Тунзи	01.12.2025	5
55	ВА	РД, Дахадаевский район, с.Гулатды	01.12.2025	5
56	ФАП	РД, Дахадаевский район, с.Дзилебки	01.12.2025	5
57	ВА	РД, Дахадаевский район, с.Кища	01.12.2025	5
58	УБ	РД, Левашинский район, с. Кулецма	01.12.2025	15
59	ФП	РД, Левашинский район, с. Тагиркент	01.12.2025	5
60	УБ	РД, Хасавюртовский район, с.Теречное	01.12.2025	8
61	УБ	РД, Хивский район, с. Ляхля, ул. Фабричная, 3	01.12.2025	10
62	ФП	РД, Чародинский район, с. Карануб, ул. Каранубская,	01.12.2025	5
63	ФП	РД, Чародинский район, с. Мугурух, ул. Мугурухская	01.12.2025	5
64	ФАП	РД, Чародинский район, с. Чарода	01.12.2025	5
65	ФАП	РД, Ахвахский район, с. Ингердах	01.12.2025	8

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)
66	ФАП	РД, Карабудахкентский район, с. Какамахи	01.12.2025	10
67	ФАП	РД, Кулинский район, с. Хайми	01.12.2025	5
68	П	РД, г. Каспийск, ул. С. Стальского, 2	01.12.2025	5
69	ФП	РД, Кизлярский район, с. Выше-Таловка, ул. Интернациональная, 101»	01.12.2025	20
70	ФП	РД, Кизлярский район, с. Сангиши, ул. Ленина, 26	01.12.2025	10
71	УБ	РД, Кизлярский район, с. Серебряковка	01.12.2025	5
72	ФАП	РД, Новолакский район, с. Новокули, ул. Садовая, 4	01.12.2025	5
73	УБ	РД, Шамильский район, с. Нижний Батлук	01.12.2025	8
74	ЦРБ	РД, Шамильский район, с. Хебда	01.12.2025	5
75	П	РД, Новолакский район, с. Новолакское, ул. Хайдакова, 45	01.12.2025	5
76	ВА	РД, Гунибский район, с. Салта	Не законтрактован	

Уровень готовности объектов капитального ремонта представлен следующим образом:

- по 1 объекту – работы завершены;
- по 15 объектам – от 25 до 40 %;
- по 59 объектам – от 5% до 20 %;
- по 1 объекту контракт не заключен.

Срок завершения строительства объектов запланирован до 1 декабря 2025 г., за исключением 2 объектов со сроком окончания работ до 1 сентября 2025 г.

Из 4 целевых показателей регионального проекта по 1 показателю «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения» обеспечено достижение (59,7 %) на 97,8 % от плановых значений (60,7 %).

По 2 целевым показателям фактические значения составили от 8,4 % до 23 % от плана:

- «Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта» – 5,9 % или 8,4 % от плановых значений (70 %);

- «Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения» – 18,2 % или 23 % от плановых значений (80,3 %);

По показателю «Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях» фактические значения не отражены.



## 2.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланировано проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 83,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 82,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,8 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 4,82 млн рублей, или 5,8 % от объема годовых назначений (1 590,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1,7 млн рублей, или 2,1 % от объема финансирования и 2,1 % от годовых назначений.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, в паспорте регионального проекта на 2025 г. (83,2 млн рублей), соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (83,2 млн рублей).

Из 27 плановых контрактов (договоров) заключено 20 контрактов, или 74,1 % от плана на общую сумму 48,5 млн рублей.

По 2 контрактам на сумму 9,65 млн рублей проводится работа комиссии по определению поставщика.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 1,74 млн рублей.

По результату «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» фактическое значение составило 5 218 человека или 121 % от плана (4 293 чел.), что свидетельствует о занижении плановых значений на 2025 год.

Из 6 целевых показателей по 3 показателям фактические значения по показателям составляют от 96,6 % до 128,6 % от плана на 2025 год, что также свидетельствует о занижении плановых значений.

По 3 показателям фактические значения составили от 40,5 % до 81 % от плановых значений на 2025 год:

– «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» – 10,8 % или 78,7 % от плана (8,5 %);

– «Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара» – 0,81 %, или 40,5 % от плана (2 %);

– «Доля лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, процент» – 77,4 %, или 81 % от плана (95,5%).



### 2.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2025 году предусмотрено обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных.

Финансирование по региональному проекту не предусмотрено.

Из 4 целевых показателей по 3 показателям обеспечено достижение от 107 % до 115 % от плана на 2025 год, что свидетельствует о занижении плановых значений, в том числе:

– «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций» – 48,9 % или 107 % от плановых значений (45,5%);

– «Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования» – 72,3% или 109 % от плановых значений (66,1%);

– «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) – 16,8 % или 115 % от плановых значений (19,4 %).

По показателю «Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение» исполнение отсутствует.

Также отсутствует фактическое исполнение по двум результатам регионального проекта:

– «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

– «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи».



### 2.4. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом».

В ходе регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году запланировано повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета, а также увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом, путем реализации следующих мероприятий:

- оснащение региональных, межрайонных центров, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом (1 ед.) – 10,5 млн рублей;
- обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы 569 детей с сахарным диабетом 1 типа – 65,8 млн рублей;
- обеспечение свыше 100 беременных женщин с сахарным диабетом, нуждающихся в системах непрерывного мониторинга глюкозы (133 чел.) – 10,5 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 86,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 85,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,9 млн рублей). Финансирование отсутствует.

Объемы финансирования, в паспорте регионального проекта на 2025 г., соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год».

Процедуры по заключению контрактов приостановлены, в связи внесением изменений в Приказ Минздрава РФ от 13 марта 2023 г. № 104н.

Из 6 результатов регионального проекта 3 результатам исполнение отсутствует. По остальным результатам фактические значения составляют:

- «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» – 645 человек или 113 % от плана (569 чел.), что свидетельствует о занижении плановых значений на 2025 год;
- «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» – 35 человек или 26 % от плана (133 чел.);
- «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» фактическое значение составило 3,090 тыс. человек или 43,5 % от плана (7,088 чел.).

Из 3 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение от 110 % до 122 % от плана на 2025 год, что также свидетельствует о занижении плановых значений.

По показателю «Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год» достижение составило 6,2 % или 21,7% от плана (28,5%).

Поздние сроки финансирования и заключения контрактов увеличивают риски освоения средств и достижения результатов регионального проекта.



## **2.5. Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания».**

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «Хронический вирусный гепатит С».

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 41,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 41,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,4 млн рублей).

Финансирование по региональному проекту отсутствует.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, в паспорте регионального проекта на 2025 г. (41,6 млн рублей), соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (41,6 млн рублей).

По мероприятиям регионального проекта подготовлена первичная заявка по потребности в Министерство здравоохранения Ставропольского края для участия в совместном аукционе.

Из 5 целевых показателей по 3 показателям обеспечено достижение от 105,5 % до 429,1 % от плана на 2025 год, что свидетельствует о занижении плановых значений.

По остальным 2 показателям обеспечено достижение плановых значений в диапазоне от 13 % до 19,6 %, в том числе:

– «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением» – 0,5 % или 13,1 % от плана (3,82 %);

– «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным» – 0,9 % или 19,6 % от плана (5,1 %).

Поздние сроки финансирования и заключения контрактов увеличивают риски освоения средств и достижения результатов регионального проекта.



## **2.6. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи».**

В ходе реализации регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» в 2025 году предусмотрено развитие санитарной авиации в Республике Дагестан, для оказания экстренной медицинской помощи населению авиационным обслуживанием.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 232,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 62,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 169,5 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 9,8 млн рублей, или 4,2 % от объема годовых назначений (232,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 9,8 млн рублей, или 4,2 % от объема финансирования и годовых назначений.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, в паспорте регионального проекта на 2025 г. (232,5 млн рублей), соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (232,5 млн рублей).

Из 2 плановых контрактов (договоров) заключен 1 контракт, или 88,1 % от плана на общую сумму 48,5 млн рублей (ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф») на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

По состоянию на 1 апреля 2024 г. по целевому показателю «Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» фактическое значение составило 30 вылетов вертолетом санитарной авиации, или 20 % от планового количества (150 вылетов).

Эвакуировано в медицинские организации 34 человека (из них детей – 9 человек) или 9 % от плана (220 чел.).



## 2.7. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

В ходе реализации регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2025 году запланировано оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций (ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница», ГБУ РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии им. А.О. Махачева»), имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 54,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 53,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

Финансирование по региональному проекту отсутствует.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, в паспорте регионального проекта на 2025 г. (54,2 млн рублей), соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (54,2 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта запланировано заключить 34 контракта на закупку 65 единиц медицинских изделий на сумму 54,21 млн рубле, из них:

- 5 контрактов на сумму 8,6 млн рублей на этапе приема заявок;
- по 4 аукционам документация направлена в Комитет по госзакупкам;
- по остальным аукционам готовится документация для направления в

Комитет по госзакупкам.

По 2 целевым показателям регионального проекта обеспечено достижение от 8,0 % до 22,5 % от плана на 2025 год, в том числе:

- «Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» – 5 % или 8 % от плана (60%);
- «Увеличено числа лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации» – 0,9 % или 22,5 % от плана (4%).

Поздние сроки финансирования и заключения контрактов увеличивают риски освоения средств и достижения результатов регионального проекта.



## 2.8. Региональный проект «Здоровье для каждого».

В ходе реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» в 2025 году предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, в том числе путем организации центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, за счет реализации следующих мероприятий:

– организация Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница») – 0,81 млн рублей;

– оснащение/дооснащение Центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В 2025 году планируется оснастить три Центра здоровья (ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница») – 5,4 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 6,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,06 млн рублей).

Финансирование по региональному проекту отсутствует.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, в паспорте регионального проекта на 2025 г. (6,42 млн рублей), не соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (6,17 млн рублей).

Закупочные процедуры приостановлены в связи с тем, что в настоящее время осуществляется работа по внесению изменений в приказ Минздрава России от 29.10.2020 № 1177н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях» в части корректировки стандарта оснащения центра здоровья.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. по всем трем целевым показателям при наличии промежуточных плановых значений, фактические значения отсутствуют.

Поздние сроки финансирования влекут риски своевременного освоения бюджетных средств, заключения контрактов и достижения плановых показателей регионального проекта.



## 2.9. Региональный проект «Медицинские кадры».

В ходе реализации регионального проекта «Медицинские кадры» в 2025 году запланирована ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях и повышение доступности медицинской помощи для граждан, путем:

- обеспечения трудоустройства ординаторов второго года врачами-стажерами (39 чел.);
- обеспечения направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации (10 чел.);
- увеличения контрольных цифр приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования (1 935 ед.);
- обучения по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающие обязательство по трудоустройству (100 чел.);
- обучения по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи (500 чел.);
- проведения образовательных мероприятий, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом (229 чел.).

На реализацию регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Из 3 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение от 100 % до 104 % от плана на 2025 год, что свидетельствует о занижении плановых значений, в том числе:

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – 36,3 человек или 100 % от плана (36,3 чел.);
- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – 81,9 человек или 104 % от плана (78,7 чел.).

По показателю «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации» фактическое достижение отсутствует.



### **3. Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»**



*Куратор национального  
проекта:*

**Абдулмуталибов Н.Ш.**

Заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Дагестан



*Руководитель регионального проекта:*

**Куччаев З.Г.**

Врио министра сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» запланировано:

– увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года;

– увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Из пяти федеральных проектов национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» («Ветеринарные препараты», «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств», «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», «Кадры в агропромышленном комплексе», «Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности») в Республике Дагестан в рамках соответствующего федерального проекта реализуется **региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе».**

В ходе регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» запланировано повышение укомплектованности кадрами агропромышленного комплекса Республики Дагестан (к 2030 году – не менее 95 процентов), в том числе в 2025 г. за счет оказания мер государственной поддержки за счет:

– строительства (приобретения) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения (2671 кв. метров для 38 специалистов) – 277,0 млн рублей;

– предоставления выплат стимулирующего характера в целях привлечения специалистов к участию в ключевых проектах в сфере агропромышленного комплекса (36 человек) – 17,6 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 294,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 291,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,95 млн рублей). Финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2025 год в проекте государственной программы соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (294,8 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (294,8 млн рублей).

В ходе регионального проекта в 2025 г. планируется заключение 69 договоров в целях предоставления:

– жилья по договору найма жилых помещений – 8 договоров. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением);

– выплат стимулирующего характера специалистам – 61 договор. Мера предполагает возмещение затрат заказчика на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школах с агротехнологическими классами (55 договоров) и в средних профессиональных образовательных организациях (6 договоров). Размер возмещения определен: для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений в виде 90 процентов, для учителей агротехнологических классов – 95 процентов; для иных учреждений – 30 процентов);

По состоянию на 1 апреля 2025 г. договоры не заключены.

Достижение целевых показателей по региональному проекту не предусмотрено.

Общее количество запланированных результатов в отчетном периоде – 2 результата, исполнение отсутствует.



## 4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

### Кураторы национального проекта:



**Мажонц М.Л.**  
Заместитель Председателя  
Правительства  
Республики Дагестан



**Газимагомедов Р.К.**  
Заместитель  
Председателя  
Правительства  
Республики Дагестан

### Руководители региональных проектов:



**Уллаев А.П.**  
Министр строительства,  
архитектуры и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Республики Дагестан



**Салавов Д. Ш.**  
Министр транспорта и  
дорожного  
хозяйства Республики  
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано:

- улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах;
- устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;
- благоустройство общественных пространств, а также реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
- строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году;
- увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуются 7 региональных проектов:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
- 3) «Формирование комфортной городской среды»;
- 4) «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;
- 5) «Безопасность дорожного движения»;
- 6) «Региональная и местная дорожная сеть»;
- 7) «Общественные меры развития дорожного движения».

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

На реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 10 072,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 7 910,2 млн рублей, республиканского бюджета – 2 044,2 млн рублей, средства муниципальных образований – 118,4 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансировано 707,1 млн рублей, или 7,0 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 707,1 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 7,0 % годовых назначений.

Заключены 35 контрактов, или 31,0 % от плана (113 контрактов) на общую сумму 7 663,0 млн рублей.

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» из 7 региональных проектов запланировано финансирование 5 региональных проектов. Финансирование региональных проектов «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Безопасность дорожного движения», «Развитие федеральной сети» не предусмотрено.



#### 4.1. Региональный проект «Жилье».

В ходе регионального проекта «Жилье» запланировано улучшение жилищных условия граждан за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья.

Проект реализуется Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 208,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 205,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,1 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. средства не профинансированы.

Заключение в рамках регионального проекта контрактов не предусмотрено.

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 25 июня 2024 г. № 291-р предусмотрено комплексное развитие незастроенной территории площадью 216 268 кв. м, расположенной в мкр. Ипподром в г. Махачкале.

Победителем конкурса на реализацию проекта комплексного развития территории определено АО «Специализированный застройщик «Каспий», с которым заключен договор от 20.12.2024 г.

В рамках проекта в 2025 году запланировано субсидирование мероприятий по комплексному развитию территории с бюджетом – 208,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 205,9 млн рублей).

Отсутствие разрешений на строительство в 2025 году жилых домов на территории мкр. Ипподром и бюджетных обязательств Республики Дагестан на строительство объектов, не соответствует критериям предоставления субсидий. Также не определен объект софинансирования.

Согласно информации, содержащейся на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, документация по планировке территории находится на стадии разработки. После завершения она будет согласована с Минстроем Дагестан и утверждена Администрацией города Махачкалы.

Согласно Соглашению от 23 декабря 2024 г. № 069-2024-И20031-1, заключенному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с Правительством Республики Дагестан, в ходе реализации регионального проекта «Жилье» в 2025 году запланировано достижение объема жилищного строительства в размере 1 500 тыс. кв. м.

Финансирование регионального проекта «Жилье» в 2025 году не предусмотрено.

По информации Дагестанстата в I квартале 2025 г. введено жилья 433,869 тыс. кв. м (39,1 % к I кварталу 2024 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 298,140 тыс. кв. м.;
- строительство многоквартирных домов – 135,729 тыс. кв. м.

Уровень достижения значения показателя по Соглашению от 23 декабря 2024 года № 069-2024-И20031-1 составил 26,8 %.

Прогнозное значение на 1 апреля 2025 г. на ввод жилья на январь – март 2025 г. составляло 367,0 тыс. кв. м (33,1 % к январю - марту 2024 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 217,3 тыс. кв. м. (21,4 % к январю - марту 2024 года);
- строительство многоквартирных домов – 149,7 тыс. кв. м. (157,4 % к январю - марту 2024 года).

В отчете о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 апреля 2025 г. по целевому показателю «Объем жилищного строительства» фактическое значение составляет 327,0 тыс. кв. м, или 20,2 % от плана (1 617 тыс. кв. м).

**Динамика выполнении целевых показателей регионального проекта «Жилье»**

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
<b>2018</b>	тыс.кв.м.	891,2	976,0
<b>2019</b>	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
<b>2020</b>	тыс.кв.м.	929,0	969,7
<b>2021</b>	тыс.кв.м.	937,0	1 031,2
<b>2022</b>	тыс.кв.м.	1 004,0	1 005,3
<b>2023</b>	тыс.кв.м.	1 132,0	1 132,0
<b>2024</b>	тыс.кв.м.	2 178,0	2 996,4
<b>01.04.2025</b>	тыс.кв.м.	327,0	433,9

В настоящее время на федеральном уровне в нормативно-правовые акты (Жилищный кодекс РФ от 29.11.2004 г. № 188-ФЗ, Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ) вносятся изменения в механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, по итогам которых будет разработана и утверждена республиканская адресная программа.

Согласно разработанным проектам нормативно-правовых актов, оставшийся нерасселенным, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (2019-2024), аварийный жилищный фонд будет включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан до 2030 года в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни».



#### **4.2. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».**

В рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Республике Дагестан запланировано улучшение качества предоставляемых услуг за счет строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

В 2025 году на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 966,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 637,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 329,2 млн рублей).

Согласно паспорту регионального проекта, финансирование запланировано с апреля 2025 г.

Заказчиком работ по строительству 3 объектов является ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ по Республике Дагестан».

На строительство 1 объекта и реконструкции 2 объектов водоснабжения в 2025 г. запланировано заключение 3 контрактов. Срок заключения контрактов (до 1 апреля 2025 г.) перенесен (до 10 июня 2025 г.). Заявка о пообъектном распределении на стадии рассмотрения в Минстрое России. Дополнительное соглашение о пообъектном предоставлении субсидии Минстроем России не представлено.

#### **Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры»**

№	Стройки и объекты	Мощность	Лимит на 2025 г.	Ввод в эксплуатацию
1	Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция ул. Абдулманапова	78 м <sup>3</sup> /ч	55,11	2026 г.
2	Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска	26,586 км	826,67	2025 г.
3	Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в селе Сулевкент Хасавюртовского района	432 м <sup>3</sup> /ч	84,54	2026 г.

По результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации получены положительные заключения.

Объект «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска» планируемый к реализации в 2025 г. наиболее затратный (935,8 млн рублей) и трудоемкий (протяженность 26,586 км), в связи с чем существует риск ввода его в эксплуатацию в 2025 г., что в свою очередь приведет к недостижению целевого показателя.

В ГИИС «Электронный бюджет» по 2 целевым показателям («Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки» и «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг» исполнение отсутствует.



### 4.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за счет проведения следующих мероприятий:

- благоустройство 131 территорий в 37 муниципальных образованиях Республики Дагестан – 1 016,2 млн рублей;
- благоустройство территории природно-исторического парка Сосновый бор в ГО «город Дербент» – 72,0 млн рублей;
- благоустройство центральных улиц в ГО «город Кизляр» – 102,2 млн рублей;
- благоустройство центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий в ГО «городе Буйнакск» – 103,7 млн рублей.

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 294,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 163,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 11,8 млн рублей, средства муниципальных образований – 118,4 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства не профинансированы.

Заключены 11 муниципальных контрактов, или 12,9 % плана (8 контрактов), на сумму 134,2 млн рублей, в том числе:

1) В целях реализации мероприятий по благоустройству территорий заключены соглашения с 37 муниципальными образованиями, участниками регионального проекта (10 городских округов и 27 муниципальных районов).

На благоустройство 131 территории предусмотрены средства в сумме 1 016,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 906,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,2 млн рублей, средства муниципалитетов – 101,0 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. из запланированных заключению 82 контрактов на выполнение работ по благоустройству 131 территории:

– по 11-ти территориям (ГО «город Кизляр» – 6, МО «Ботлихский район» – 1, МО «Докузпаринский район» – 1, МО «Сулейман - Стальский район» – 3) заключены 10 муниципальных контрактов

– по 110 территориям проводятся конкурсные мероприятия по заключению 64 контрактов;

– по 10 территориям (ГО «город Буйнакск» – 4, МО «Ахвахский район» – 1 и МО «Карабудахкентский район» – 5), в рамках 8 контрактов, конкурсные мероприятия не начаты.

2) В 2025 году победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды названы проекты:

– «Природно-исторический парк Сосновый Бор» в городском округе «город Дербент» (72,0 млн рублей);

– «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе город Кизляр (102,2 млн рублей);

– «Сердце старого города. Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» (103,7 млн рублей).

На реализацию мероприятия предусмотрено 277,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 257,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млн рублей, средства муниципального бюджета 17,4 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. заключен 1 муниципальный контракт (33,3 % от плана) на выполнение работ по реализации проекта «Природно-исторический парк Сосновый Бор» в городском округе «город Дербент» (от 17.03.2025) между МБУ «Центр развития туризма и народного творчества городского округа «город Дербент» и ООО «РС-ГРУПП» на сумму 71,6 млн рублей. Срок исполнения контракта – 10.10.2025 г.

По проектам «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе «город Кизляр» и «Сердце старого города». Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» наблюдается неисполнение требований пункта 3 График реализации проекта на территории муниципального образования – победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – до 01.04.2025 не заключены контракты на выполнение работ по реализации проектов.

В 2024 г. не были завершены работы по реализации проекта победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе «город Кизилюрт» (строительная готовность – 93 %).

В настоящее время администрацией ГО «город Кизилюрт» проводятся мероприятия по приемке конкурсного объекта.

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по целевому показателю («Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)») достижение фактических значений запланировано на август 2025 г., по целевому показателю «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)» – на конец 2025 г.



#### **4.4. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».**

В ходе реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» в Республике Дагестан запланировано улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, обеспечение опережающего инфраструктурного развития Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

В рамках реализации регионального проекта, согласно государственному контракту № 28/24 от 29.11.2024, заключенному Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» запланировано завершение работ по определению границ Махачкалинско-Каспийской агломерации.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. финансовые средства на разработку мастер плана Махачкалинской агломерации в бюджете Республики Дагестан не предусмотрены.

Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации одобрено предоставление из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Дагестан инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 14 124,5 млн рублей на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск 2022-2025 гг.» (10 351,5 млн рублей) и «Напорная нитка от ГКНС-6 г. Махачкалы до канализационных очистных сооружений г. Каспийска 2023-2025 гг.».

Достижение фактического значения, по целевому показателю регионального проекта «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации», согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта за I квартал 2025 года, запланировано на конец 2025 года.



#### 4.5. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» направлена на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года.

Проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан, Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Финансирование и заключение контрактов паспортом регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

Региональный проект реализуется в составе государственных программ Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

В рамках реализации регионального проекта запланировано проведение следующих мероприятий:

- создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.;
- обеспечение и организация проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления;
- организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

Фактическое знание целевого показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий» на 1 апреля 2025 г. составило 0,6736 человек, или 85,1 % от промежуточного планового значения на 1 апреля 2025 г. – 0,5734 человек, что может свидетельствовать о недостаточности принимаемых мер органами исполнительной власти на региональном уровне, по повышению безопасности дорожного движения и снижению количества людей, погибших в результате ДТП.

Согласно данным сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации (<http://stat.gibdd.ru>) за январь-март 2025 года на территории Республики Дагестан произошло 287 ДТП (– 145 ДТП по сравнению с IV кварталом 2024 года), в которых погибли 61 человек (– 20 человек) и ранено 414 человек (– 196 человек).



#### **4.6. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».**

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» запланирована реализация мероприятий как по реконструкции новых объектов, так и капитальному ремонту и ремонту существующих объектов, за счет:

- строительства подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от ФАД Р-215 «Астрахань–Кочубей–Кизляр–Махачкала», г. Махачкала, Республика Дагестан – 3 709,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 3 327,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 381,5 млн рублей);

- приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них – 3 849,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 530,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 319,2 млн рублей).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагестанавтодор»).

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 7 559,0 млн рублей (средства республиканского бюджета – 5 858,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 700,7 млн рублей).

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2025 год в государственной программе (7559,0 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (7 559,0 млн рублей) приведены в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год (7 559,0 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансировано 645,7 млн рублей, или 8,5 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 645,7 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 8,5 % от годовых назначений.

В рамках реализации регионального проекта заключены 24 контракта на сумму 7 559,0 млн рублей, или 100 % от плана, в том числе:

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– 1 контракт на строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту;

– 23 контракта на приведение в нормативное состояние автодорог регионального и межмуниципального значения Республики Дагестан.

Заказчиком, по всем заключенным контрактам, выступает Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан» (ГКУ РД «Дагестанавтодор»).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. по 19 объектам ГКУ РД «Дагестанавтодор» кассовое исполнение составило 707,1 млн рублей, или 9,4 % от годовых назначений на 2025 г. (3 849,7 млн рублей).

### Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2025 год

№	Наименование	Контракт	Лимит на 2025 г	Касса на 01.04.25	Срок исполнения	Тех. готовность, %
<b>Строительство</b>						
1	Строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от ФАД Р-215 «Астрахань – Кочубей – Кизляр - Махачкала»	05/2025-СТР/Р на 6 624,81 млн рублей	3327,83	0,0	30.12.2026	0
<b>Ремонт</b>						
2	Ремонт а/д Буйнакск-Кизилюрт на участке км 22 – км 41	84/2024-РЕМ/Р на 486,8 млн рублей	229,03	181,8	30.10.2026	79,4
3	Ремонт а/д Магарамкент-Ахты-Рутул на участке км 75 – км 81	81/2024-РЕМ/Р на 109,8 млн рублей	109,8	35,4	30.10.2025	32,2
4	Ремонт а/д Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка на участке км 481,5 - км 493	110/23-РЕМ/Р на 275,1 млн рублей	201,51	43,4	30.09.2025	21,5
5	Ремонт а/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке км 184 – км 198	75/2024-РЕМ/Р на 230 млн рублей	230,0	42,7	30.10.2025	18,6
6	Ремонт а/д Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка на участке км 535 - км 545	77/2024-РЕМ/Р на 238,7 млн рублей	238,70	40,0	30.10.2025	16,8
7	Ремонт а/д Кизляр-Терекли-Мектеб-граница Ставропольского края на участке км 108 - км 116,4	79/2024-РЕМ/Р на 144,6 млн рублей	144,6	21,3	30.10.2025	14,7
8	Ремонт а/д Кизилюрт-Костек на участке км 0 – км 10	180/2025-РЕМ/Р на 203,6 млн рублей	55,60	8,0	30.11.2026	14,4
9	Ремонт а/д Муни-Агвали на участке км 8 - км 13	82/2024-РЕМ/Р на 102,5 млн рублей	102,5	14,8	30.11.2025	14,4
10	Ремонт а/д Касумкент-Курах на участке км 10 – км 15	192/2025-РЕМ/Р на 101,7 млн рублей	101,66	13,5	30.11.2025	13,3

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование	Контракт	Лимит на 2025 г	Касса на 01.04.25	Срок исполнения	Тех. готовность, %
11	Ремонт а/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост, км 166 - км 172	83/2024-РЕМ/Р на 113,4 млн рублей	113,4	13,7	30.10.2025	12,1
12	Ремонт а/д Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала на участке км 0 - км 14	02/24-РЕМ/Р на 349,2 млн рублей	219,3	20,0	30.10.2025	9,1
13	Ремонт а/д Манас-Сергокала-Первомайское на участке км 35 – км 39	78/2024-РЕМ/Р на 82,7 млн рублей	82,74	5,0	30.10.2025	6,0
14	Ремонт а/д Буйнакск-Гимры-Чирката на участке км 36 - км 49,7	03/24-РЕМ/Р на 351,0 млн рублей	247,8	0,0	30.10.2025	0
15	Ремонт а/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост, км 70 - км 74	76/2024-РЕМ/Р на 75,8 млн рублей	75,76	0,0	30.10.2025	0
16	Ремонт а/д Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала на участке км 111 – км 118	80/2024-РЕМ/Р на 137,8 млн рублей	137,84	0,0	30.10.2025	0
17	Ремонт а/д Урма-Губден на участке км 8 – км 14	06/2024-РЕМ/Р на 192,8 млн рублей	153,8	0,0	30.10.2025	0
<b>Капитальный ремонт</b>						
18	Капитальный ремонт а/д Хучни-Джюльджаг, км 0 – км 7,5	93/2024-КАП/Р на 375,2 млн рублей	187,57	64,4	30.10.2026	64,3
19	Капитальный ремонт а/д Буйнакск-Верхний Каранай на участке км 7 – км 16,4	87/2024-КАП/Р на 314,1 млн рублей	100,23	30,2	30.10.2026	30,2
20	Капитальный ремонт подъезда от а/д Гуниб-Кумух к с. Мегеб, км 0 - км 6	96/2024-КАП/Р на 217 млн рублей	109,12	30,8	30.10.2026	28,2
21	Капитальный ремонт а/д Маджалис-Варсит- Шиланша на участке км 0 - км 9,5	86/2024-КАП/Р на 394,4 млн рублей	242,42	54,7	30.10.2026	22,6
22	Капитальный ремонт а/д ФАД "Кавказ" - Сиртыч-Татиль на участке км 28 - км 32	89/2024-КАП/Р на 189,9 млн рублей	189,92	37,8	30.11.2025	19,9
23	Капитальный ремонт а/д Ботаюрт-Львовский №1, км 12 – км 20	95/2024-КАП/Р на 475,4 млн рублей	227,46	24,0	30.10.2026	10,6
24	Капитальный ремонт а/д Кизилюрт-Шамхал-Янги-Юрт-Сулак, км 34-км 50	90/2024-КАП/Р на 763,0 млн рублей	348,9	25,6	30.10.2026	7,3
	<b>Итого</b>		<b>3849,66</b>	<b>707,12</b>		

На 1 апреля 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения представлены следующим образом:

– «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» – 61,49 %, или 98,3 % от плана на 2025 год (приведено фактическое значение показателя за 2024 год);

– «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям» – 63,2 %, или 93,8 % от плана на 2025 год (67,38 %).



#### **4.7. Региональный проект «Общественные меры развития дорожного движения».**

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2025 году запланировано внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривая автоматизацию процессов управления дорожным движением в Махачкалинской агломерации.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 45,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 44,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. средства не профинансированы.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагестанавтодор») совместно с Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»).

Заключение единственного контракта на внедрение интеллектуальной транспортной системы запланировано в апреле 2025 года.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2025 год в государственной программе (45,4 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (45,4 млн рублей) приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (45,4 млн рублей).

Достижение фактического значения, по целевому показателю регионального проекта «Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы», согласно индикативному соглашению заключенному между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан и Министерством транспорта Российской Федерации от 16.12.2024 г. № 103-2024-И9006-1 о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан, запланировано на 2027 год.



## 5. Национальный проект «Кадры»



*Куратор национального проекта:*

**Махмудов А.М.**

Заместитель

Председателя Правительства

Республики Дагестан



**Руководитель региональных проектов**

**Кхасуров М.М.**

Министр труда и социального развития

Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Кадры» до 2030 года запланировано:

- создание эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;
- создание условий для одновременного освоения не менее чем 30 процентами студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования;
- создание к 2030 году институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации.

Из четырех федеральных проектов национального проекта «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости», «Человек труда» в Республике Дагестан в рамках соответствующих федеральных проектов реализуются:

- региональный проект «Образование для рынка труда»;
- региональный проект «Управление рынком труда» (с 2027 г.);

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

Начало реализации регионального проекта «Управление рынком труда» предусмотрено с 2027 г., в ходе которого запланирована модернизация 52 центров занятости труда в Республике Дагестан.

В ходе **регионального проекта «Образование для рынка труда»** в 2025 г. запланированы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями ОПК.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 9,95 млн рублей (средства федерального бюджета – 9,85 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей). По состоянию на 1 апреля средства не профинансированы.

Финансирование мероприятий по обучению осуществляется путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2025 год в государственной программе соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (9,95 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (9,95 млн рублей).

Общественно значимым результатом реализации регионального проекта является создание системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности. В Республике Дагестан мероприятия регионального проекта проводятся в целях обеспечения кадрами необходимой квалификации предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы.

Реализация мероприятий осуществляется в отношении работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В 2025 г. предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций оборонно-промышленного комплекса в количестве 167 человек.

При этом, согласно паспорту регионального проекта «Образование для рынка труда» целевыми группами являются: студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования, участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ-профилю; ординаторы, студенты, безработные граждане.

Перечень организаций оборонно-промышленного комплекса Республики Дагестан утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.09.2022 г. № 4070. Возможные претенденты на участие в отборе на получение субсидии определены по итогам мониторинга организаций оборонно-промышленного комплекса (ОАО «Концерн КЭМЗ»).

В рамках мероприятий разработаны порядки предоставления в 2025 году субсидии по двум направлениям расходов (на финансовое обеспечение затрат работодателей и на возмещение затрат), (на рассмотрении в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан).

Достижение планового значения (75 %) по показателю «Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению» запланировано на конец 2025 г.



## 6. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



**Куратор национального проекта:**

**Алиев Р. А.**

Первый заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан



***Руководитель регионального проекта:***

**Исрапилов Х.А.**

Руководителя Агентства по предпринимательству и  
инвестициям Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» запланировано:

– обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;

– увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года;

– формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков;

В рамках национального проекта в Республике Дагестан реализуется **региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**, направленный на увеличение объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки группы Российский экспортный центр к концу 2030 года

Между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение «О реализации на территории Республики Дагестан регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан» от 19 декабря 2024 года №2024-М3005-1.

Срок реализации регионального проекта 2025-2030 гг.

В 2025 году запланированы мероприятия по внедрению в Республике Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0».

Финансирование регионального проекта в 2025 г. не предусмотрено. Достижение целевого показателя «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» запланировано на конец 2025 г.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. в целях внедрения «Регионального экспортного стандарта 2.0» в Республике Дагестан реализовано 2 инструмента из 15 (13 %), в том числе:

1. (1.) Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации;

2. (2.) Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг.

Планируются к внедрению до конца 2025 года следующие инструменты:

1. (3.) Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации;

2. (4.) Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации;

3. (5.) Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации;

4. (6.) Создание и развитие Центра поддержки экспорта;

5. (7.) Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках;

6. (8.) Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации;

7. (9.) Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита;

8. (10.) Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности;

9. (11.) Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами;

10. (12.) Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли;

11. (13.) Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта;

12. (14.) Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации;

13. (15.) Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».



## 7. Национальный проект «Туризм и гостеприимство»



*Куратор национального проекта:*

**Елякавов М. П.**

Заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Дагестан



*Руководитель региональных проектов:*

**Мерданов Э.М.**

Министр по туризму и народным  
художественным промыслам  
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» запланировано:

- увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов;

- увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Из пяти федеральных проектов национального проекта «Туризм и гостеприимство» («Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Туристическая привлекательность страны», «Кадры для туризма», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии») в Республике Дагестан запланировано реализовать мероприятия двух федеральных проектов:

- «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

- «Пять морей и озеро Байкал» (с 2026 г.).

В 2025 году в рамках соответствующего федерального проекта в Республике Дагестан реализуется **региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».**

В ходе регионального проекта запланировано увеличение числа новых поездок по России за счет продвижение событийных мероприятий, проводимых в Республике Дагестан.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. (АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан»).

Согласно соглашению от 13 декабря 2024 г. № 139-09-2025-078, заключенному между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя «количество туристических поездок по территории Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» было предусмотрено финансирование в размере по 174,083 млн рублей, ежегодно, в период с 2025 – 2027 гг.

В этой связи, согласно Закону о республиканском бюджете на 2025 год на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 175,84 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,08 млн

рублей, средства республиканского бюджета – 1,76 млн рублей).

В дальнейшем, при распределении единой субсидии в феврале 2025 г. Министерством экономического развития Российской Федерации размер единой субсидии для Республики Дагестан, предусмотренной на 2025 год был уменьшен до 89,6 млн рублей, в том числе за счет исключения финансирования мероприятий

по оказанию государственной поддержки общественных проектов на развитие туристской инфраструктуры (74,8 млн рублей). Дополнительное соглашение по уменьшению лимитов будет доведено до Республики Дагестан.

В связи с уменьшением предусмотренных лимитов финансирования, в 2025 году будет реализована только поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Республике Дагестан

В целях реализации регионального проекта Министерством заключено соглашение о предоставлении субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан» по поддержке и продвижению событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Республике Дагестан от 26 марта 2025 года № 40-2025-001888.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту отсутствуют.

В рамках регионального проекта Министерством заключено соглашение от 26 марта 2025 г. № 40-2025-001888 с АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан в целях продвижения событийных мероприятий» на сумму 90,5 млн рублей.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан». По состоянию на 1 апреля 2025 г. согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2025 год в государственной программе соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (175,8 млн рублей).

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 апреля 2025 г., фактическое значение целевого показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» составляет 0,06 млн штук, или 15 % от плана (0,4 млн штук).



## 8. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»



*Куратор национального проекта:*

**Газимагомедов Р.К.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан



*Руководитель региональных  
проектов:*

**Гамзатов Ю.В.**

Министр цифрового развития Республики  
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» в ходе реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» запланировано к 2030 году в том числе:

- достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления;
- формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита;
- увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет»;
- обеспечение темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта;
- переход не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения;
- увеличение доли использования российского программного обеспечения в государственных органах;
- увеличение до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов;

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 3 региональных проекта:

- 1) «Цифровое государственное управление»,
- 2) «Отечественные решения»,
- 3) «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

В 2025 году на реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусмотрено финансирование в сумме 1 462,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 447,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей). Профинансировано 438,6 млн рублей, или 30,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует.

Из 3 региональных проектов национального проекта финансирование предусмотрено по региональному проекту «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».

Заключен 1 контракт или 100 % от плана на сумму 1 462,0 млн рублей в рамках реализации регионального проекта.



### **8.1. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»**

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» в 2025 году запланировано формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерством цифрового развития Республики Дагестан проведена работа по актуализации перечня по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 2025 год.

В 2025 году на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 462,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 447,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

Профинансировано 438,6 млн рублей, или 30,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует

Заключен 1 государственный контракт с ПАО «МТС» на создание ИТ-инфраструктуры в 1834 зданиях образовательных учреждений в Республике Дагестан.

Утвержден План-график реализации проекта по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» на 2025 год (далее – Проект);

По состоянию на 1 апреля 2025 г. по данным Министерства цифрового развития Республики Дагестан по целевому показателю «Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами» фактическое значение составило 5,54 %, или 6,04 % от плана (91,7 %). По данным отчета о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 апреля 2025 г. исполнение по показателю отсутствует.



## 8.2. Региональный проект «Отечественные решения»

В ходе реализации регионального проекта «Отечественные решения» в 2025 году предусмотрена организация перехода органов государственной власти Республики Дагестан на использование российского программного обеспечения в рамках проведения следующих мероприятий:

- приобретение лицензий на российское программное обеспечение для общеобразовательных учреждений Республики Дагестан;
- координация работы по переходу органов государственной власти Республики Дагестан на импортозамещение программного обеспечения.

Финансирование, заключение контрактов по региональному проекту в 2025 году не предусмотрено. В то же время, по итогам проведенного Министерством цифрового развития Республики Дагестан анализа потребности органов исполнительной власти Республики Дагестан в лицензиях на российские операционные системы и офисное программное обеспечение, выявлена потребность в выделении финансовых средств из республиканского бюджета Республики Дагестан в размере 60,5 млн рублей на приобретение 3 000 лицензий на российскую операционную систему и 3 000 лицензий на офисное программное обеспечение.

В рамках Соглашения, заключенного в 2022 году между Министерством цифрового развития Республики Дагестан и российским разработчиком программного обеспечения ООО «РЕД СОФТ», в марте-апреле 2025 года запланировано обучение сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и их подведомственных организаций на курсах по программам «Основы администрирования операционной системы РЕД ОС» и «Расширенный курс администрирования операционной системы РЕД ОС».

Информация об имеющейся вычислительной технике в органах исполнительной власти Республики Дагестан направлена российским разработчикам операционных систем для выявления и оперативного устранения проблем, связанных с совместимостью их с российскими операционными системами на базе ядра Linux.

Осуществляется сбор информации для проведения совместной закупки российских средств антивирусной защиты информации. На сегодняшний день подтвердили участие в закупке 15 органов власти.

На 1 апреля 2025 г. по данным Министерства цифрового развития Республики Дагестан по целевому показателю «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации» фактическое значение составило 92,15 %, или 96 % от плана (95,95 %). В отчете о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 апреля 2025 г. исполнение по показателю составляет 50 %, или 50 %, или 52,1 % от плана.



### 8.3. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2025 году запланировано создание, развитие, внедрение и эксплуатация информационных систем и типовых сервисов, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

Финансирование и заключение контрактов по региональному проекту в 2025 году не предусмотрено.

В 2025 году планируется внедрение информационных систем на базе единой цифровой платформы «ГосТех», направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг.

В целях популяризации механизма получения государственных и муниципальных услуг в 2025 году Минцифры РД планирует проведение мероприятий, направленных на популяризацию получения государственных и муниципальных услуг в электронном формате, а также на освещение преимуществ получения электронных услуг в СМИ, социальных сетях и на телевидении.

Регулярно проводится работа по популяризации механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Ежемесячно Минцифры РД осуществляет координацию качества и своевременности предоставления МСЗУ.

По состоянию на 1 апреля 2025 года из 4 целевых показателей:

- по 1 целевому показателю «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме» обеспечено выполнение (перевыполнение) планового значения на 2025 год – 100 %, или 104,1 % от плана (96 %);

- по 2 целевым показателям, фактические значения составили от 81,4 % до 86 % от плана;

- по 1 целевому показателю «Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме» фактическое значение рассчитывается по итогам года.



## 9. Национальный проект «Экологическое благополучие»



**Куратор национального проекта  
Абдулмуталибов Н.М.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководители региональных проектов:*



**Расулов Р.Н.**  
Министр природных ресурсов и экологии  
Республики Дагестан



**Абдулхамидов В. М**  
Председатель Комитета по лесному хозяйству  
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Экологическое благополучие» в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие» запланировано:

– формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;

– поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

– ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности;

– снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал;

– сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» реализуются 4 региональных проекта:

1) «Сохранение лесов» – ответственный исполнитель Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

2) «Чистый воздух» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

3) «Экономика замкнутого цикла» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД;

4) «Вода России» – ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии РД (реализация проекта с 2027 года).

В 2025 г. на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 22,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 18,7 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн рублей). Профинансированы расходы в размере 9,2 млн рублей, или 41,4 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 9,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 41,4 % от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта заключение контрактов не предусмотрено.

Из 3 региональных проектов в 2025 г. в рамках национального проекта запланировано финансирование 1 регионального проекта «Сохранение лесов».



### 9.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

В ходе регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» к 2030 году запланировано снижение объема твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не более 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров. В этой связи, региональный проект является преемником регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» (2019-2024).

В 2025 г. в Республике Дагестан запланировано завершение мероприятий по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет создания 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- Махачкалинская зона: мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном в Кумторкалинском районе мощностью 300 тыс. тонн/год;
- Хасавюртовская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;
- Дербентская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год.

Строительство 3 комплексов по обработке твердых коммунальных отходов реализуется при участии ООО «Республиканский экологический оператор» согласно трех концессионных соглашений, заключенных с Правительством Республики Дагестан» от 13 сентября 2022 г.

Дополнительным соглашением от 3 декабря 2024 года № 051-2019-G20026-1/14 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан сроки завершения строительства объектов 3 мусоросортировочных комплексов по обработке твердых коммунальных отходов были перенесены с декабря 2024 года до конца 2025 года. В дальнейшем, 16 декабря 2024 г. № 051-2024-Ч20037-1 подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Экологическое благополучие».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Согласно данным «Электронный бюджет» общий объем средств, профинансированных на строительство объектов составил 10 624,0 млн рублей. Средства доведены до ООО «Республиканский экологический оператор». Кассовое исполнение составило 7 921,6 млн рублей, или 74,5 % от объема доведенных назначений.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. техническая готовность объектов капитального строительства представлена следующим образом:

1) Мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе (500 тонн) – строительная готовность – 52 %.

По полигону захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов, производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь) получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

2) Мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе (250 тонн) – строительная готовность – 38 %, полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год – 33 %.

3) Мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе (200 тонн) – строительная готовность – 62 %. Полигон захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» – 46 %.

Из 2 целевых показателей регионального проекта в 2025 г. плановые значения предусмотрены только по показателю: «Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» – 100 % при плане (92,9 %). Достижение планового значения запланировано на конец года.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. в ЕИИС «Электронный бюджет» по показателю «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» составляет – 100 %. Существует риск достижения планового значения (92,9 %). На территории Республики Дагестан объекты по обработке твердых коммунальных отходов отсутствуют, в связи с чем 100 % образуемых ТКО направляется на захоронение. При этом, ввод мощностей по обработке (сортировке) запланирован только на 31 декабря 2025 г.



## 9.2. Региональный проект «Чистый воздух»

В ходе регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» к 2036 году запланировано снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 2 раза, в том числе на конец 2025 года со 100 % до 99,5 %.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2022 г. № 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ», г. Махачкала включена в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ рамках Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Эксперимент в городах проводится с 1 сентября 2023 г. и продлится до 31 декабря 2030 г.

Показатели федерального проекта для г. Махачкалы были установлены на основании проведенных ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» сводных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Махачкала, утвержденных приказом Минприроды РФ № 370 от 06 июня 2024 г.

Проведенные в 2023 году ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха по г. Махачкала позволили оценить состояние и уровень загрязнения атмосферного воздуха, определить степень влияния выбросов отдельных предприятий, транспорта, объектов городской инфраструктуры на загрязнение воздуха, а также выявить источники, вносящие наибольший вклад в загрязнение приземного слоя.

Предварительный проект Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Махачкала был согласован с заинтересованными ведомствами и с администрацией ГО «город Махачкала», и направлен в Минприроды России для согласования. Согласно плану предусмотрены мероприятия по приобретению 40 троллейбусов, 60 автобусов на газомоторном топливе, а также строительству и реконструкции участков автомобильных дорог.

Возможность и размер финансирования по федеральному проекту будут определены после утверждения комплексного плана.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по целевому показателю «Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, убывающий» фактическое значение составляет 99,5 %, или 99,5 % от плана на 2025 г. (100 %).



### 9.3. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2025 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках в ходе проведения следующих мероприятий:

- увеличение площади лесовосстановления – 18,4 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 3,8 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству по Республике Дагестан.

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 22,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 18,7 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн рублей).

Профинансировано 5,3 млн рублей, или 24 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 5,3 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 24 % от годовых назначений.

Заключение контрактов в 2025 г. не предусмотрено.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. проведены работы по лесовосстановлению на сумму 5,0 млн рублей.

Заготовлено 165 кг семян сосны, акации, гледичии на сумму 0,26 млн рублей, или 3,0 % от плана (5 515 кг.).

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования (без учета внебюджетных источников), регионального проекта на 2025 год в проекте государственной программы «Развитие лесного хозяйства» (18,4 млн рублей), паспорте регионального проекта (18,4 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования согласно и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (18,7 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года из 3 целевых показателей фактические значения составляют:

- по целевому показателю «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», возрастающий, – 20 %, или 20 % от плана на 2025 г. (100 %);
- по целевому показателю «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий, тыс. га» – 20 %, что значительно превышает плановое значение на 2025 г. (0,26 %);
- по целевому показателю «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, возрастающий» – 2 %, или 8 % от плана на 2025 г. (25 %).



## 10. «Эффективная и конкурентная экономика»



*Куратор национального проекта:*  
**Алиев Р. А.**  
Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Дагестан

### *Руководитель региональных проектов*



**Исрапилов Х.А.**  
Руководитель Агентства по  
предпринимательству и инвестициям  
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» запланировано:

– обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта;

– вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда.

В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в Республике Дагестан реализуются два региональных проекта:

1) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (исполнитель – Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан);

2) «Производительность труда» (исполнители – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Министерство здравоохранения Республики Дагестан).

В 2025 году на реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предусмотрено финансирование в сумме 48,97 млн рублей (средства федерального бюджета – 48,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей). Профинансированы расходы в сумме 48,97 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 48,97 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и годовых назначений.

В 2025 году финансирование предусмотрено по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

По состоянию на 1 апреля 2025 г. заключение контрактов не запланировано.

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» сформированы паспорта и планы мероприятий.

Заключено 3 соглашения (в том числе 2 индикативных и 1 финансовое) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национального проекта.



## 10.1. Региональный проект

### «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В ходе реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в 2025 году предусмотрено:

- обеспечение расширенного доступа к финансовым ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях;
- увеличение охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки.

Реализацию регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 48,97 млн рублей (средства федерального бюджета – 48,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансированы расходы в сумме 48,97 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 48,97 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Согласно заключенному соглашению от 18 февраля 2025 г. № 20-2025-009006 и дополнительному соглашению от 17 марта 2025 г. № 20-2025-009006/1, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства в сумме 48,97 млн рублей перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятий регионального проекта. Средства предназначены для финансирования Центра «Мой бизнес», которым оказываются услуги и меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и гражданам, желающим вести бизнес (консультации и обучающие мероприятия, содействие в размещении на электронных площадках, организация участия в выставках и ярмарках и т.д.).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. смета расходования средств федерального бюджета ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» не согласована с Министерством экономического развития Российской Федерации.

По результатам мероприятий регионального проекта в 2025 году запланировано достижение следующих общественно значимых результатов:

- 1) Увеличение охвата субъектов МСП и граждан, планирующих предпринимательскую деятельность, услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах путем:

– обеспечения льготного доступа к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (финансирование запланировано с 2027 года).

Для участия в конкурсном отборе по созданию (развитию) агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков документы направлены для рассмотрения в Минэкономразвития России;

– предоставления услуг центрами «Мой бизнес» – не менее 6 124 субъектам МСП. По состоянию на 1 апреля 2025 г достижение результата отсутствует.

2) Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП путем:

– обеспечения привлечение субъектами МСП финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию. По состоянию на 1 апреля 2025 г. Гарантийным фондом Республики Дагестан (ответственный за достижение результата) выдано 3 поручительства на сумму 12,0 млн рублей. Объем привлеченных кредитов при гарантийной поддержке составил 2 087,0 млн рублей, или 197 % от плана (1 060,0 млн рублей). Результат достигнут;

– обеспечения льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан (МФК «Даглизингфонд», ответственный за достижение результата) выдано микрозаймов на сумму 36,5 млн рублей, или 17,6 % от плана (206,9 млн рублей). Кредитный портфель составил 457,88 млн рублей.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2025 год в государственной программе (48,97 млн рублей) соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (48,97 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (48,97 млн рублей).

Достижение фактических значений по целевому показателю «Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), возрастающий» запланировано с июля 2025 г. Следует отметить, что согласно паспорту регионального проекта, в ГИИС «Электронный бюджет» плановое значение по показателю на 2025 г. составляет 0,55 процентов.



### 10.2. Региональный проект «Производительность труда»

Региональный проект «Производительность труда» направлен на вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда.

В рамках регионального проекта в 2025 г. в Республике Дагестан запланировано предоставление квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

Ответственным за реализацию регионального проекта является Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (далее – Минэкономразвития РД).

Финансирование регионального проекта и заключение контрактов в 2025 году не предусмотрено. В то же время в целях достижения целевых показателей регионального проекта «Производительность труда» в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 г. (вне регионального проекта) запланированы средства в сумме 0,6 млн рублей на обучение сотрудников предприятий и представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда на базе производственной площадки «Фабрика процессов», созданной в 2022 году.

В рамках обеспечения достижения общественно значимых результатов в 2025 году в ходе регионального проекта запланировано:

– привлечение предприятий республики к участию в национальном проекте (план – 12 предприятий). По состоянию на 1 апреля 2025 г. участниками регионального проекта являются 12 предприятий республики (ООО «Дагестан Стекло Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Концерн КЭМЗ», АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Завод «Дагдизель», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон», ООО «Батыр Бройлер», ООО «Строймет», ООО «Строймаркет-05»), или 100 % от плана на 2025 г. При этом, достижение результата обеспечено по итогам реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (2019-2024 гг) ;

– участие 7 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.

По итогам совещания (видеоконференции) от 3 февраля 2025 г., проведенного под председательством Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова с участием руководителей субъектов Российской Федерации, на федеральном уровне запланирована разработка программного обеспечения для внедрения инструментов бережливого производства в социальных учреждениях регионов. До 2030 года планируется охват более 123 тыс. учреждений социальной сферы.

В целях внедрения инструментов бережливого производства запланировано создание отраслевых центров компетенций в социальной сфере (далее – ОЦК) на базе отобранных подведомственных учреждений, которые будут определять основные подходы и методологию повышения производительности труда.

Координирующая функция по мониторингу проектов, направленных на повышение производительности труда, анализу достижения показателей, декомпозированных на Республику Дагестан, выработке единых подходов региона к работе с ОЦК, согласованию программ реализации проектов и перечня организаций, а также по формированию запроса на разработку дополнительных решений будет возложена на Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. из двух целевых показателей регионального проекта:

– по целевому показателю «Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-го прироста производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением, поддерживающий» фактическое значение показателя запланировано с апреля 2025 года (план 50 %);

– по целевому показателю «Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях» – фактическое значение составило 101,7 %, или 100 % от плана на 2025 г. (ответственный за достижение – Министерство здравоохранения по Республике Дагестан»).



## 11. Национальный проект «Молодежь и дети»



**Куратор национального проекта:**  
**Телякавов М. П.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

### *Руководители региональных проектов:*



**Бучаев Я. Г.**  
Министр  
образования и  
науки Республики  
Дагестан



**Уллаев Б.М.**  
Министр строительства,  
архитектуры и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Республики Дагестан



**Султанов Г.Р.**  
Министр экономики и  
территориального развития  
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», реализация национального проекта «Молодежь и дети» направлена на обеспечение достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Основными задачами национального проекта до 2030 года являются:

- обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;
- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание;
- формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Молодежь и дети» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «Все лучшее детям»;
- 2) «Педагоги и наставники»;
- 3) «Профессионалитет»;
- 4) «Россия – страна возможностей»;
- 5) «Мы вместе».

В реализации мероприятий региональных проектов в 2025 году задействованы: Министерство образования и науки Республики Дагестан (4 578,9 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (223,4 млн рублей) и Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (531,5 млн рублей), Министерство финансов Республики Дагестан (133,6 млн рублей), а также в рамках выплат вознаграждений педагогическим работникам прочие министерства – 58,4 млн рублей.

В 2025 году на мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 5 526,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 484,2 млн рублей, республиканского бюджета – 41,5 млн рублей, средства внебюджетных фондов – 1,0 млн рублей).

Профинансировано 1 020,1 млн рублей, или 18,5 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 000,0 млн рублей, или 98,0 % от объема финансирования и 18,1 % от годовых назначений.

Заключены 34 контракта или 70,8 % от плана (48 контрактов) на сумму 551,5 млн рублей.

В 2025 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» запланировано финансирование 3 региональных проектов. Финансирование 2 региональных проектов не предусмотрено («Россия – страна возможностей», «Мы вместе»).



## 11.1. Региональный проект «Все лучшее детям»

В ходе реализации регионального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году запланировано формирование современной образовательной среды для реализации потенциала детей и молодёжи, выявления и развития их талантов в ходе проведения следующих мероприятий:

– строительство 2 школ: на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента и на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района – 754,9 млн рублей;

– капитальный ремонт зданий и оборудование 9 школ в 2 городских округах и 7 муниципальных образованиях – 592,1 млн рублей;

– оснащение кабинетов 1 134 школ для обучения по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» – 162,9 млн рублей.

В реализации регионального проекта принимают участие Министерство образования и науки Республики Дагестан (755,1 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (223,4 млн рублей) и Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (531,5 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 509,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 471,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 38,8 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 года средства не профинансированы.

В рамках регионального проекта заключены 32 контракта, или 70 % от плана (46 контрактов) на сумму 424,3 млн рублей, в том числе:

– 7 контрактов на сумму 338,8 млн рублей в целях капитального ремонта зданий и оборудование 7 общеобразовательных организаций (МО «Ногайский район», МО «Кайтагский район», МО «Буйнакский район», МО «Кизлярский район», МО «Ботлихский район», ГО «город Каспийск», ГО «город Избербаш»);

– 19 контрактов и 6 прямых договоров на сумму 85,5 млн рублей в целях оснащения школ и предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в 1134 общеобразовательных организациях.

В период подготовки материала были заключены следующие контракты на строительство 2 объектов общего образования:

– государственный контракт от 08 апреля 2025 г. № 0103200008425000703 на сумму 1 332,7 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 800 мест в пос. Шамилькала Унцукульского района между ГКУ РД «Дирекция единого государственного

застройщика заказчика» (Заказчик) и ООО «БИГ-СЕРВИС» (Подрядчик). В подрядные работы включены: строительство, реконструкция, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2027 г. Лимит на 2025 г. предусмотрен в сумме 223,3 млн рублей, в том числе выплата аванса – 33,5 млн рублей.

Согласно информации, приведенной на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru>, ООО «БИГ-СЕРВИС» ранее осуществляло строительство школы на 392 уч. мест в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района. Объект введен в эксплуатацию. Случаев начисления неустоек, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств подрядчиком – ООО «БИГ-СЕРВИС», не установлено;

– государственный контракт от 18 апреля 2025 г. № К-25/003 на сумму 2 401,8 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 1200 мест в мкр. Южный г. Дербент между МКУ «УКС» ГО «город Дербент» (Заказчик) и ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» (Подрядчик). В подрядные работы включены: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2027 г. Лимит на 2025 г. предусмотрен в сумме 523,5 млн рублей, в том числе аванс – 522,9 млн рублей.

ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» ранее осуществляло строительство школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района. Согласно информации, приведенной на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru>, контракт на строительство школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района был прекращен, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством от 21 августа 2023 г.

Не заключены 12 контрактов, которые находятся на подписании у поставщиков, либо идет процесс повторной подачи заявок.

На 1 апреля 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения представлены следующим образом:

– «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» – 0,2 %, или 142,8 % от плана на 2025 г. (0,14 %);

– «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, возрастающий» – 59,1 %, или 94,6 % от плана (62,46 %).



## 11.2. Региональный проект «Педагоги и наставники»

В ходе реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году запланировано снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях за счет проведения следующих мероприятий:

- ежемесячная выплата педагогам за классное руководство – 3 608,7 млн рублей;
- ежемесячная выплата педагогическим работникам за классное руководство (кураторство) – 135,1 млн рублей;
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 школах на 239 ставок – 94,9 млн рублей;
- ежемесячная выплата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 40,9 млн рублей;
- единовременная компенсационная выплата 10 учителям в рамках программы «Земский учитель» – 10,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» предусмотрено финансирование в размере 3 889,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 3 888,1 млн рублей, республиканского бюджета – 1,5 млн рублей).

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан». Однако, согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования в государственной программе (0 млн рублей), в Законе «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (4 024,7 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в паспорте регионального проекта на 2025 год (3 888,6 млн рублей)

На 1 апреля 2025 г. профинансированы средства в сумме 957,5 млн рублей, или 24,6 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 937,4 млн рублей, или 97,9 % от объема финансирования и 24,1 % от годовых назначений.

Финансирование осуществляется путем перечисления средств федеральной субсидии на счета муниципальных образований. В этой связи заключение контрактов в рамках регионального проекта не предусмотрено.

В 2025 году единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель»), запланировано предоставить 10 учителям на сумму 10,0 млн рублей. Заключение трудовых договоров планируется к началу учебного года.

На 1 апреля 2025 г. по целевому показателю регионального проекта «Осуществлено выполнение мероприятий (результатов) соглашения с ФОИВ,» фактическое значение составляет 80 %, или 80 % от плана на 2025 год (100 %).



### 11.3. Региональный проект «Профессионалитет»

В 2025 году ходе реализации регионального проекта «Профессионалитет» запланирована работа, направленная на комплексную реструктуризацию системы среднего профессионального образования за счет проведения следующих мероприятий:

- реализация комплекса профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации (мероприятия по реализации механизмов профессиональных проб для обучающихся 6-11 классов, на основании данных единой цифровой платформы профориентации «Билет в будущее»);
- проведение государственной итоговой аттестации выпускников колледжей в виде демонстрационного экзамена;
- капитальный ремонт 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 126,21 млн рублей.


На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 127,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 125,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,2 млн рублей, средства ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 1,0 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансированы средства в сумме 62,6 млн рублей, или 49,2 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 62,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 49,2 % от годовых назначений (средства перечислены в качестве авансовых платежей по заключенным договорам) 2 контракта

В рамках регионального проекта ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (Заказчик) заключены 2 договора № 32514425631, № 32514425623 от 17 февраля 2025 г. на общую сумму 127,2 млн рублей с ООО «ХАЙТЕК ТЕХНОЛОДЖИ» (Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту учебного корпуса и общежития ГАОУ ВО «ДГУНХ». Срок исполнения – до 15 августа 2025 г.

На 1 апреля 2025 г. из 3 целевых показателей:

- «Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета» обеспечено выполнение (перевыполнение) планового значения на 2025 год – 90,49 %, или 106,5 % от плана (85 %);
- «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» обеспечено выполнение (перевыполнение) планового значения на 2025 год – 80,39 %, или 267 % от плана (30 %);
- «Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» фактическое значение составляет 17,18 %, или 40 % от плана (43 %).



#### 11.4. Региональный проект «Россия – страна возможностей»

Реализация регионального проекта «Россия – страна возможностей» направлена на создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи во всех субъектах России.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

В рамках охвата молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на площадке молодежных центров Республики Дагестан, проводятся мероприятия с целью стимулирования участия муниципальных образований в решении задач социально-экономического развития Республики Дагестан. За период с 1 января по 30 марта 2025 г. на базе молодежных центров проведено более 88 мероприятий, с охватом молодежи более 40 тыс. человек.

Во исполнении контрольной точки ГБУ РД «Республиканский молодежный центр» 26 марта 2025 г. принят приказ о назначении ответственных за достижение результата по проекту «Об ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» от Республики Дагестан.

С июня по октябрь 2025 года запланировано участие представителей молодежи Республики Дагестан на мероприятиях в рамках всероссийского форума для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

В текущем году с учетом методических рекомендаций, данных ведомством, отдельные муниципальные образования Республики Дагестан внедряют в свою деятельность проведение муниципальных грантовых конкурсов, направленных на поддержку молодежных инициатив на местах.

Согласно отчету о реализации регионального проекта «Россия – страна возможностей» в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 апреля 2025 года, фактические значения целевых показателей представлены следующим образом:

– «Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики» – 5,1 %, или 27,7 % от плана на 2025 г. (18,42 %);

– «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие» – 5,2 %, или 28 % от плана на 2025 г. (18,65 %).



### 11.5. Региональный проект «Мы вместе»

В ходе регионального проекта «Мы вместе» запланировано создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

В рамках регионального проекта в 2025 г. в Республике Дагестан запланированы информационные и рекламные кампании в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных патриотические проекты, а также популяризации добровольчества (волонтерства).

Проект реализуется Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.

Финансирование мероприятий регионального проекта не предусмотрено.

В I квартале 2025 г. в рамках регионального проекта в муниципалитетах Дагестана проведена всероссийская акция «Блокадный хлеб» (контрольная точка). Волонтеры знакомили дагестанцев с историческими фактами о блокаде Ленинграда, раздали листовки, продемонстрировали блокадный паек для жителей Ленинграда 1941 года (<https://minmol.ru/press/89481>).

В Единой информационной системе «Добро.ру» на 30 марта 2025 года зарегистрировано 68 158 добровольцев, 1520 организаторов и общественных объединений, 17 098 волонтера проведено 3 555 мероприятий.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проводится информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы на 30 марта 2025 г. составил более 30 850 человек, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещено 26 информационных материалов.

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 апреля 2025 года, фактические значения показателей представлены следующим образом:

– по показателю «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» фактическое значение, составило 10 %, или 27,5 % от плана на 2025 г. (36,3 %);

– по показателю «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность» фактическое значение составило 3,6 %, или 27,4 % от плана на 2025 г. (13,16 %).



## 12. Национальный проект «Семья»



*Куратор национального проекта:*

**Махмудов А.М.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководители региональных проектов:*



**Кихасуров М.М.**

Министр труда и  
социального развития  
Республики Дагестан



**Глазов Я.Н.**

Министр здравоохранения  
Республики Дагестан



**Бутаева З. А.**

Министр культуры  
Республики Дагестан



**Бучаев Яхья  
Гамидович**

Министр образования и  
науки Республики  
Дагестан



**Уллаев Б.М.**

Министр строительства,  
архитектуры и жилищно-  
коммунального  
хозяйства  
Республики Дагестан



**Султанов Г.Р.**

Министр экономики и  
территориального  
развития Республики  
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», реализация национального проекта «Семья» направлена на обеспечение достижения национальных целей «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Основными задачами национального проекта «Семья» являются:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году;
- обеспечение не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в субъектах Российской Федерации;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;
- увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода;
- снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году;
- повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой организаций культуры, искусства и народного творчества.

В рамках национального проекта «Семья» в Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «Поддержка семьи»;
- 2) «Многодетная семья»;
- 3) «Охрана материнства и детства»;
- 4) «Старшее поколение»;
- 5) «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В реализации региональных проектов задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (1 206,7 млн рублей); Министерство здравоохранения Республики Дагестан (635,7 млн рублей); Министерство культуры Республики Дагестан (206,6 млн рублей); Министерство образования и науки Республики Дагестан (128,1 млн рублей); Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (71,8 млн рублей), Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (477,7 млн рублей).

В 2025 году на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 2 726,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 636,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 89,6 млн рублей, средства муниципальных образований – 0,7 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансированы расходы в сумме 353,5 млн рублей, или 13,0 % от объема годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 145,8 млн рублей, или 41,3 % от объема финансирования и 5,3 % от годовых назначений.

Заключен 31 контракт, или 39,2 % от плана, на сумму 162,7 млн рублей.

В 2025 году запланировано финансирование всех региональных проектов.



### **12.1. Региональный проект «Поддержка семьи»**

В ходе реализации регионального проекта «Поддержка семьи» в 2025 году запланировано обеспечение всех семей к 2030 году адресной поддержкой при рождении ребенка за счет следующих мероприятий:

- строительство 6 детсадов (в том числе 5 объектов на 830 мест в г. Дербенте и 1 объект на 240 мест в г. Каспийске) – 549,48 млн рублей;
- капитальный ремонт и оснащение 2 детсадов (в г. Дагестанские Огни и г. Избербаше) – 128,1 млн рублей.

В реализации регионального проекта задействованы Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерство экономики и социального развития Республики Дагестан.

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 677,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 670,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 6,8 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. средства не профинансированы.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан». Однако, согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования в государственной программе (0 млн рублей), в Законе «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (683,0 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в паспорте регионального проекта на 2025 год (677,6 млн рублей)

По состоянию на 1 апреля 2025 г. заключены 10 контрактов, или 58,8 % от плана (17 контрактов) на сумму 125,3 млн рублей, в целях проведения капитального ремонта и оснащения двух детских садов (в г. Дагестанские Огни и г. Избербаше).

Контракты на строительство 6 дошкольных образовательных учреждений не заключены (на стадии подачи заявок на ЕИС «Закупки»).

По состоянию на 1 апреля 2025 года обеспечено достижение планового значения на 2025 год по целевому показателю регионального проекта «Суммарный коэффициент рождаемости, возрастающий» – 1,82 ед., или 103,7 от плана на 2025 г. (1,75 ед.). В целях достижения указанного показателя между Правительством Республики Дагестан и Социальным фондом России заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Республики Дагестан бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка от 25.12.2024 г. № 797-16-2025-034.



## 12.2. Региональный проект «Многодетная семья»

В ходе регионального проекта «Многодетная семья» запланировано оказание государственной социальной помощи многодетным семьям и семьям с детьми путем заключения социального контракта.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

В 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 1 102,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 043,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 59,5 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансированы средства в сумме 121,2 млн рублей, или 11,0 % от годовых назначений (1 102,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 70,6 млн рублей, или 58,2 % от объема финансирования и 6,4 % от годовых назначений.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» в I квартале 2025 года количество граждан, получивших государственную помощь на основании социального контракта, составило 1 397 человек, или 26,8 % от плана (5 215 человек).

Социальные контракты заключены с многодетными семьями и семьями с детьми в целях осуществления:

- индивидуальной предпринимательской деятельности – 533 единиц;
- на ведение личного подсобного хозяйства – 364 единиц;
- по поиску работы – 191 единиц;
- на преодоление трудной жизненной ситуации – 309 единиц.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. фактические значения целевых показателей представлены следующим образом:

- «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» – 738 единиц, или 97 % от плана (762 единиц);
- «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» – 1,5 %, или 28,3 % от плана (5,3 %);
- «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» – 14,5 %, или 54,7 % от плана (26,5 %).

Следует отметить, что по указанным 3 показателям обеспечены достижение промежуточных плановых значений по итогам 1 квартала 2025 г.



### 12.3. Региональный проект «Охрана материнства и детства»

В ходе регионального проекта «Охрана материнства и детства» в целях сохранения репродуктивного здоровья запланировано обеспечение доступности и квалифицированной помощи женщинам и детям, за счет проведения следующих мероприятий:

- оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) в г. Махачкале и г. Дербент – 293,0 млн рублей;

- создание женских консультаций (в ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Мирзоева», ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» и ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ») – 342,8 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта в 2025 г. предусмотрено финансирование в сумме 635,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 629,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 6,3 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. средства не профинансированы.

В рамках регионального проекта в 2025 г. запланировано заключение 29 контрактов.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. подготовлена заявка на приобретение 323 ед. медицинского оборудования для обеспечения медицинскими изделиями перинатальных центров и роддомов.

Подготовительные работы в целях создания женских консультаций не завершены (определены земельные участки на территории медицинских учреждений, проводится разработка медико-технического задания).

По состоянию на 1 апреля 2025 года, согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», из 5 целевых показателей по 2 показателям обеспечено перевыполнение плановых значений на 2025 г. в размерах от 135 % до 190 % от плана.

По 3 показателям фактические значения представлены следующим образом:

- «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах» – 4,9 %, или 24,5 % от плана (20 %);

- «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров» – 30,3 %, или 38 % от плана (32 %);

- «Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья» – 6,9 %, или 21,6 % от плана (32 %).



## 12.4. Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе регионального проекта «Старшее поколение» в 2025 году запланировано увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, а также реализация региональной программы «Активное долголетие в Республике Дагестан<sup>1</sup>».

Исполнение регионального проекта возложено на Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 104,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 103,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,0 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансированы средства в сумме 25,6 млн рублей, или 24,5 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 14,6 млн рублей, или 57,1 % от объема финансирования и 14,0 % от годовых назначений.

Заключение договоров (контрактов) в рамках регионального проекта не предусмотрено. Средства направляются на выплату заработной платы сотрудникам учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги в рамках системы долговременного ухода.

Мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (241 человек), проводятся 132 помощниками по уходу в ГО «город Махачкала», ГО «город Каспийск» и ГО «город Кизляр».

Численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», составляет 148 732 человек.

Кроме того, граждане старшего возраста получают медицинскую помощь в 23 гериатрических кабинетах на 104 геронтологических койках. Обеспеченность геронтологическими койками составляет 11,6 усл. ед. на 10 тыс. населения в возрасте 60 лет и старше.

За январь-февраль 2025 г. на 104 гериатрических койках лечение получили 521 человек.

По состоянию на 1 апреля 2025 года по 2 целевым показателям регионального проекта исполнение характеризуется следующими данными:

– по показателю «Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан» обеспечено достижение планового значения на 2025 г. – 0,9 %, или 100 % от плана на 2025 г.;

– по показателю «Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» фактическое значение составляет 33,9 %, или 92 % от плана на 2025 г. (36,9 %).

<sup>1</sup> Утверждено Постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 декабря 2024 года № 435.



## 12.5. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В ходе регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году предусмотрено обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- капитальный ремонт библиотек – 24,98 млн рублей;
- капитальный ремонт здания Дома культуры – 28,5 млн рублей;
- капитальный ремонт детской школы искусств – 19,436 млн рублей;
- капитальный ремонт театра – 50,5 млн рублей;
- капитальный ремонт музея – 26,8 млн рублей;
- оснащение регионального театра – 9,9 млн рублей;
- техническое оснащение музея – 15,2 млн рублей;
- создание трех модельных библиотек – 31,3 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями (ГО «город Махачкала»; ГО «город Каспийск»; МО «Дахадаевский район»; МО «Казбековский район»).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 206,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 190,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 16,0 млн рублей, средства муниципалитетов – 0,7 млн рублей).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. профинансированы средства в сумме 135,2 млн рублей, или 65,5 % от годовых назначений.

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта за I квартал 2025 г. (ГИИС «Электронный бюджет») и данным Министерства финансов Республики Дагестан, кассовое исполнение составило 153,2 млн рублей, или 74,1% от годовых назначений. По данным ответственного исполнителя (Министерство культуры Республики Дагестан) средства перечислены подведомственным организациям, фактическое кассовое исполнение отсутствует.

Заключены 25 контрактов (договоров) на общую сумму 101,05 млн. рублей, или 80,6 % от плана (31 контракт).

На 1 апреля 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения представлены следующим образом:

- «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» – 94,2 %, или 171,3 % от плана (55 %), что свидетельствует о возможном занижении планового значения на 2025 год;
- «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» – 100 %, или 91,0 % от плана (110 %).

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

### Перечень объектов, запланированных к капитальному ремонту, техническому оснащению и созданию в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

№	Объект	Номер контракта	Цена контракта, млн рублей	Подрядчик	Срок исполнения	Готовность
1	Капремонт ГБУ РД «НБ РД им. Р. Гамзатова»	№ 919 от 02.04.2025	15,15	ООО «СПЕЦПРОМ СТРОЙ»	31.12.2025	0
2	Капремонт здания Дома культуры г. Каспийск	№ 2803 от 06.04.2025	29,65	ООО «ЮСК»	31.12.2025	0
3	Капремонт ГБУ ДО РД «Республиканская детская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей»	№ КР-01-25	18,82	ООО «Лидер-Строй»	31.12.2025	0
4	Капремонт Ногайского историко-краеведческий музея - филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	№ 2-25РЕМ	26,22	ООО «СФЕРА»	31.12.2025	0
5	Техоснащение филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» Музей боевой славы им. В.В. Макаровой	9 контрактов	5,53	ООО «СЦЕНАЛОГИЯ»	31.12.2025	0
6	Создание модельных библиотек: – МКУК «Центральная районная библиотека» МР «Казбековский район»; – ГО «город Махачкала»	6 контрактов	1,76	ИП Курбанова П.М. ИП Османова Ш.Ш. ООО «Сокол»	31.12.2025	0
7	Библиотека – филиал № 23 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО «город Махачкала»	10 контрактов	6,19	ООО «Эксмо» ООО «Лига» ООО «Левенгук» ИП Алиметова Г.А.	31.12.2025	0
8	Детская библиотека – филиал № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система»	Поставщик определен, контракт на стадии подписания				
9	Капремонт ГБУ Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького»	Поставщик определен, контракт на стадии подписания				
10	Капремонт МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Дахадаевский р-н», с. Уркарах	Поставщик определен, контракт на стадии подписания				
11	Оснащение театра ГБУ РД «Театр поэзии»	Поставщик определен, контракт на стадии подписания				



## 13. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»



**Куратор национального проекта  
Абдулмуталибов Н.М**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель регионального проекта:*



**Абдулхамидов В. М.**  
Председатель Комитета по лесному хозяйству  
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Технологическое лидерство», необходимо решение задачи по обеспечению технологической независимости и формированию новых рынков в том числе по такому направлению как развитие беспилотных авиационных системы. Решение данной задачи обеспечивается в рамках «Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.» (далее Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2023 № 1630-р.

Целевые индикаторы Стратегии достигаются в результате реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и мероприятий входящих в него 5 федеральных проектов («Стимулирование спроса на отечественные БАС»; «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»; «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС»; «Кадры для беспилотных авиационных систем»; «Фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС»).

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы») реализуется **региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».**

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан. Беспилотные летательные аппараты планируется использовать в рамках мероприятий по лесоразведению и защите лесов от пожаров.

Период реализации регионального проекта в Республике Дагестан 2024-2025 гг, с объемом предусмотренного финансирования 18,0 млн рублей (средства федерального бюджета).

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансированы бюджетные средства в сумме 16,5 млн рублей на приобретение 11 единиц беспилотных летательных аппаратов. Не профинансированы 8,25 млн рублей, или 50 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 8,25 млн рублей, или 50 % от объема финансирования (средства перечислены в виде аванса в рамках заключенного контракта).

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 933-р единственным поставщиком закупок беспилотных

авиационных аппаратов в целях осуществления мероприятий по обеспечению государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», определено АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

В этой связи, Комитетом по лесному хозяйству Республики Дагестан в ходе реализации регионального проекта от 2 сентября 2024 г. был заключен 1 прямой договор с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на приобретение 11 беспилотных летательных аппаратов. Срок поставки аппаратов был дважды продлен и перенесен на I квартал 2025 г.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. беспилотные летательные аппараты поставлены. Оплата будет произведена после проверки поставленных беспилотных летательных аппаратов.

В 2025 г. на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1,5 млн рублей на поставку 1 беспилотного летательного аппарата. По состоянию на 1 апреля 2025 г. средства не профинансированы.

Заключение контракта на закупку 1 беспилотного летательного аппарата запланировано на апрель 2025 г.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан», утвержденной распоряжением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 669 (с изменениями от 27 декабря 2023 г. № 534).

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» в проекте государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан» и в паспорте регионального проекта финансирование на 2025 г. не предусмотрено, что не соответствует объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год» (1,5 млн рублей).

## 14. Выводы

**14.1.** На финансовое обеспечение 11 национальных проектов в 2025 г. запланированы средства в сумме 22 435,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 19 909,0 млн рублей; республиканского бюджета – 2 403,2 млн рублей; иных источников – 123,5 млн рублей).

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

**14.2.** По состоянию на 1 апреля 2025 г. на реализацию мероприятий семи национальных проектов профинансированы средства в сумме 3 121,8 млн рублей, или 14 % от объема годовых назначений (22 435,8 млн рублей).

По четырем национальным проектам («Туризм и гостеприимство», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры») финансирование отсутствует.

**14.3.** Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию семи национальных проектов, кассовое исполнение составило 2 416,4 млн рублей, или 77,4 % от объема финансирования, и 10,8 % от объема годовых назначений (22 435,8 млн рублей).

Проведенный анализ показал, что из 11 финансируемых национальных проектов, уровень кассового исполнения составил:

– по 1 нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» – 100 % от годовых назначений. Средства перечислены на счета подведомственной организации в рамках заключенного соглашения;

– по 5 нацпроектам – от 5 % до 24,3 % («Продолжительная и активная жизнь» (24,3 %); «Экологическое благополучие» (24,0 %); «Молодежь и дети» (18,1 %); «Инфраструктура для жизни» (7,0 %), «Семья» (5,3 %).

По национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» кассовое исполнение отсутствует.

**14.4.** В рамках национальных проектов, из 411 планируемых контрактов (договоров) по 7 национальным проектам, заключены 214 контрактов (договоров) на сумму 10 274,6 млн рублей, или 52,1 % от плана, в том числе:

– по 2 нацпроектам уровень заключенных контрактов составил 70 % – 71 % («Молодежь и дети» (71 %), «Продолжительная и активная жизнь» (70 %);

– по 3 нацпроектам от 9 % до 43 % («Семья» (43 %), «Инфраструктура для жизни» (31 %)), «Туризм и гостеприимство» (9 %).

По 2 национальным проектам контракты не заключены («Беспилотные авиационные системы» (1 контракт). «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (1 контракт)

По 4 национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика») заключение контрактов не предусмотрено.

Поздние сроки заключения и исполнения контрактов являются одной из основных причин неосвоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию проектов, и как следствие, недостижения индикативных показателей.

**14.5.** Поручение Главы Республики Дагестан данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25 об обеспечении в срок до 1 апреля 2025 г. заключения всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов выполнено только по 2 региональным проектам из 17 региональных проектов, по которым предусмотрено заключение контрактов:

- «Профессионалитет» («Молодежь и дети»);
- «Региональная и местная дорожная сеть» («Инфраструктура для жизни»);

**14.6.** По состоянию на 1 апреля 2025 г. не заключены 197 контрактов, срок заключения которых запланирован на апрель – 126 контрактов, май – 26 контрактов, другие месяцы - 47 контракта.

К основным причинам, влияющим на уровень заключения контрактов (договоров), относятся:

- длительные сроки согласования планируемых мероприятий с профильными федеральными министерствами, и изменения в нормативных актах («Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Эффективная и конкурентная экономика»);

- необходимость заключения контрактов в рамках совместного аукциона с контрагентами других регионов («Продолжительная и активная жизнь», «Беспилотные авиационные системы»);

- планирование сроков заключения контрактов (договоров) до конца текущего года («Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Семья»);

- недостаточность предусмотренных лимитов («Продолжительная и активная жизнь»);

- несвоевременность проведения отдельными муниципальными образованияами мероприятий по прохождению экспертизы сметной стоимости, подготовки конкурсной документации («Инфраструктура для жизни»);

- признание аукционов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок («Инфраструктура для жизни»).

Низкий уровень заключения контрактов может явиться причиной неосвоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных (региональных) проектов и, как следствие, недостижения плановых значений по целевым показателям,

**14.7.** Проведенный мониторинг реализации отдельных национальных (региональных) проектов показал следующее.

**14.7.1.** По региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» (национальный проект «Здравоохранение») в 2025 году запланировано проведение следующих мероприятий:

1) Создание 45 объектов первичного звена здравоохранения, в том числе монтаж 43 объектов быстровозводимых модульных конструкций и реконструкция 2 зданий медицинских организаций. Несмотря на своевременно заключенные контракты, строительные работы на объектах не начаты;

2) Капитальный ремонт 76 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений (504,7 млн рублей).

В целях реализации мероприятия заключено 75 контрактов на сумму 502,7 млн рублей или 99 % от плана. В то же время, имеется риск несвоевременного заключения 1 контракта по объекту «Внутренняя амбулатория, РД, Гунибский район, с. Салта» на сумму 5,4 млн рублей, ввиду отсутствия достаточного объема предусмотренных лимитов из федерального бюджета. Указанное обстоятельство вызвано тем, что при внесении изменений в региональный проект объем средств, необходимых на реализацию в 2025 году мероприятий по капитальному ремонту учреждений здравоохранения увеличился на 5,4 млн рублей. Планируемый срок заключения контракта – до 1 июня 2025 г.

Срок завершения строительства 75 объектов запланирован до 1 декабря 2025 г., за исключением 2 объектов со сроком окончания работ до 1 сентября 2025 г. Уровень готовности 75 объектов капитального ремонта составляет:

- по 1 объекту – работы завершены;
- по 15 объектам – от 25 до 40 %;
- по 59 объектам – от 5% до 20 %;
- по 1 объекту контракт не заключен.

Несоблюдение сроков начала ведения строительных работ в ходе мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий медицинских организаций и их структурных подразделений свидетельствуют об отклонениях от графика производства строительных работ, что может привести к несвоевременному исполнению обязательств по заключенным контрактам и освоению годовых назначений в полном объеме.

**14.7.2.** По региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») в 2025 г. запланировано строительство 1 объекта и реконструкция 2 объектов водоснабжения. Контракты на ведение строительных работ не заключены.

Объем работ, запланированный в 2025 году по объекту «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска», оценивается как наиболее трудоемкий (протяженность – 26,58 км) и затратный (935,8 млн рублей). Длительные сроки заключения контракта и,

соответственно, поздние сроки начала строительных работ свидетельствуют о наличии риска своевременного ввода объекта в эксплуатацию в 2025 году.

**14.7.3.** По региональному проекту «**Формирование комфортной городской среды**» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») в ходе мероприятий:

1) По благоустройству 131 территории (1 016,2 млн рублей), из запланированных 82 контрактов на выполнение работ:

– по 11-ти территориям заключены 10 муниципальных контрактов;

– по 110 территориям конкурсные мероприятия по заключению 64 контрактов не завершены;

– по 10 территориям (ГО «город Буйнакск» (4), МО «Ахвахский район» (1), МО «Карабудахкентский район» (5) конкурсные процедуры по заключению 8 контрактов не начаты.

2) По реализации проектов – победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (277,8 млн рублей) по объекту «Природно-исторический парк Сосновый Бор» в городском округе «город Дербент» (72,0 млн рублей). заключен 1 муниципальный контракт от 17 марта 2025 г. на сумму 71,6 млн рублей (срок исполнения – 10 октября 2025 г.).

По проектам «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе «город Кизляр» (102,2 млн рублей) и «Сердце старого города». Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» (103,7 млн рублей) в нарушение пункта 3 Графика реализации проекта на территории муниципального образования – победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (до 1 апреля 2025 г.) контракты на выполнение работ не заключены.

**14.7.4.** По региональному проекту «**Экономика замкнутого цикла**» (национальный проект «Экологическое благополучие») в 2025 году запланировано завершение мероприятий по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

По состоянию на 1 апреля 2025 г. техническая готовность объектов капитального строительства представлена следующим образом:

1) Мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе (мощность 500 тонн) – строительная готовность – 52 %. По полигону захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов, производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь) получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) Мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе (мощность 250 тонн) – строительная готовность – 38 %, полигон захоронения не пригодных

для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год в Хасавюртовском районе Республики Дагестан – 33 %;

3) Мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе (200 тонн) – строительная готовность – 62 %. Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год в Дербентском районе Республики Дагестан – 46 %.

По показателю «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» составляет 100 % при плановом значении 92,8%. Существует риск достижения планового значения. В связи с тем, что на территории Республики Дагестан отсутствуют объекты по обработке твердых коммунальных отходов, все образуемые ТКО (100 %) направляются на захоронение. Ввод новых мощностей по обработке (сортировке) запланирован только на 31 декабря 2025 года.

**14.7.5.** По региональному проекту «**Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы**» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика») кассовое исполнение составляет 48,97 млн рублей, или 100 % от объема финансирования. Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства в сумме 48,97 млн рублей перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» для оказания услуги и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Однако, на 1 апреля 2025 г. смета расходования средств федерального бюджета ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан не согласована с Министерством экономического развития Российской Федерации и не утверждена, плановое количество контрактов не определено.

**14.7.6** В ходе реализации регионального проекта «**Все лучшее детям**» (национальный проект «Молодежь и дети») в 2025 году запланировано:

- строительство 2 школ: на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента и на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района – 754,9 млн рублей;
- капитальный ремонт зданий и оборудование 9 школ в 2 городских округах и 7 муниципальных образованиях – 592,1 млн рублей;

В период подготовки материала были заключены следующие контракты на строительство 2 объектов общего образования:

- государственный контракт от 08 апреля 2025 г. № 0103200008425000703 на сумму 1 332,7 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 800 мест в пос. Шамилькала Унцукульского района между ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (Заказчик) и ООО «БИГ-СЕРВИС» (Подрядчик).

В подрядные работы включены: строительство, реконструкция, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению

объектов культурного наследия. Срок исполнения контакта – 30 ноября 2027 г. Лимит на 2025 г. предусмотрен в сумме 223,3 млн рублей, в том числе выплата аванса – 33,5 млн рублей.

Согласно информации, приведенной на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru>, ООО «БИГ-СЕРВИС» ранее осуществляло строительство школы на 392 уч. мест в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района (объект введен в эксплуатацию). Случаев начисления неустоек, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств подрядчиком – ООО «БИГ-СЕРВИС», не установлено;

– государственный контракт от 18 апреля 2025 г. № К-25/003 на сумму 2 401,8 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 1200 мест в мкр. Южный г. Дербент между МКУ «УКС» ГО «город Дербент» (Заказчик) и ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» (Подрядчик).

В подрядные работы включены: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Срок исполнения контакта – 30 ноября 2027 г. Лимит на 2025 г. предусмотрен в сумме 523,5 млн рублей, в том числе аванс – 522,9 млн рублей.

ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» ранее осуществляло строительство школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района. Согласно информации, приведенной на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru>, контракт на строительство школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района был прекращен, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством от 21 августа 2023 г.

Необходимо отметить, в отличие от национальных проектов (2019-2024) сроки строительства и ввода в эксплуатацию объектов по контрактам вместо одного года, увеличены до трех лет.

**14.7.7.** В ходе реализации регионального проекта «Поддержка семьи» в 2025 году запланировано:

– строительство 6 детсадов (в том числе 5 объектов на 830 мест в г. Дербенте и 1 объект на 240 мест в г. Каспийске) – 549,48 млн рублей;

– капитальный ремонт и оснащение 2 детсадов (в г. Дагестанские Огни и г. Избербаше) – 128,1 млн рублей.

Контракты на строительство 6 дошкольных образовательных учреждений не заключены (на стадии подачи заявок на ЕИС «Закупки»).

Поздние сроки заключения контрактов и начала строительных работ увеличивают риски освоения годовых назначений.

**14.7.8.** В ходе регионального проекта «Охрана материнства и детства» в целях сохранения репродуктивного здоровья запланировано заключение 29 контрактов в целях:

– оснащения (переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) в г. Махачкале и г. Дербент – 293,0 млн рублей;

– создания женских консультаций (в ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Мирзоева», ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» и ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ») – 342,8 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2025 г. заключен 1 контракт на сумму 0,4 млн рублей. По остальным контрактам подготовлена заявка на приобретение 323 ед. медицинского оборудования для обеспечения медицинскими изделиями перинатальных центров и роддомов.

Подготовительные работы в целях создания женских консультаций также не завершены (определены земельные участки на территории медицинских учреждений, проводится разработка медико-технического задания).

**15.** По состоянию на 1 апреля 2025 г. из запланированных 90 целевых показателей региональных проектов:

– по 24 целевым показателям, или 26,7 % от плана, обеспечено достижение плановых значений на 2025 год (по 3 целевым показателям – 100 %; по 21 целевым показателям – свыше 100 %). Указанное свидетельствует о занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии корректировки плановых значений показателей исходя из фактически сложившейся динамикой;

– по 17 целевым показателям уровень достижения составил от 50 % до 99 %;

– по 23 целевому показателю фактические значения составляют менее 50 % от плана;

– по 26 целевым показателям фактические значения имеют нулевые значения (в том числе достижение 3 целевых показателей в 2025 г. не запланировано).

**16.** По результатам анализа реализации национальных проектов в I квартале 2025 г., темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований оцениваются как недостаточные для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий, а также достижения целевых показателей. С учетом накопленного опыта реализации национальных проектов (2019-2024) необходимо обеспечить ритмичное финансирование и освоение средств, выделяемых на реализацию мероприятий национальных проектов, а также принятие эффективных решений в целях минимизации возможных рисков.

## 15. Предложения

По результатам проведенного аудита Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

– обеспечить своевременное финансирование и эффективное освоение бюджетных ассигнований, согласно протоколу заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 февраля 2025 г. № 25-01/2-25 (в соотношении не менее 50 процентов до 1 июля 2024 года, 80 процентов до 1 сентября и 100 процентов – до 1 ноября 2024 года), а также выполнение запланированных мероприятий;

– привести объемы финансирования региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федеральных проектов, входящих в национальные проекты в составе государственных программ Республики Дагестан в соответствие с финансированием, предусмотренным в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год;

– обеспечить качественную подготовку аукционной документации и соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения рисков приостановления процедур по заключению контрактов;

– принять меры по своевременному заключению контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов в 2025 году, а также обеспечению исполнения принятых контрактных обязательств;

– обеспечить соблюдение графика строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов, а также вводу их в эксплуатацию в установленные сроки;

– обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов, в том числе с муниципалитетами, участниками реализации региональных проектов, с целью своевременной реализации мероприятий и достижения намеченных целевых показателей.

– актуализировать информацию о реализации национальных (региональных) проектов на официальных сайтах министерств и ведомств (ответственных исполнителей).

Приложение на 12 листах

**Счетная палата  
Республики Дагестан**
